Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на июль 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"28" 06 2013г.

Ид.	Название задачи	Месячный Время ремонта Длительность	Месячный Время ремонта Начало	Месячный Время ремонта Конец	Месячный Заявленное время Длительность	Месячный Заявленное время Начало	Месячный Заявленное время Конец	Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Годовой Время ремонта Количество дней	Годовой Время ремонта Начало	Годовой Время ремонта Конец
1	**ВЛ 500 кВ**						НД										
2	ВЛ 500 кВ Вешкайма-Осиновка (МЭС Волги)	4 дней	Вт 02.07.13	Пт 05.07.13	4 дн...	Вт 02.07....	Пт 05.07....	ТР	06:00	ПС Вешкайма: ТО: ДР-1, ДР-2, ТПЛ-1, ТПЛ-2, ТТЛ, ВЧЗ, КС. Профиспытания конденсаторов. Вт. цепи ТТЛ(В), В.ч. тракт ФВ, ФС (В). А/Г-6чРасширение просеки, вырубка деревьев А/Г-2ч			с откл		4 дн...	Пн 22.07....	Чт 25.07....
3	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Ключики (МЭС Волги)	2 дней	Ср 10.07.13	Чт 11.07.13	2 дн...	Ср 10.07....	Чт 11.07....	ТР	04:00	ПС Ключики: ТО: ДР-500, ТПЛ-1, ТПЛ-2, ТТЛ, ТР: ВЧ заградителя, КС. Профиспытания конденсаторов. Профвосстановление ВЧЗ ф.А, В, С; ФП ф.А, В, С.			с откл		0 дн...	Пн 05.08....	Вт 06.08....
4	**ВЛ 220 кВ**																
5	ВЛ 220 кВ ТЭЦ ВАЗа - Черемшанская (МЭС Волги)	4 дней	Вт 16.07.13	Пт 19.07.13	4 дн...	Вт 09.07....	Пт 12.07....	ТР	12:00	ПС Черемшанская: КР: ДР-220 ТВ-Ч, ОР-220 ТВ-Ч			с откл		4 дн...	Вт 09.07....	Пт 12.07....
6	ВЛ 220 кВ Сызрань - Кремёнки (МЭС Волги)	5 дней	Пн 22.07.13	Пт 26.07.13	5 дн...	Пн 22.07....	Пт 26.07....	ТР	12:00	Замена гирлянд изоляторов (предписания) (АГ 6ч); Замена вантовых оттяжек (АГ 1ч), вырубка деревьев (АГ 1ч), замена фарфоровых изоляторов (АГ 2ч). ПС-220 Кремёнки КР: ДР-1-220, ДР-2-220 Сызрань (АГ 12ч).			с откл		5 дн...	Пн 22.07....	Пт 26.07....
7	ВЛ 220 кВ Сызрань - Кремёнки (МЭС Волги)	8 дней	Пн 01.07.13	Пн 08.07.13	8 дн...	Пн 01.07....	Пн 08.07....	ТР	06:00	Замена гирлянд изоляторов (предписания) (АГ 6ч); Замена вантовых оттяжек (АГ 1ч), вырубка деревьев (АГ 1ч), замена фарфоровых изоляторов (АГ 2ч)			с откл		8 дн...	Пн 01.07....	Пн 08.07....
8	ВЛ 220 кВ Кремёнки - Ульяновская (МЭС Волги)	7 дней	Пн 15.07.13	Вс 21.07.13	7 дн...	Пн 15.07....	Вс 21.07....	ТР	06:00	Замена гирлянд изоляторов (предписания) (АГ 6ч), вырубка деревьев (АГ 1ч), верховой осмотр (АГ 1ч), замена фарфоровых изоляторов (АГ 4ч)			с откл		7 дн...	Пн 15.07....	Вс 21.07....
9	ВЛ 220 кВ Азот-Черемшанская (Ульяновское РДУ, МЭС Волги)	1 день	Пн 29.07.13	Пн 29.07.13	1 день	Чт 25.07....	Чт 25.07....	КР	04:00	КР ДР-220 Азот-Черемшанская на ПС Азот					0 дн...	НД	НД
10	**ВЛ 110 кВ**																
11	ВЛ 110 кВ Вешкайма - Карсун (Ульяновский ЦУС)	2 дней	Ср 17.07.13	Чт 18.07.13	2 дн...	Ср 17.07....	Чт 18.07....	ТР	04:00	ТО: ВЭ, ТТ. ТР: ДР, ОР на ПС 500 кВ Вешкайма			с откл		2 дн...	Ср 17.07....	Чт 18.07....
12	ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-1) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Ср 03.07....	Ср 03.07....	ТР	01:00	ТО: ДР-110, ВЧ заградителя, КС на ПС 220 кВ Ульяновская			с откл		1 день	Ср 03.07....	Ср 03.07....

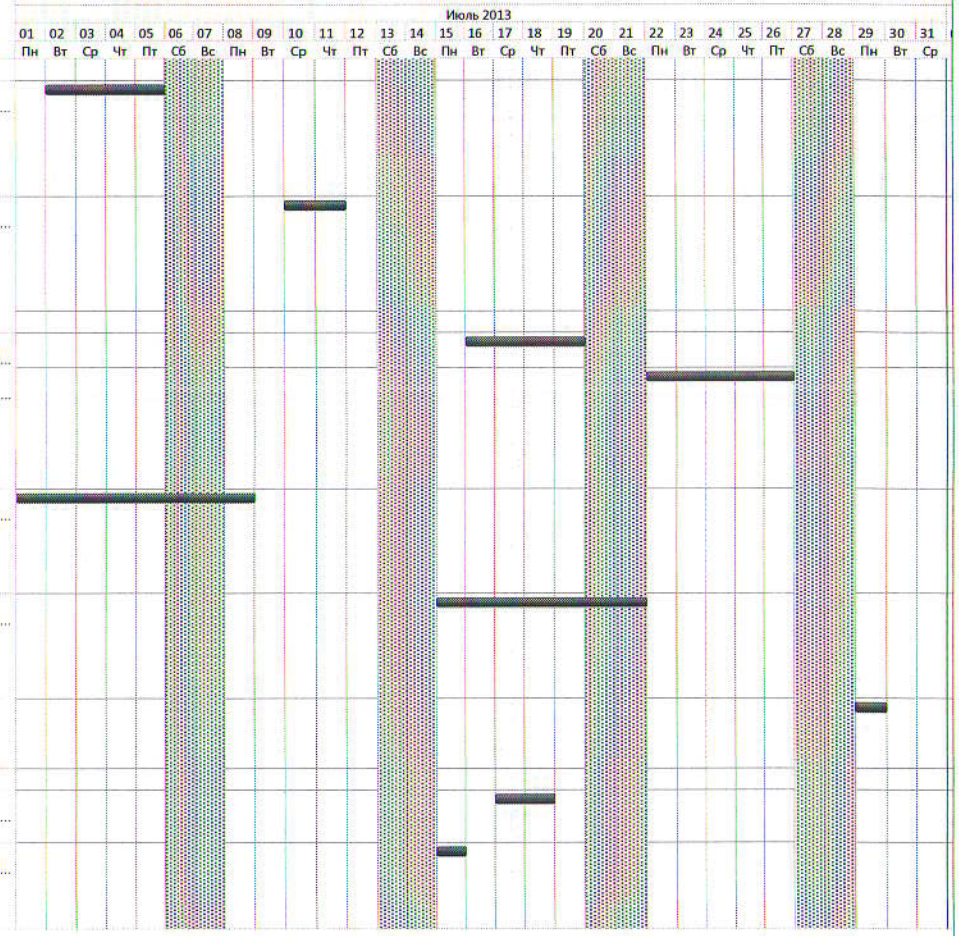

Начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на июль 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"28" 06 2013г.

Ид.	Название задачи	Месячный Время ремонта. Длит	Месячный Время ремонта. Начало	Месячный Время ремонта. Конец	Месячная Заявленное время. Длит	Месячная Заявленное время. Начало	Месячная Заявленное время. Конец	Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Состояние по заявке	Условия производства работ	Годовой Время ремонта. Количество дней	Годовой Время ремонта. Начало	Годовой Время ремонта. Конец
13	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Северная с отпайкой на ПС УАЗ (ВЛ 110 кВ Северная – 1) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Вт 02.07.13	Вт 02.07.13	1 день	Вт 02.07....	Вт 02.07....	ТР	01:00	ТО: ЛР-110, ВЧ заградителя, КС на ПС 220 кВ Ульяновская			с откл		1 день	Вт 02.07....	Вт 02.07....
14	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Ульяновская с отпайками (ВЛ 110 кВ Северная – 3) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 01.07.13	Пн 01.07.13	1 день	Пн 01.07....	Пн 01.07....	ТР	01:00	ТО: ЛР-110, ВЧ заградителя, КС на ПС 220 кВ Ульяновская			с откл		1 день	Пн 01.07....	Вт 02.07....
15	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1-Северная I цепь (ВЛ 110 кВ Северная – 4) (Ульяновский ЦУС)	5 дней	Пн 08.07.13	Пт 12.07.13	5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....	ТР	01:00	ТО			с откл		5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....
16	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1-Северная I цепь (ВЛ 110 кВ Северная – 4) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Вт 09.07.13	Вт 09.07.13	1 день	Вт 09.07....	Вт 09.07....	ТР	01:00	ЛР-110 С-4 на ПС-110 кВ Северная			с откл		1 день	Вт 09.07....	Вт 09.07....
17	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Северная II цепь (ВЛ 110 кВ Северная – 5) (Ульяновский ЦУС) ОТКАЗ	5 дней	Пн 01.07.13	Пт 05.07.13	5 дн...	Пн 01.07....	Пт 05.07....	ТР	01:00	ТО	Отказать в связи с режимом работы Ульяновск ТЭЦ-1 (в работе ТГ-10)		с откл		0 дн...	НД	НД
18	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Центральная I цепь (ВЛ 110 кВ Восточная - 1) (Ульяновский ЦУС)	3 дней	Ср 03.07.13	Пт 05.07.13	3 дн...	Пн 15.07....	Ср 17.07....	ТР	01:00	ТО			с откл		3 дн...	Пн 15.07....	Ср 17.07....
19	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Центральная II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная - 2) (Ульяновский ЦУС)	2 дней	Вт 30.07.13	Ср 31.07.13	3 дн...	Пн 29.07....	Ср 31.07....	ТР	01:00	ТО			с откл		3 дн...	Пн 29.07....	Ср 31.07....
20	ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-2) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Вт 16.07.13	Вт 16.07.13	1 день	Чт 04.07....	Чт 04.07....	ТР	01:00	ТО: ЛР-110, ВЧ заградителя, КС на ПС 220 кВ Ульяновская			с откл		1 день	Чт 04.07....	Чт 04.07....
21	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Центральная с отпайкой на АЗЧ II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-4) (Ульяновский ЦУС)	2 дней	Пн 01.07.13	Вт 02.07.13	2 дн...	Пн 01.07....	Вт 02.07....	ЗРР	01:00	Расшиновка ЛР-110 Ц-4 на ПС-110 кВ Центральная			с откл		1 день	Сб 27.07....	Сб 27.07....

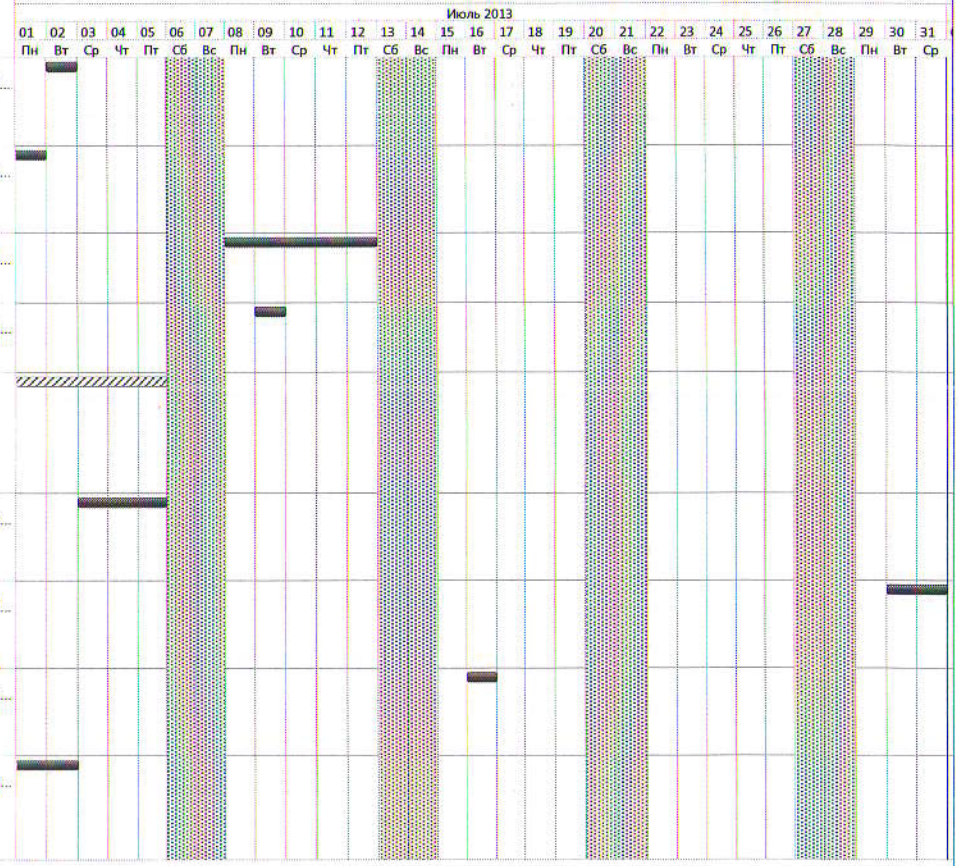

Начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на июль 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"29"_06_____2013г.

Ид.	Название задачи	Месячный Время ремонта. Длительность	Месячный Время ремонта. Начало	Месячный Время ремонта. Конец	Месячный Заяв. время. Длительность	Месячный Заявленное время. Начало	Месячный Заявленное время. Конец	Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Годовой Время ремонта. Количество дней	Годовой Время ремонта. Начало	Годовой Время ремонта. Конец
22	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Центральная с отпайкой на АЗЧ II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-4) (Ульяновский ЦУС)	30 дней	Вт 02.07.13	Ср 31.07.13	30 дн...	Вт 02.07....	Ср 31.07....	ТР	ВЗ	Реконструкция присоединения		В работе через ОВ	без откл		0 дн...	НД	НД
23	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка с отпайкой на ПС Мелькомбинат (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Вс 07.07.13	Вс 07.07.13	1 день	Вс 07.07....	Вс 07.07....	ТР	01:00	ТО ЛР-110Б ВЧ заградителя,КС на ПС 220 кВ Ульяновская			с откл	с отключением	92 дн...	Вс 07.04....	Вс 07.07....
24	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Сб 13.07.13	Сб 13.07.13	1 день	Сб 13.07....	Сб 13.07....	ТР	01:00	ТО: ЛР-110, ВЧ заградителя, КС на ПС 220 кВ Ульяновская			с откл		1 день	Сб 13.07....	Сб 13.07....
25	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Языково с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Языково) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Ср 17.07.13	Ср 17.07.13	1 день	Пн 08.07....	Пн 08.07....	ТР	01:00	ТО: ЛР-110, ВЧ заградителя, КС на ПС 220 кВ Ульяновская			с откл		1 день	Пн 08.07....	Пн 08.07....
26	ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная II цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-2) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Вт 23.07.13	Вт 23.07.13	1 день	Вт 23.07....	Вт 23.07....	ТР	01:00	ТО ЛР-110 Л-2 на ПС-110 кВ Лесная			с откл		1 день	Вт 23.07....	Вт 30.07....
27	ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная II цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-2) (Ульяновский ЦУС)	5 дней	Пн 22.07.13	Пт 26.07.13	5 дн...	Пн 22.07....	Пт 26.07....	ТР	01:00	ТО			с откл		5 дн...	Пн 22.07....	Пт 26.07....
28	ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная II цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-2) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Ср 24.07.13	Ср 24.07.13	1 день	Ср 24.07....	Ср 24.07....	ТР	01:00	ТО ЛР-110 Л-2 на ПС-110 кВ Ишеевка			с откл		1 день	Ср 24.07....	Ср 24.07....
29	ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная II цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-2) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 22.07.13	Пн 22.07.13	1 день	Пн 22.07....	Пн 22.07....	ТР	01:00	ТО ЛР-110 Л-2 на ПС-110 кВ Северная			с откл		1 день	Пн 22.07....	Пн 22.07....
30	ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная I цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-1) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....	ТР	01:00	ТО ЛР-110 Л-1 на ПС-110 кВ Северная			с откл		1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....

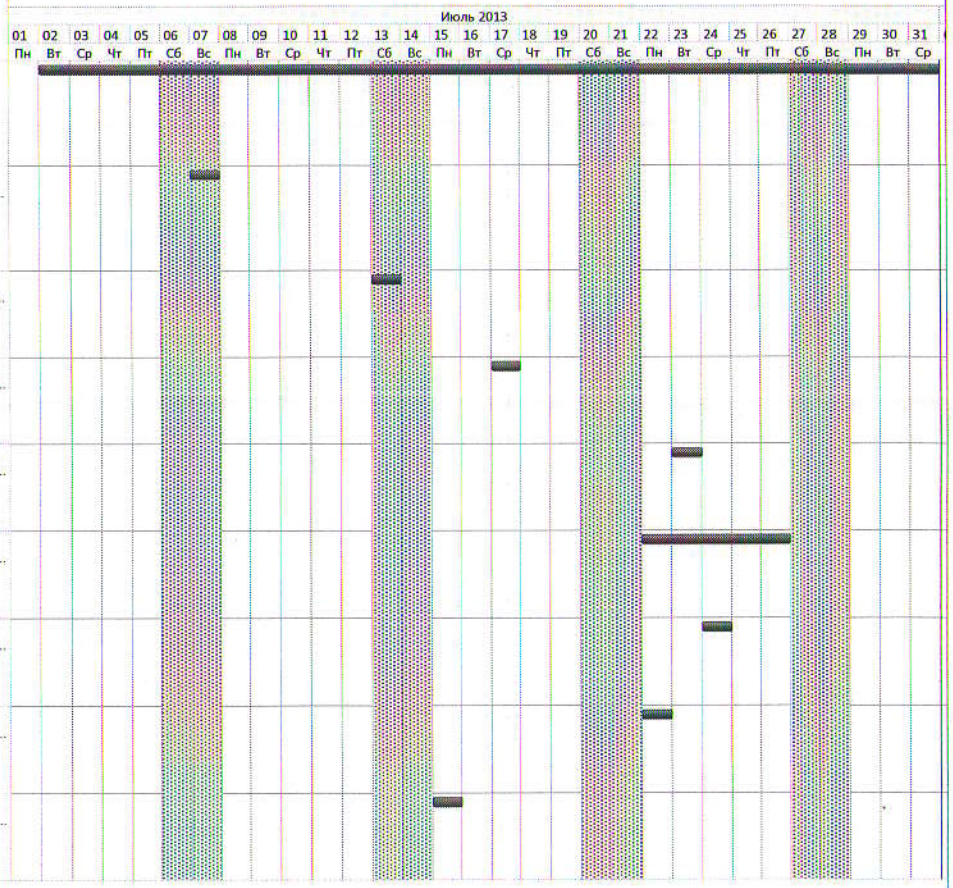

Начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на июль 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"27" 06 2013г.

Ид.	Название задачи	Месяч. Врем. ремонта. Длит	Месячный Время ремонта. Начало	Месячный Время ремонта. Конец	Месяч. Заяв. врем Длит	Месячный Заявлен время. Начало	Месячный Заявлен время. Конец	Вид ремонта	Аварий готовн	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примеч	Состав обор по заяв	Условия производст работ	Годов Врем ремонта Колич дней	Годовой Время ремонта Начало	Годовой Время ремонта Конец
31	ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная I цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-1) (Ульяновский ЦУС)	5 дней	Пн 15.07.13	Пт 19.07.13	5 дн...	Пн 15.07....	Пт 19.07....	ТР	01:00	ТО			с откл		5 дн...	Пн 15.07....	Пт 19.07....
32	ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная I цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-1) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Вт 16.07.13	Вт 16.07.13	1 день	Вт 16.07....	Вт 16.07....	ТР	01:00	ТО ЛР-110 Л-1 на ПС-110 кВ Лесная			с откл		1 день	Вт 16.07....	Вт 16.07....
33	ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная I цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-1) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Ср 17.07.13	Ср 17.07.13	1 день	Ср 17.07....	Ср 17.07....	ТР	01:00	ТО ЛР-110 Л-1на ПС-110 кВ Ишеевка			с откл		1 день	Ср 17.07....	Ср 17.07....
34	ВЛ 110 кВ Вешкайма – Вешкайма-110 I цепь (ВЛ 110 кВ Вешкайма - 1) (Ульяновский ЦУС)	2 дней	Ср 24.07.13	Чт 25.07.13	2 дн...	Ср 24.07....	Чт 25.07....	ТР	04:00	ТО: ВЭ, ТТ, ТР: ЛР, ОР на ПС 500 кВ Вешкайма			с откл		2 дн...	Ср 24.07....	Чт 25.07....
35	ВЛ 110 кВ Вешкайма – Вешкайма-110 II цепь (ВЛ 110 кВ Вешкайма - 2) (Ульяновский ЦУС)	2 дней	Пн 22.07.13	Вт 23.07.13	2 дн...	Пн 22.07....	Вт 23.07....	ТР	04:00	ТО: ВЭ, ТТ, ТР: ЛР, ОР на ПС 500 кВ Вешкайма			с откл		2 дн...	Пн 22.07....	Вт 23.07....
36	ВЛ 110 кВ Сызрань-Рачейка (ВЛ 110 кВ Сызрань-Рачейка-1) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Чт 18.07.13	Чт 18.07.13	1 день	Чт 18.07....	Чт 18.07....	ТР	01:00	ТР ЛР-110 кВ, покраска оборудования на ПС-110 кВ Рачейка			с откл		1 день	Чт 18.07....	Чт 18.07....
37	ВЛ 110 кВ Сызрань – Жихаревка (ВЛ 110 кВ Сызрань – Рачейка-2 уч-к ПС Сызрань - ПС Жихаревка) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Чт 18.07.13	Чт 18.07.13	1 день	Чт 18.07....	Чт 18.07....	ТР	01:00	ТР ЛР-110 кВ , покраска оборудования на ПС 110 кВ Рачейка			с откл		1 день	Чт 18.07....	Пт 19.07....
38	ВЛ 110 кВ Ключики - Клин с отпайкой на ПС Куроедово II цепь (ВЛ 110 кВ Ключики - Клин – 2) (Ульяновский	1 день	Ср 17.07.13	Ср 17.07.13	1 день	Ср 17.07....	Ср 17.07....	ТР	02:00	ТР: ВЧ заградителя, КС ВЛ-110 Клин-Ключики-2 ТО: ЛР-110кВ, Профиспытания на ПС 500 кВ Ключики			с откл		1 день	Ср 17.07....	Чт 18.07....
39	ВЛ 110 кВ Ключики - Клин с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ключики - Клин – 1) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....	ТР	02:00	ЛР-110кВ ВЛ-110 Клин-Ключики-1 на ПС 500 кВ Ключики			с откл		1 день	Пн 15.07....	Вт 16.07....
40	ВЛ 110 кВ Ключики - Клин с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ключики - Клин – 1) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Ср 10.07....	Ср 10.07....	КР	06:00	КР. Замена опоры. Потребители ПС Канадей переводятся на внешние источники питания			с откл		0 дн...	НД	НД
41	ВЛ 110 кВ Рачейка – Коромысловка с отпайкой на ПС Безводовка (ВЛ 110 кВ Рачейка – Коромысловка) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....	ТР	ВЗ	ТР ЛР-110кВ, покраски оборудования на ПС-110 кВ Рачейка			с откл		1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....

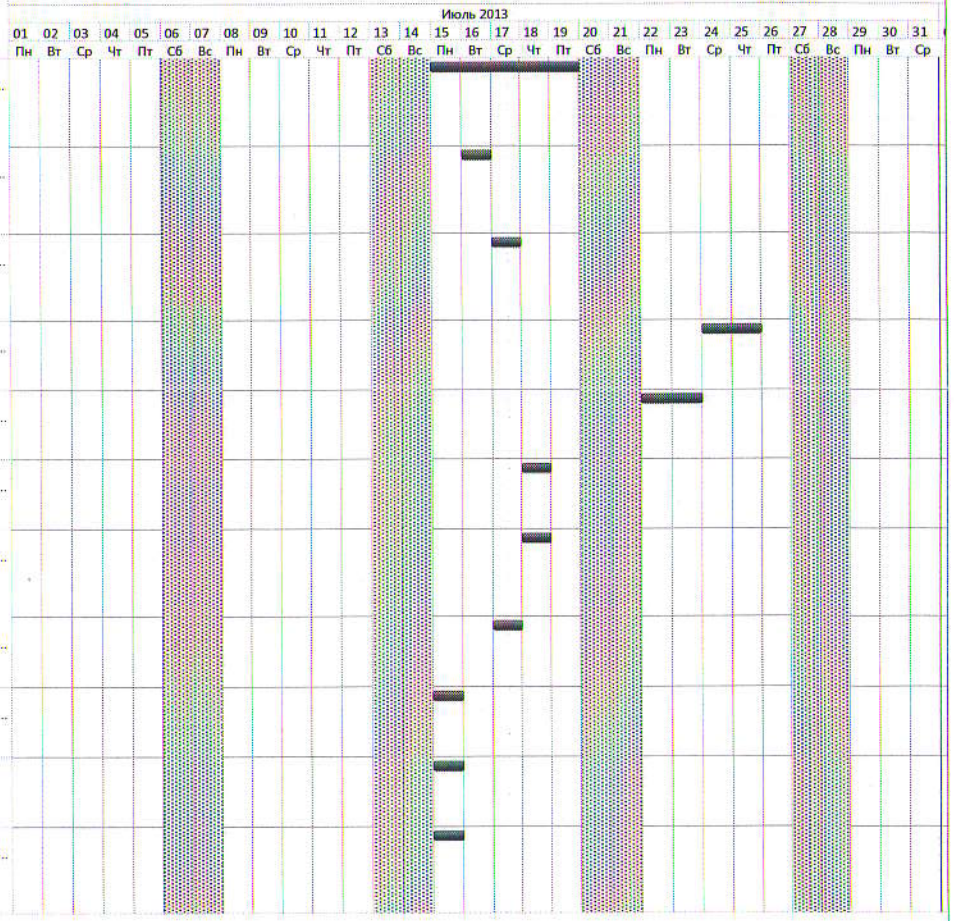

Начальник ОДС_____ Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____ А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на июль 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____ В.А. Бусс
"28" 06 2013г.

Ид.	Название задачи	Мес Врем ремс Длит	Месячны Время ремонта. Начало	Месячны Время ремонта. Конец	Мес Заяв. врем Длит	Месячн Заявлен время. Начало	Месячн Заявлен время. Конец	Вид ремс	Авари готов	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примеч	Сост обор по заяв	Условия производст работ	Годо Врем ремс Коли дней	Годовой Время ремонта Начало	Годовой Время ремонта Конец
42	ВЛ 110 кВ Рачейка - Налейка (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....	ТР	01:00	ТР ЛР-110кВ, покраска оборудования на ПС-110 кВ Рачейка			с отклк		1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....
43	ВЛ 110 кВ Барыш - Налейка (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 22.07.13	Пн 22.07.13	1 день	Пн 22.07....	Пн 22.07....	ТР	01:00	ТР ЛР-110кВ, покраска оборудования на ПС-110 кВ Налейка			с отклк		1 день	Пн 22.07....	Пн 22.07....
44	ВЛ 110 кВ Умыс – Ночка (Ульяновский ЦУС)	1 день	Ср 17.07.13	Ср 17.07.13	1 день	Ср 17.07....	Ср 17.07....	ТР	ВЗ	ТР:ШР,ЛР -110 кВ,покраска оборудования на ПС 110 кВ Ночка			с отклк		1 день	Ср 17.07....	Ср 17.07....
45	ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево) (Ульяновский ЦУС)	12 дней	Пн 01.07.13	Пт 12.07.13	12 дн...	Пн 01.07....	Пт 12.07....	КР	01:00	КР			с отклк		12 дн...	Пн 01.07....	Пт 12.07....
46	ВЛ 110 кВ Инза - Ночка с отпайкой на ПС ПОШ (ВЛ 110 кВ Инза - Ночка) (Ульяновский ЦУС)	1 день	Вт 16.07.13	Вт 16.07.13	1 день	Вт 16.07....	Вт 16.07....	ТР	01:00	ТР:ШР,ЛР -110 кВ,покраска оборудования на ПС 110 кВ Ночка			с отклк		1 день	Вт 16.07....	Вт 16.07....
47	ВЛ 110 кВ Вешкайма - Чуфарово (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пт 19.07.13	Пт 19.07.13	1 день	Пт 19.07....	Пт 19.07....	ТР	04:00	ТО: ВЭ, ТТ. ТР: ЛР, ОР на ПС 500 кВ Вешкайма			с отклк		1 день	Пт 19.07....	Пт 19.07....
48	**ПС 500 кВ Вешкайма**														0 ...	НД	НД
49	АТ-2 (МЭС Волги)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....	ТР	04:00	ТО: ВЭ, ТТ, ТР, ОР-110 кВ			с отклк		0 дн...	НД	НД
50	ВЭ-110 ВЛ Вешкайма-1 (МЭС Волги)	2 дней	Ср 24.07.13	Чт 25.07.13	2 дн...	Ср 24.07....	Чт 25.07....	ТР	04:00	ТО: ВЭ, ТТ. ТР: ЛР, ОР			с отклк		2 дн...	Ср 24.07....	Чт 25.07....
51	ВЭ-110 ВЛ Вешкайма-2 (МЭС Волги)	2 дней	Пн 22.07.13	Вт 23.07.13	2 дн...	Пн 22.07....	Вт 23.07....	ТР	04:00	ТО: ВЭ, ТТ. ТР: ЛР, ОР			с отклк		2 дн...	Пн 22.07....	Вт 23.07....
52	ВЭ-110 ВЛ Вешкайма-Карсун (МЭС	2 дней	Ср 17.07.13	Чт 18.07.13	2 дн...	Ср 17.07....	Чт 18.07....	ТР	04:00	ТО: ВЭ, ТТ. ТР: ЛР, ОРвтцепи ТТ(К)			с отклк		2 дн...	Ср 17.07....	Чт 18.07....
53	ВЭ-110 ВЛ Вешкайма-Чуфарово (МЭС	1 день	Пт 19.07.13	Пт 19.07.13	1 день	Пт 19.07....	Пт 19.07....	ТР	04:00	ТО: ВЭ, ТТ. ТР: ЛР, ОР			с отклк		1 день	Пт 19.07....	Пт 19.07....
54	ОСШ-110 (МЭС Волги)	12 дней	Пн 15.07.13	Пт 26.07.13	12 дн...	Пн 15.07....	Пт 26.07....	ЗРР	04:00	ТР: ОР-110 кВ, ЛР, -110 кВ присоединений Т-1, ПГ, ВЛ Вешкайма-1, ОВ, ВЛ Вешкайма-2, ВЛ Вешкайма Карсун, ВЛ Вешкайма Чуфарово: ТО ВЭ, ТТ всех присоединений, ТН ОСШ, ОР-110 кВ, АТ-2.			с откл		12 дн...	Пн 15.07....	Пт 26.07....
55	ВЭ-110 АТ-2 (МЭС Волги)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....	ТР	04:00	ТО: ВЭ, ТТ, ТР, ОР			с отклк		2 дн...	Пн 15.07....	Пн 15.07....
56	ВЭ-110 ОВ (МЭС Волги)	1 день	Пт 26.07.13	Пт 26.07.13	1 день	Пт 26.07....	Пт 26.07....	ТР	04:00	ТО: ВЭ, ТТ. ТР ОР			с отклк		1 день	Пт 26.07....	Пт 26.07....
57	В-1 ВЛ 500 кВ Вешкайма-Осиновка (МЭС Волги)	4 дней	Вт 02.07.13	Пт 05.07.13	4 дн...	Вт 02.07....	Пт 05.07....	ТР	04:00	ТО: ЛР-1, ЛР-2			с отклк		4 дн...	Пн 22.07....	Чт 25.07....
58	В-2 ВЛ 500 кВ Вешкайма-Осиновка (МЭС	4 дней	Вт 02.07.13	Пт 05.07.13	4 дн...	Вт 02.07....	Пт 05.07....	ТР	04:00	ТО: ЛР-1, ЛР-2. Эд.привод ЛР-2(К), Эл.магнитная блокировка на ЛР(К)			с отклк		4 дн...	Пн 22.07....	Чт 25.07....

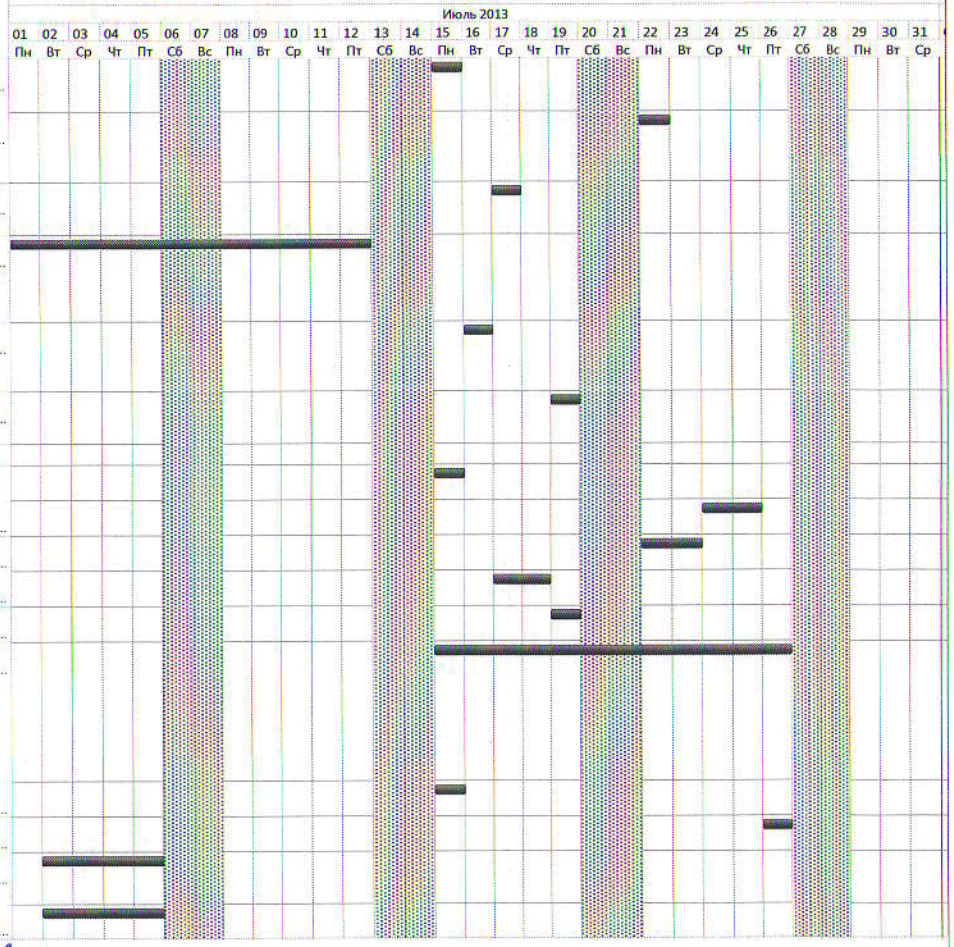

Начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на июль 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"29" 06 2013г.

Ид.	Название задачи	Месячный Время ремонта Длительность	Месячный Время ремонта. Начало	Месячный Время ремонта. Конец	Месячный Заявл. время Длительность	Месячный Заявлен время. Начало	Месячный Заявлен время. Конец	Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Годовой Время ремонта Количество дней	Годовой Время ремонта Начало	Годовой Время ремонта Конец
59	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Ключики (МЭС Волги)	5 дней	Пн 08.07.13	Пт 12.07.13	5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....	ТР	04:00	ТО В-2, ТТ-2, ШР-2, Эл.привод ШР-2(В), Вт.цепи ТТ-2(В), Цепив.к. В-2(В), Шкаф автоматики В-2(В).			с отклс		5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....
60	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Пенза (МЭС Волги)	5 дней	Пн 08.07.13	Пт 12.07.13	5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....	ТР	04:00	ТО В-2, ТТ-2, ШР-2, Эл.привод ШР-2(В), Вт.цепи ТТ-2(В), Цепив.к. В-2(В), Шкаф автоматики В-2(В).			с отклс		5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....
61	ВЭ Р-2-500 (МЭС Волги)	5 дней	Пн 08.07.13	Пт 12.07.13	5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....	ТР	04:00	ТР^ Р-2-500: ТО ОПН-500, ВЭ, ТТ. Шкаф автоматики В-500(О), Вт.цепи выносных ТТ(В).			с отклс		5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....
62	В-2 ВЛ 500 кВ Вешкайма-Арзамасская (МЭС Волги)	5 дней	Пн 08.07.13	Пт 12.07.13	5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....	ТР	04:00	ТО В-2, ТТ-2, ШР-2			с отклс		5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....
63	В-2 ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Вешкайма Южная (МЭС Волги)	5 дней	Пн 08.07.13	Пт 12.07.13	5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....	ТР	04:00	ТО В-2, ТТ-2, ШР-2, Шкаф автоматики В-2(О)			с отклс		5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....
64	2 СШ-500 - СШ 500 кВ (МЭС Волги)	1 день	Пт 12.07.13	Пт 12.07.13	1 день	Пт 12.07....	Пт 12.07....	ТР	04:00	Ввод в работу южной секции 2 СШ			с отклс		1 день	Пт 12.07....	Пт 12.07....
65	2 СШ-500 - СШ 500 кВ (МЭС Волги)	1 день	Пн 08.07.13	Пн 08.07.13	1 день	Пн 08.07....	Пн 08.07....	ТР	04:00	ТО: ШСР-2-500 кВ. Управление,Эм.блокировка тр.			с отклс		1 день	Пн 08.07....	Пн 08.07....
66	Южная сек. 2 СШ-500 - СШ 500 кВ (МЭС Волги)	5 дней	Пн 08.07.13	Пт 12.07.13	5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....	ТР	04:00	ТО: ШР-2, ШО-2, В-2, ТТ-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Ключики, Вешкайма -Пенза, Вешкайма Арзамасская, ЖГЭС Вешкайма Южная РТН, ТН 2 СШ Южной Секции.			с отклс		5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....
67	Р-2-500 (МЭС Волги)	5 дней	Пн 08.07.13	Пт 12.07.13	5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....	ТР	04:00	ТР Р-2-500: ТО ОПН-500, ВЭ, ТТ.			с отклс		5 дн...	Пн 08.07....	Пт 12.07....
68	**ПС 500 кВ Ключики**																
69	1 СШ 110 кВ (МЭС Волги)	23 дней	Пн 01.07.13	Вт 23.07.13	23 дн...	Пн 01.07....	Вт 23.07....	ЗРР	04:00	ТР: ШР-110кВ 1СШ АТ-3; АТ-4; Евлашево; Никулино; Ключики-2; ТО: Клин-Ключики-1; Клин-Ключики-2; Ключики-1; Ключики-Павловка; ; ШСВ; ТН-1-110кВ №1; ТН-1-110кВ №3 Профиспытания			с отклс		23 дн...	Пн 01.07....	Вт 23.07....
70	2 СШ 110 кВ (МЭС Волги)	16 дней	Чт 25.07.13	Пт 09.08.13	16 дн...	Чт 25.07....	Пт 09.08....	ЗРР	04:00	ТР: ШР-110кВ 2СШ АТ-3; АТ-4; Евлашево; Никулино; ТО: Клин-Ключики-1; Клин-Ключики-2; Ключики-1; Ключики-2; Ключики-Павловка; ШСВ; ТН-2-110кВ №2; ТН-2-110кВ №4; профиспытания ТН-2-110кВ №2; ТН-2-110кВ №4			с отклс		16 дн...	Чт 25.07....	Пт 09.08....
71	ШСВЭ-110 (МЭС Волги)	16 дней	Чт 25.07.13	Пт 09.08.13	16 дн...	Чт 25.07....	Пт 09.08....	ТР	02:00	ТО: ШР-110 2СШ, ШСВ-110			с отклс		16 дн...	Чт 25.07....	Пт 09.08....

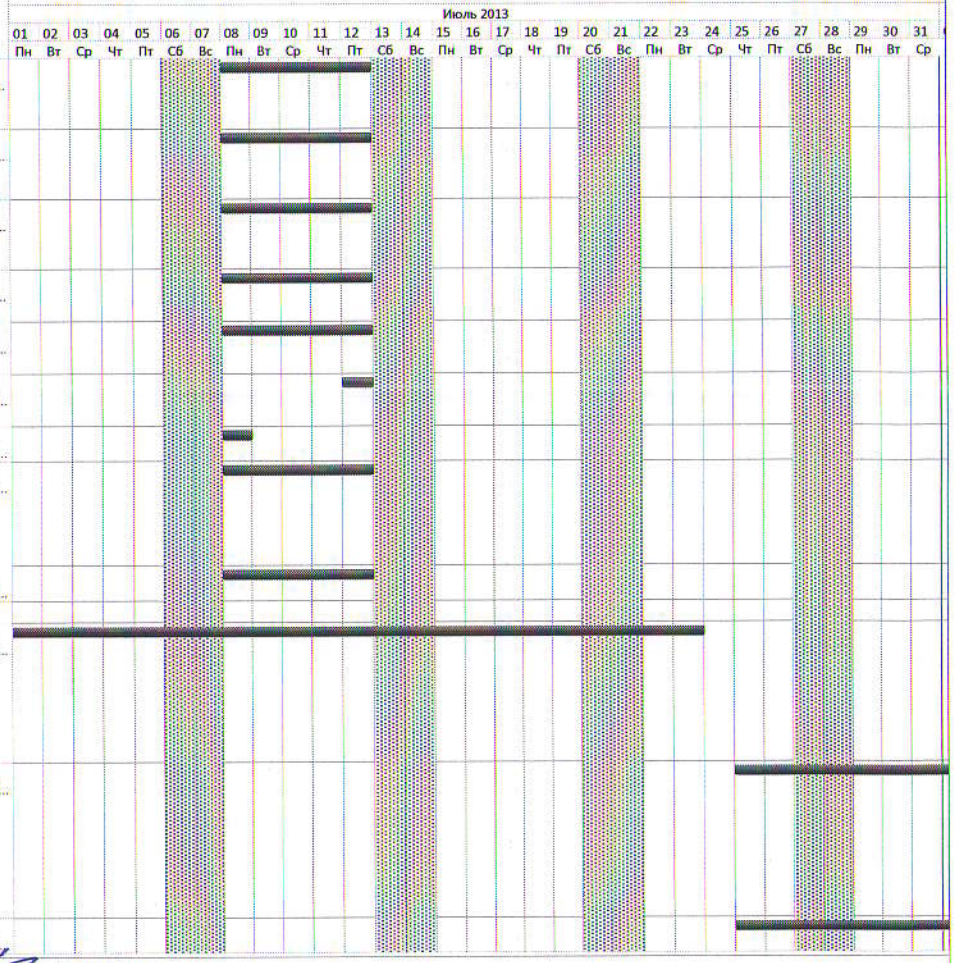

Начальник ОДС _____ **Д.В. Гаврилин**

Начальник СЭР _____ **А.Е. Требухов**

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на июль 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____ В.А. Бусс
"28" _____06 2013г.

Ид.	Название задачи	Месячный Время ремонта. Длительность	Месячный Время ремонта. Начало	Месячный Время ремонта. Конец	Месячная Заявка. время ремонта. Длительность	Месячная Заявленное время. Начало	Месячная Заявленное время. Конец	Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Годовой Время ремонта. Количество дней	Годовой Время ремонта. Начало	Годовой Время ремонта. Конец
72	ШСВЭ-110 (МЭС Волги)	23 дней	Пн 01.07.13	Вт 23.07.13	23 дн...	Пн 01.07....	Вт 23.07....	ТР	02:00	ТО: ШР-110 1СШ, ШСВ-110			с отклю		23 дн...	Пн 01.07....	Вт 23.07....
73	ТН-110 №1 1 СШ (МЭС Волги)	23 дней	Пн 01.07.13	Вт 23.07.13	23 дн...	Пн 01.07....	Вт 23.07....	ТР	02:00	ТО: ШР-110 1СШ, ТН-110 №1 1 СШ			с отклю		23 дн...	Пн 01.07....	Вт 23.07....
74	ТН-110 №2 2 СШ (МЭС Волги)	16 дней	Чт 25.07.13	Пт 09.08.13	16 дн...	Чт 25.07....	Пт 09.08....	ТР	02:00	ТО: ШР-110 2СШ, ТН-2-110кВ №2			с отклю		16 дн...	Чт 25.07....	Пт 09.08....
75	АТ-3 (МЭС Волги)	1 день	Пн 08.07.13	Пн 08.07.13	1 день	Пн 08.07....	Пн 08.07....	ЗРР	02:00	ЗРР: АТ-3 в режиме 220/10 в связи с ТР: ШР-110кВ 2СШ АТ-3		при условии отказа ЗРР АТ-3 с 06.07-08	без отклю		0 дн...	НД	НД
76	АТ-3 (МЭС Волги)	3 дней	Сб 06.07.13	Пн 08.07.13	3 дн...	Сб 06.07....	Пн 08.07....	ЗРР	08:00	Сервисное обслуживание системы предотвращения взрывов Сержи, ТР: ШР-110кВ 1СШ АТ-3			с отклю		0 дн...	НД	НД
77	АТ-3 (МЭС Волги)	1 день	Пт 26.07.13	Пт 26.07.13	1 день	Пт 26.07....	Пт 26.07....	ЗРР	02:00	АТ-3 в режиме 220/10 в связи с ТР: ШР-110кВ 2СШ АТ-3			без отклю		0 дн...	НД	НД
78	ВЭ-110 АТ-3 (МЭС Волги)	3 дней	Сб 06.07.13	Пн 08.07.13	3 дн...	Сб 06.07....	Пн 08.07....	ЗРР	02:00	ТР: ШР-110кВ 1СШ АТ-3; Профиспытания, отбор проб масла			с отклю		1 день	Пн 08.07....	Пн 08.07....
79	ВЭ-110 АТ-3 (МЭС Волги)	1 день	Пт 26.07.13	Пт 26.07.13	1 день	Пт 26.07....	Пт 26.07....	ЗРР	02:00	ТР: ШР-110кВ 2СШ АТ-3			с отклю		1 день	Пт 26.07....	Пт 26.07....
80	АТ-4 (МЭС Волги)	1 день	Пн 29.07.13	Пн 29.07.13	1 день	Пн 29.07....	Пн 29.07....	ЗРР	02:00	АТ-4 в режиме 220/10 в связи с ТР: ШР-110кВ 2СШ АТ-4			без отклю		0 дн...	НД	НД
81	АТ-4 (МЭС Волги)	1 день	Вт 09.07.13	Вт 09.07.13	1 день	Вт 09.07....	Вт 09.07....	ЗРР	02:00	АТ-4 в режиме 220/10 в связи с ТР: ШР-110кВ 1СШ АТ-4; профиспытания ВЭ			без отклю		0 дн...	НД	НД
82	ВЭ-110 АТ-4 (МЭС Волги)	1 день	Пн 29.07.13	Пн 29.07.13	1 день	Пн 29.07....	Пн 29.07....	ЗРР	02:00	ТР: ШР-110кВ 2СШ АТ-4			с отклю		1 день	Пн 29.07....	Пн 29.07....
83	ВЭ-110 АТ-4 (МЭС Волги)	1 день	Вт 09.07.13	Вт 09.07.13	1 день	Вт 09.07....	Вт 09.07....	ЗРР	02:00	ТР: ШР-110кВ 1СШ АТ-4;Профиспытания, отбор проб масла			с отклю		1 день	Ср 10.07....	Ср 10.07....
84	ВЭ-110 Клин-Ключики-2 (МЭС Волги)	1 день	Ср 17.07.13	Ср 17.07.13	2 дн...	Ср 17.07....	Чт 18.07....	ЗРР	02:00	ТО: ШР-110 1СШ ВЛ-110 Клин-Ключики-2			с отклю		2 дн...	Ср 17.07....	Чт 18.07....
85	ВЭ-110 Клин-Ключики-1 (МЭС Волги)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	2 дн...	Пн 15.07....	Вт 16.07....	ЗРР	02:00	ТО: ШР-110 1СШ ВЛ-110 Клин-Ключики-1			с отклю		2 дн...	Пн 15.07....	Ср 17.07....
86	АТ-1 (МЭС Волги)	5 дней	Пн 01.07.13	Пт 05.07.13	5 дн...	Ср 10.07....	Вс 14.07....	БВР	ВЗ	Сервисное обслуживание системы предотвращения взрывов Сержи			с отклю		0 дн...	НД	НД
87	ТН-110 №4 2 СШ (МЭС Волги)	16 дней	Чт 25.07.13	Пт 09.08.13	16 дн...	Чт 25.07....	Пт 09.08....	ТР	02:00	ТО: ШР-110 2СШ, ТН-2-110кВ №4			с отклю		16 дн...	Чт 25.07....	Пт 09.08....
88	ТН-110 №3 1 СШ (МЭС Волги)	23 дней	Пн 01.07.13	Вт 23.07.13	23 дн...	Пн 01.07....	Вт 23.07....	ТР	02:00	ТО: ШР-110 1СШ, ТН-110 №3 1 СШ			с отклю		23 дн...	Пн 01.07....	Вт 23.07....
89	1 СШ 500 кВ (МЭС Волги)	1 день	Пн 01.07.13	Пн 01.07.13	1 день	Ср 10.07....	Ср 10.07....	БВР	01:00	Ввод в работу АТ-1			с отклю		0 дн...	НД	НД
90	1 СШ 500 кВ (МЭС Волги)	1 день	Пт 05.07.13	Пт 05.07.13	1 день	Вс 14.07....	Вс 14.07....	БВР	01:00	Ввод в работу АТ-1			с отклю		0 дн...	НД	НД
91	ВЭ-500 1 СШ 500 БАЭС-Ключики (МЭС Волги)	2 дней	Ср 10.07.13	Чт 11.07.13	2 дн...	Ср 10.07....	Чт 11.07....	ТР	02:00	ТО: ЛР-500 1СШ БАЭС-Ключики. Профвосстановление АУВ.			с отклю		2 дн...	Пн 05.08....	Вт 06.08....

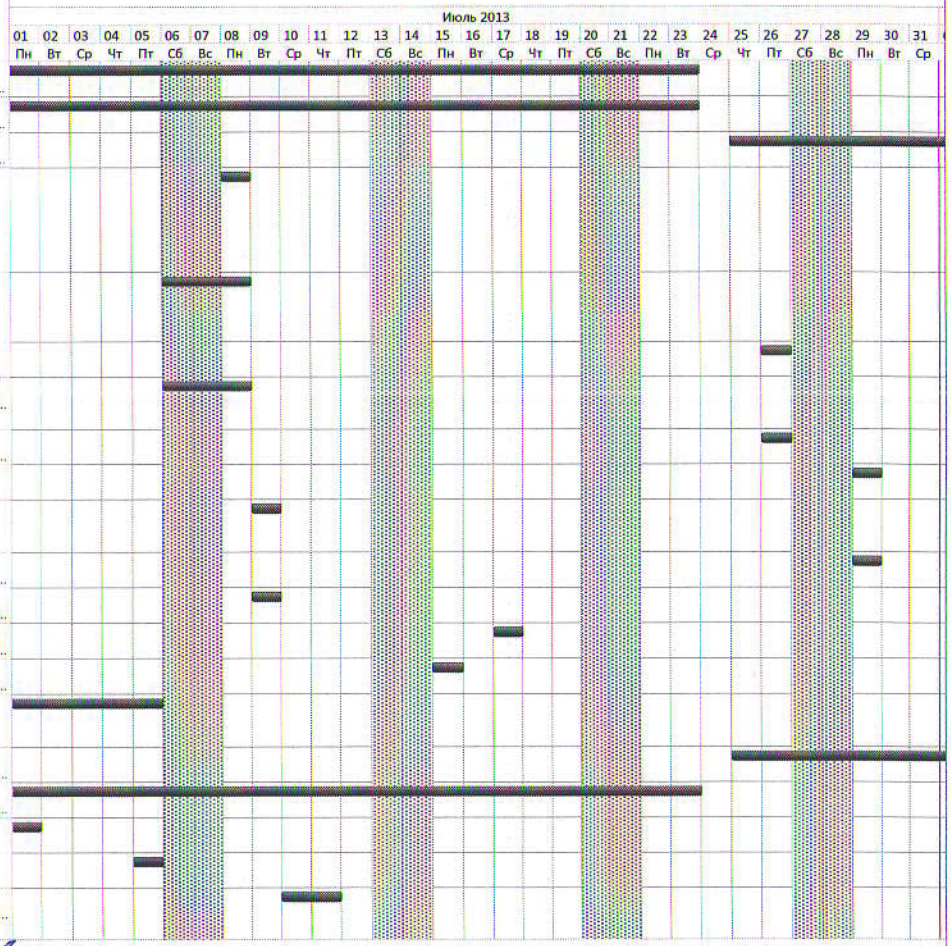

Начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на июль 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"28" 06 2013г.

Ид.	Название задачи	Месячный Время ремонта Длительность	Месячный Время ремонта. Начало	Месячный Время ремонта. Конец	Месячный Заявленное время. Длительность	Месячный Заявленное время. Начало	Месячный Заявленное время. Конец	Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Годовой План Время ремонта Количество дней	Годовой План Время ремонта Начало	Годовой План Время ремонта Конец
92	ВЭ-500 II СШ 500 БАЭС-Ключики (МЭС Волги)	2 дней	Ср 10.07.13	Чт 11.07.13	2 дн...	Ср 10.07....	Чт 11.07....	ТР	02:00	ТО: ЛР-500 2СШ БАЭС-Ключики. Профвосстановление АУВ.			с отклю		2 дн...	Пн 05.08....	Вт 06.08....
93	**ПС 220 кВ Кременки**																
94	В-1-220 Сызрань (МЭС Волги)	5 дней	Пн 22.07.13	Пт 26.07.13	5 дн...	Пн 22.07....	Пт 26.07....	ЗРР	ВЗ	КР: ЛР-1-220 и ЛР-2-220. ТО УРЗиА			с отклю		5 дн...	Пн 22.07....	Пт 26.07....
95	В-2-220 Сызрань (МЭС Волги)	7 дней	Сб 20.07.13	Пт 26.07.13	12 дн...	Пн 15.07....	Пт 26.07....	РЕК	ВЗ	КР и замена В-220. КР: ЛР-1-220 и ЛР-2-220. ТО УРЗиА			с отклю		12 дн...	Пн 15.07....	Пт 26.07....
96	В-110 УК-1 (МЭС Волги)	1 день	Вт 16.07.13	Вт 16.07.13	1 день	Вт 16.07....	Вт 16.07....	ЗРР	01:00	ТО: ШР-1-110			с откл	с переводом на ОВ	1 день	Вт 16.07....	Вт 16.07....
97	В-110 УК-1 (МЭС Волги)	1 день	Пт 26.07.13	Пт 26.07.13	1 день	Пт 26.07....	Пт 26.07....	ЗРР	01:00	ТО: ШР-2-110, В-110			без откл	с переводом на ОВ	1 день	Вс 28.07....	Вс 28.07....
98	В-110 УК-2 (МЭС Волги)	1 день	Пн 29.07.13	Пн 29.07.13	1 день	Пн 29.07....	Пн 29.07....	ЗРР	01:00	ТО: ШР-2-110, В-110			без откл	с переводом на ОВ	1 день	Пн 29.07....	Пн 29.07....
99	В-110 УК-2 (МЭС Волги)	1 день	Ср 17.07.13	Ср 17.07.13	1 день	Ср 17.07....	Ср 17.07....	ЗРР	01:00	ТО: ШР-1-110			без откл	с переводом на ОВ	1 день	Ср 17.07....	Ср 17.07....
100	1 СШ 110 кВ (МЭС Волги)	10 дней	Пт 12.07.13	Вс 21.07.13	10 дн...	Пт 12.07....	Вс 21.07....	ЗРР	01:00	ТО: ШР-1-110			с откл		10 дн...	Пт 12.07....	Вс 21.07....
101	2 СШ 110 кВ (МЭС Волги)	9 дней	Чт 25.07.13	Пт 02.08.13	9 дн...	Чт 25.07....	Пт 02.08....	ЗРР	01:00	ТО: ШР-2-110			с откл		9 дн...	Сб 27.07....	Вс 04.08....
102	ОСШ 110 кВ (МЭС Волги)	9 дней	Пн 01.07.13	Вт 09.07.13	9 дн...	Пн 01.07....	Вт 09.07....	ЗРР	08:00	КР и ЦО: ОР-110 БК-2, ЗСК-2, Сенгилей, ОВ			с откл		9 дн...	Пн 01.07....	Ср 10.07....
103	ШСВ-110 (МЭС Волги)	10 дней	Пт 12.07.13	Вс 21.07.13	10 дн...	Пт 12.07....	Вс 21.07....	ЗРР	01:00	ТО: ШР-1-110			с откл		10 дн...	Пт 12.07....	Вс 21.07....
104	ШСВ-110 (МЭС Волги)	9 дней	Чт 25.07.13	Пт 02.08.13	9 дн...	Чт 25.07....	Пт 02.08....	ТР	01:00	ТО: ШР-2-110, В-110			с откл		9 дн...	Сб 27.07....	Вс 04.08....
105	ОВ-110 (МЭС Волги)	1 день	Ср 31.07.13	Ср 31.07.13	1 день	Ср 31.07....	Ср 31.07....	ЗРР	01:00	ЗРР: в связи с ТО: ШР-2-110, В-110 Сенгилей			без откл		1 день	Ср 31.07....	Сб 31.08....
106	ОВ-110 (МЭС Волги)	1 день	Пт 19.07.13	Пт 19.07.13	1 день	Пт 19.07....	Пт 19.07....	ЗРР	01:00	ЗРР: в связи с ТО: ШР-1-110 В-110 Сенгилей			без откл		1 день	Пт 19.07....	Пт 19.07....
107	ОВ-110 (МЭС Волги)	1 день	Ср 17.07.13	Ср 17.07.13	1 день	Ср 17.07....	Ср 17.07....	ЗРР	ВЗ	ЗРР: в связи с ТО: ШР-1-110 В-110 УК-2			без откл		1 день	Ср 17.07....	Ср 17.07....
108	ОВ-110 (МЭС Волги)	1 день	Сб 20.07.13	Сб 20.07.13	1 день	Сб 20.07....	Сб 20.07....	ЗРР	01:00	ТО: ШР-1-110			с откл		1 день	Сб 20.07....	Сб 20.07....
109	ОВ-110 (МЭС Волги)	1 день	Пт 05.07.13	Пт 05.07.13	1 день	Пт 05.07....	Пт 05.07....	ЗРР	08:00	КР и ЦО: ЛР-110. Профиспытания В-110			с откл		1 день	Пт 05.07....	Пт 05.07....
110	ОВ-110 (МЭС Волги)	1 день	Вт 16.07.13	Вт 16.07.13	1 день	Вт 16.07....	Вт 16.07....	ЗРР	01:00	ЗРР в связи с ТО :ШР-1-110 (замена В-110 УК-1)			без откл		0 дн...	НД	НД
111	ОВ-110 (МЭС Волги)	1 день	Пт 12.07.13	Пт 12.07.13	1 день	Пт 12.07....	Пт 12.07....	ЗРР	01:00	ЗРР в связи с ТО :ШР-1-110, В-110 (Замена В-110 АТ-3)			без откл		0 дн...	НД	НД
112	ОВ-110 (МЭС Волги)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....	ЗРР	ВЗ	ЗРР в связи с ТО :ШР-1-110, В-110 (Замена В-110 БК-2)			без откл		0 дн...	НД	НД
113	ОВ-110 (МЭС Волги)	1 день	Чт 18.07.13	Чт 18.07.13	1 день	Чт 18.07....	Чт 18.07....	ЗРР	ВЗ	ЗРР в связи с ТО :ШР-1-110, В-110 (Замена В-110 АТ-1)			без откл		0 дн...	НД	НД
114	ОВ-110 (МЭС Волги)	1 день	Чт 25.07.13	Чт 25.07.13	1 день	Чт 25.07....	Чт 25.07....	ЗРР	ВЗ	ЗРР в связи с ТО :ШР-2-110, В-110 (Замена В-110 АТ-3)			без откл		0 дн...	НД	НД

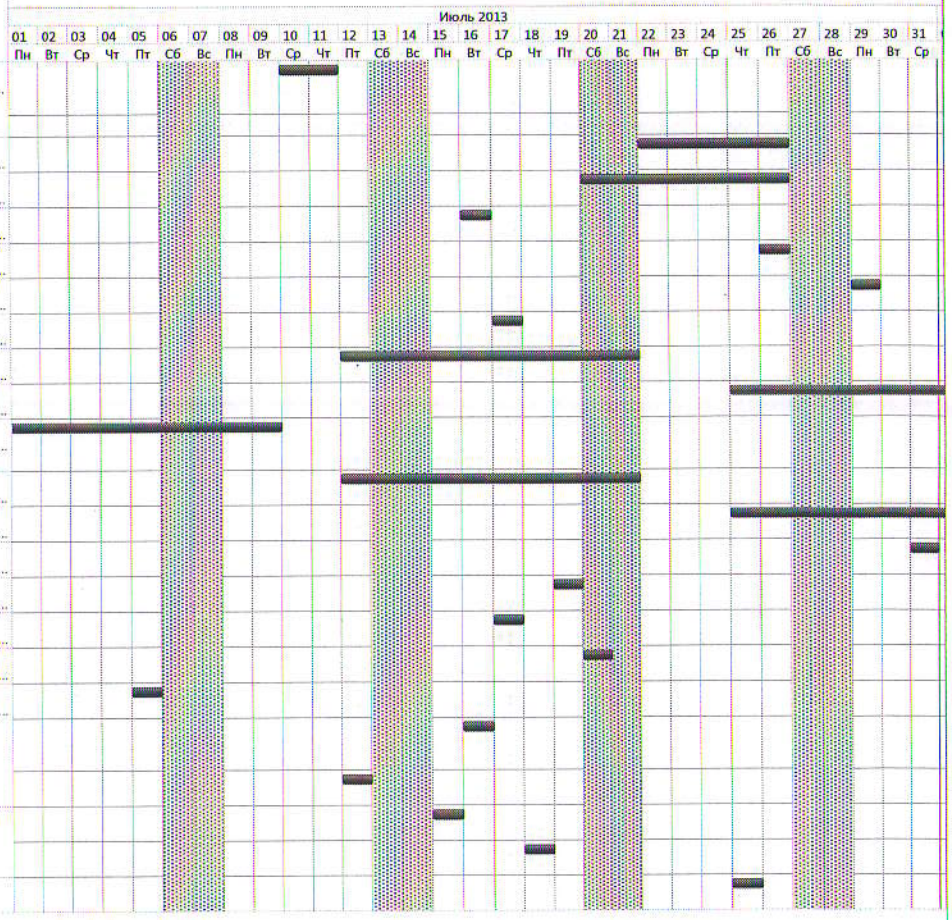

Начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на июль 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____ В.А. Бусс
"__" _____ 2013г.

Ид.	Название задачи	Месячные Время ремонта. Длительность	Месячные Время ремонта. Начало	Месячные Время ремонта. Конец	Месячные Заявленное время. Длительность	Месячные Заявленное время. Начало	Месячные Заявленное время. Конец	Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Годовое Время ремонта. Количество дней	Годовой Время ремонта. Начало	Годовой Время ремонта. Конец
115	ОВ-110 (МЭС Волги)	1 день	Пт 26.07.13	Пт 26.07.13	1 день	Пт 26.07....	Пт 26.07....	ЗРР	В3	ЗРР в связи с ТО :ШР-2-110,В-110 (замена В-110 УК1)			без отклю		0 дн...	НД	НД
116	ОВ-110 (МЭС Волги)	1 день	Пн 29.07.13	Пн 29.07.13	1 день	Пн 29.07....	Пн 29.07....	ЗРР	01:00	ЗРР в связи с ТО :ШР-2-110, В-110 (Замена В-110 УК-2)			без отклю		0 дн...	НД	НД
117	ОВ-110 (МЭС Волги)	1 день	Вт 30.07.13	Вт 30.07.13	1 день	Вт 30.07....	Вт 30.07....	ЗРР	В3	ЗРР в связи с ТО :ШР-2-110, В-110 (Замена В-110 АТ-1)			без отклю		0 дн...	НД	НД
118	ТН-1-110 (МЭС Волги)	10 дней	Пт 12.07.13	Вс 21.07.13	10 дн...	Пт 12.07....	Вс 21.07....	РЕК	В3	Замена ТН-110 и РВС-110 В-110 Профиспытания.ТО: ШР-1-110			с отклю		10 дн...	Пт 12.07....	Вс 21.07....
119	ТН-2-110 (МЭС Волги)	9 дней	Чт 25.07.13	Пт 02.08.13	9 дн...	Чт 25.07....	Пт 02.08....	РЕК	В3	Замена ТН-110 и РВС-110 В-110 Профиспытания.ТО: ШР-2-110			с отклю		9 дн...	Сб 27.07....	Вс 04.08....
120	В-110 АТ-1 (МЭС Волги)	1 день	Чт 18.07.13	Чт 18.07.13	1 день	Чт 18.07....	Чт 18.07....	ЗРР	01:00	ТО: ШР-1-110			с отклю	с переводом на ОВ	1 день	Чт 18.07....	Чт 18.07....
121	В-110 АТ-1 (МЭС Волги)	1 день	Вт 30.07.13	Вт 30.07.13	1 день	Вт 30.07....	Вт 30.07....	ЗРР	01:00	ТО: ШР-2-110, В-110			с отклю	с переводом на ОВ	1 день	Вт 30.07....	Вт 30.07....
122	В-110 АТ-3 (МЭС Волги)	1 день	Чт 25.07.13	Чт 25.07.13	1 день	Чт 25.07....	Чт 25.07....	ЗРР	01:00	ТО: ШР-2-110, В-110			с отклю	с переводом на ОВ	1 день	Сб 27.07....	Сб 27.07....
123	В-110 АТ-3 (МЭС Волги)	1 день	Пт 12.07.13	Пт 12.07.13	1 день	Пт 12.07....	Пт 12.07....	ЗРР	01:00	ТО: ШР-1-110			с отклю	с переводом на ОВ	1 день	Пт 12.07....	Пт 12.07....
124	**ПС 220 кВ Ульяновская**																
125	АТ-1 (МЭС Волги)	1 день	Ср 03.07.13	Ср 03.07.13	1 день	Ср 10.07....	Ср 10.07....	КР	01:00	ЗРР: в режиме 220/6 в связи с выводом 1 СШ 110			с отклю		1 день	Ср 10.07....	Ср 10.07....
126	АТ-2 (МЭС Волги)	1 день	Чт 04.07.13	Чт 04.07.13	1 день	Чт 11.07....	Чт 11.07....	ЗРР	01:00	ЗРР: в режиме 220/6 в связи с выводом 1 СШ 110			с отклю		1 день	Чт 11.07....	Чт 11.07....
127	В 110 Центральная-1 (МЭС Волги)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Ср 03.07....	Ср 03.07....	ТР	01:00	ТО: ШР-1-110, В-110, ТТ-110, ЛР-110			с отклю		1 день	Ср 03.07....	Ср 03.07....
128	В 110 Центральная-2 (МЭС Волги)	1 день	Вт 16.07.13	Вт 16.07.13	1 день	Чт 04.07....	Чт 04.07....	ТР	01:00	ТО: ШР-1-110, В-110, ТТ-110, ЛР-110			с отклю		1 день	Чт 04.07....	Чт 04.07....
129	В 110 Северная-1 (МЭС Волги)	1 день	Вт 02.07.13	Вт 02.07.13	1 день	Вт 02.07....	Вт 02.07....	ТР	01:00	ТО: ШР-1-110, В-110, ТТ-110, ЛР-110			с отклю		1 день	Вт 02.07....	Вт 02.07....
130	В 110 Северная-3 (МЭС Волги)	1 день	Пн 01.07.13	Пн 01.07.13	1 день	Пн 01.07....	Пн 01.07....	ТР	01:00	ТО: ШР-1-110, В-110, ТТ-110, ЛР-110			с отклю		1 день	Пн 01.07....	Пн 01.07....
131	В 110 Майна (МЭС Волги)	1 день	Сб 13.07.13	Сб 13.07.13	1 день	Сб 13.07....	Сб 13.07....	ТР	01:00	ТО: ШР-1-110, В-110, ТТ-110, ЛР-110			с отклю		1 день	Сб 13.07....	Сб 13.07....
132	В 110 Языково (МЭС Волги)	1 день	Ср 17.07.13	Ср 17.07.13	1 день	Пн 08.07....	Пн 08.07....	ТР	01:00	ТО: ШР-1-110, В-110, ТТ-110, ЛР-110			с отклю		1 день	Пн 08.07....	Пн 08.07....
133	В 110 Ишеевка (МЭС Волги)	1 день	Вс 07.07.13	Вс 07.07.13	1 день	Вс 07.07....	Вс 07.07....	ТР	01:00	ТО:ШР-1-110, В-110,ТТ-110,ЛР-110			с отклю		1 день	Вс 07.07....	Вс 07.07....

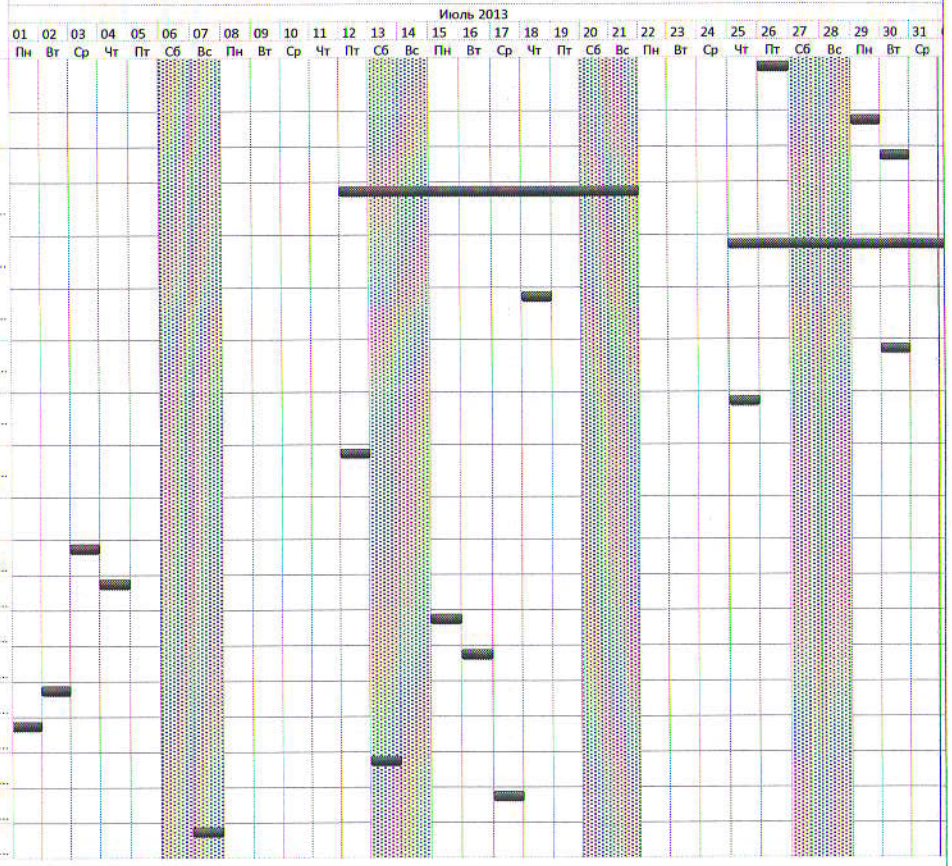

Начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на июль 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"27" 06 2013г.

Ид.	Название задачи	Месячный Время ремонта. Длительность	Месячный Время ремонта. Начало	Месячный Время ремонта. Конец	Месячный Заявленное время. Длительность	Месячный Заявленное время. Начало	Месячный Заявленное время. Конец	Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Годовой Время ремонта. Количество дней	Годовой Время ремонта. Начало	Годовой Время ремонта. Конец
134	1 СШ 110 (МЭС Волги)	9 дней	Сб 29.06.13	Вс 07.07.13	12 дн...	Сб 29.06....	Ср 10.07....	ТР	01:00	ТО: ШР-1-110: БСК, ШСВ, АТ-1, АТ-2, Кременки-1, Кременки-2, Центральная-, Центральная-2, Северная-1, Северная-3, Инеевка, Цильна, Языково, Майна; ТН-1-110			с откл		15 дн...	Сб 29.06....	Ср 10.07....
135	ШСВ 110 (МЭС Волги)	9 дней	Сб 29.06.13	Вс 07.07.13	15 дн...	Сб 29.06....	Сб 13.07....	ТР	01:00	ТО: ШР-1-110, В-110			с откл		15 дн...	Сб 29.06....	Сб 13.07....
136	БСК - Батареи конденсаторов - Средства компенсации реактивной мощности (МЭС Волги)	9 дней	Сб 29.06.13	Вс 07.07.13	15 дн...	Сб 29.06....	Сб 13.07....	ТР	01:00	ТО: ШР-1-110, ТТ-110, БСК,ТО УРЗиА			с откл		15 дн...	Сб 29.06....	Сб 13.07....
137	В 110 АТ-1 (МЭС Волги)	1 день	Ср 03.07.13	Ср 03.07.13	1 день	Ср 10.07....	Ср 10.07....	ЗРР	01:00	ТО: ШР-1-110			с откл		1 день	Ср 10.07....	Ср 10.07....
138	В 110 АТ-2 (МЭС Волги)	1 день	Чт 04.07.13	Чт 04.07.13	1 день	Чт 11.07....	Чт 11.07....	ЗРР	01:00	ТО: ШР-1-110			с откл		1 день	Чт 11.07....	Чт 11.07....
139	В 110 БСК (МЭС Волги)	9 дней	Сб 29.06.13	Вс 07.07.13	15 дн...	Сб 29.06....	Сб 13.07....	ЗРР	01:00	ТО: ШР-1-110, ТТ-110, БСК,ТО УРЗиА			с откл		15 дн...	Сб 29.06....	Сб 13.07....
140	**ПС 220 кВ Черемшанская**																
141	ВВ-220 ТВ-Ч (МЭС Волги)	5 дней	Пн 15.07.13	Пт 19.07.13	6 дн...	Чт 04.07....	Вт 09.07....	ЗРР	12:00	КР: ВВ-220, ЛР-220 ТВ-Ч, ОР-220 ТВ-Ч. Замена ТТ-220. ТО УРЗА			без откл	с переводом на ОВ	4 дн...	Вт 09.07....	Сб 13.07....
142	ВВ-220 ТВ-Ч (МЭС Волги)	5 дней	Пн 15.07.13	Пт 19.07.13	4 дн...	Вт 09.07....	Пт 12.07....	КР	12:00	КР: ВВ-220. Замена ТТ-220. ТО УРЗиА			с откл		4 дн...	Вт 09.07....	Сб 13.07....
143	ВВ-220 Ч-Т (МЭС Волги)	5 дней	Пн 22.07.13	Пт 26.07.13	5 дн...	Пн 15.07....	Пт 19.07....	КР	2	КР: ВВ-220. Замена ТТ-220. ТО УРЗиА			без откл	с переводом на ОВ	5 дн...	Пн 15.07....	Сб 20.07....
144	ОСШ-220кВ (МЭС Волги)	5 дней	Пн 15.07.13	Пт 19.07.13	4 дн...	Вт 09.07....	Пт 12.07....	ЗРР	12:00	КР: ЛР-220 ТВ-Ч, ОР-220 ТВ-Ч. ТО УРЗиА			с откл		4 дн...	Вт 09.07....	Пт 12.07....
145	2СШ-110 кВ (МЭС Волги)	4 дней	Пн 22.07.13	Чт 25.07.13	4 дн...	Пн 22.07....	Чт 25.07....	ЗРР	12:00	КР: ШР-2-110: АТ-1, АТ-2, ТН-2.ТР: РВС-2-110			с откл		4 дн...	Пн 22.07....	Чт 25.07....
146	ТН-2-110кВ (МЭС Волги)	4 дней	Пн 22.07.13	Чт 25.07.13	4 дн...	Пн 22.07....	Чт 25.07....	ЗРР	12:00	КР: ШР-2-110.ТР: РВС-2-110.Проф. Испытания ТН, РВС. ТО УРЗиА			с откл		4 дн...	Пн 22.07....	Чт 25.07....
147	ВВ-110 АТ-2 (МЭС Волги)	2 дней	Вт 23.07.13	Ср 24.07.13	2 дн...	Вт 23.07....	Ср 24.07....	ЗРР	12:00	КР: ШР-2-110 АТ-2			без откл	с переводом на ОВ	2 дн...	Вт 23.07....	Ср 24.07....
148	ВВ-110 АТ-1 (МЭС Волги)	2 дней	Пн 22.07.13	Вт 23.07.13	2 дн...	Пн 22.07....	Вт 23.07....	ЗРР	12:00	КР: ШР-2-110 АТ-1			без откл	с переводом на ОВ	2 дн...	Пн 22.07....	Вт 23.07....
149	**ПС 220 кВ 1М**																
150	ОВ (НИИАР)	5 дней	Вт 09.07.13	Сб 13.07.13	5 дн...	Вт 09.07....	Сб 13.07....	БВР	02:00	Для замены ВВ-Т-2			без откл		5 дн...	Вт 09.07....	Сб 13.07....
151	ШСВ 110 (НИИАР)	5 дней	Вт 02.07.13	Сб 06.07.13	5 дн...	Вт 02.07....	Сб 06.07....	ТР	02:00				с откл		5 дн...	Вт 02.07....	Сб 06.07....
152	ВВ Д-2 (НИИАР)	12 дней	Пн 01.07.13	Пт 12.07.13	12 дн...	Пн 01.07....	Пт 12.07....	КР	ВЗ	КР			с откл	с переводом на ОВ	12 дн...	Пн 01.07....	Пт 12.07....

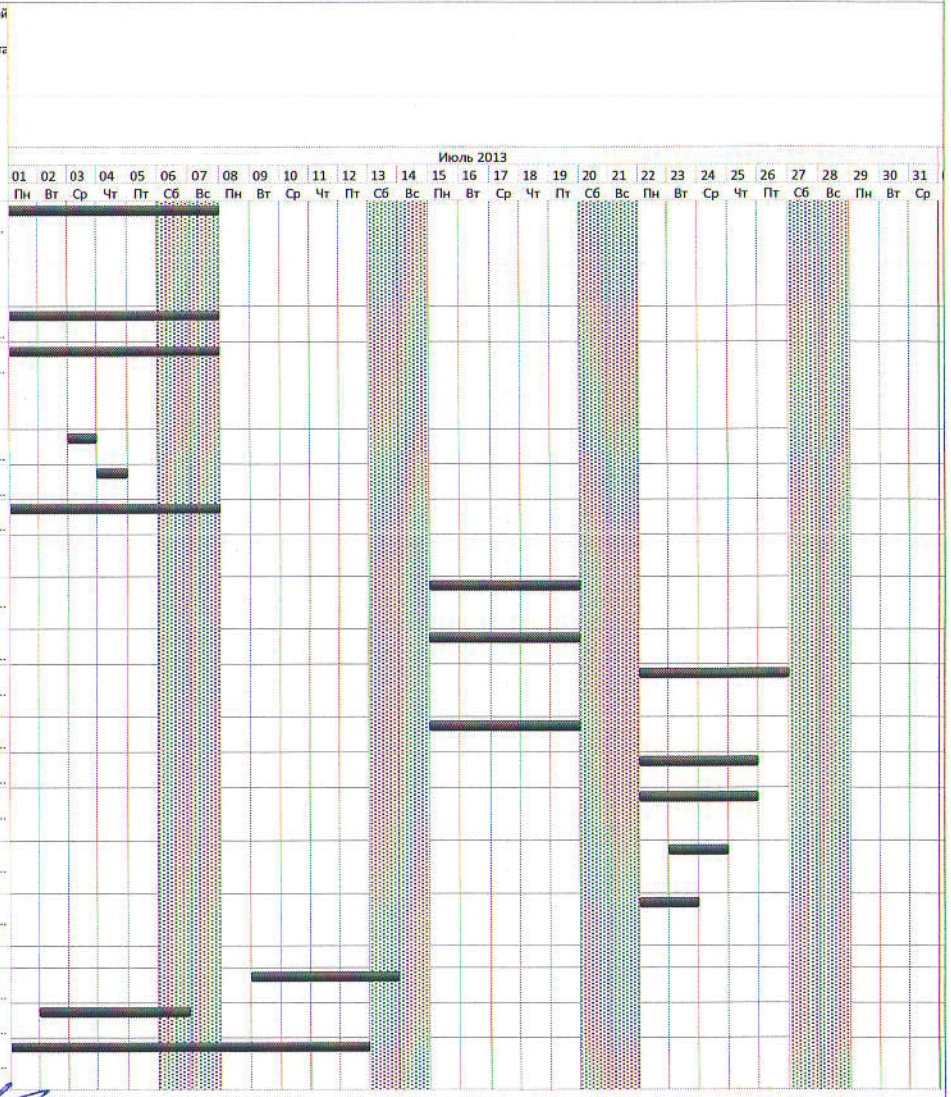

Начальник ОДС _____ **Д.В. Гаврилин**

Начальник СЭР _____ **А.Е. Требухов**

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на июль 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"30" 06 2013г.

Ид.	Название задачи	Месячный Время ремонта. Длит	Месячный Время ремонта. Начало	Месячный Время ремонта. Конец	Месячный Заяв. время. Длит	Месячный Заявлен время. Начало	Месячный Заявлен время. Конец	Вид ремонта	Аварийная готовн	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примеч	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Годовой Время ремонта Коли дней	Годовой Время ремонта Начало	Годовой Время ремонта Конец
153	**ПС 110 кВ Ишеевка**																
154	В-110 Лесная-1 (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....	ТР	01:00	ТО			с откл		1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....
155	В-110 Лесная-2 (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 22.07.13	Пн 22.07.13	1 день	Пн 22.07....	Пн 22.07....	ТР	01:00	ТО			с откл		1 день	Пн 22.07....	Пн 22.07....
156	**ПС 110 кВ Северная**																
157	1СШ-110 кВ (Ульяновский ЦУС)	14 дней	Пн 15.07.13	Вс 28.07.13	18 дн...	Пн 01.07....	Чт 18.07....	ТР	01:00	ТО			с откл		18 дн...	Пн 01.07....	Чт 18.07....
158	2СШ-110 кВ (Ульяновский ЦУС)	2 дней	Пн 29.07.13	Вт 30.07.13	2 дн...	Пн 22.07....	Вт 23.07....	ТР	01:00	ТО			с откл		2 дн...	Пн 22.07....	Вт 23.07....
159	ОСШ-110 кВ (Ульяновский ЦУС)	14 дней	Пн 15.07.13	Вс 28.07.13	18 дн...	Пн 01.07....	Чт 18.07....	ТР	01:00	ТО			с откл		18 дн...	Пн 01.07....	Чт 18.07....
160	ОВ-110 (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....	ТР	01:00	ТО			с откл		1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....
161	ШСВ-110 (Ульяновский ЦУС)	1 день	Вт 16.07.13	Вт 16.07.13	1 день	Вт 16.07....	Вт 16.07....	ТР	01:00	ТО			с откл		1 день	Вт 16.07....	Вт 16.07....
162	В-110 С-4 (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 08.07.13	Пн 08.07.13	1 день	Пн 08.07....	Пн 08.07....	ТР	01:00	ТО			с откл		1 день	Пн 08.07....	Пн 08.07....
163	В-110 Л-1 (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....	ТР	01:00	ТО			с откл		1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....
164	В-110 Л-2 (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 22.07.13	Пн 22.07.13	1 день	Пн 22.07....	Пн 22.07....	ТР	01:00	ТО			с откл	с отключени	1 день	Пн 22.07....	Пн 22.07....
165	**ПС 110 кВ Центральная**																
166	1 СШ-110 (Ульяновский ЦУС)	1 день	Пн 01.07.13	Пн 01.07.13	1 день	Пн 01.07....	Пн 01.07....	ТР	01:00	Расшиновка ШР-1-110 Ц-4 , ШР-2-110 Ц-4			с откл		1 день	Ср 24.07....	Ср 24.07....
167	2 СШ-110 (Ульяновский ЦУС)	1 день	Вт 02.07.13	Вт 02.07.13	1 день	Вт 02.07....	Вт 02.07....	ТР	01:00	Расшиновка ШР-1-110 Ц-4 , ШР-2-110 Ц-4			с откл		1 день	Чт 25.07....	Чт 25.07....
168	ОСШ-110 (Ульяновский ЦУС)	1 день	Вт 02.07.13	Вт 02.07.13	1 день	Вт 02.07....	Вт 02.07....	ТР	01:00	Расшиновка ШР-1-110 Ц-4 , ШР-2-110 Ц-4			с откл		0 дн...	НД	НД
169	В-110 Ц-4 (Ульяновский ЦУС)	58 дней	Вт 04.06.13	Ср 31.07.13	58 дн...	Вт 04.06....	Ср 31.07....	РЕК	ВЗ	ТО			с откл		52 дн...	Вт 04.06....	Пт 26.07....
170	**ПС 110 кВ Налейка**																
171	ВС-110 (КЖД РЖД)	1 день	Пн 22.07.13	Пн 22.07.13	1 день	Пн 22.07....	Пн 22.07....	ТР	01:00	ТР:2 СШ-110, ШР, ЛР-110кВ, покраска оборудования			с откл		1 день	Пн 22.07....	Пн 22.07....
172	**ПС 110 кВ Ночка**																
173	ВС-110 (КЖД РЖД)	1 день	Вт 16.07.13	Вт 16.07.13	1 день	Вт 16.07....	Вт 16.07....	ТР	01:00	ТР:1 СШ-110 ШР, ЛР-110кВ, покраска оборудования			с откл		1 день	Вт 16.07....	Вт 16.07....
174	ВС-110 (КЖД РЖД)	1 день	Ср 17.07.13	Ср 17.07.13	1 день	Ср 17.07....	Ср 17.07....	ТР	01:00	ТР:2 СШ-110 ШР, ЛР-110кВ, покраска оборудования			с откл		1 день	Ср 17.07....	Ср 17.07....
175	**ПС 110 кВ Рачейка**																
176	В-110 Р-Н 1 (КЖД РЖД)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....	ТР	01:00	ТР ШР, ЛР-110кВ, покраска оборудования, проф. Контроль дил. защиты ши СВ, проф. Контроль делительной защиты 2СШ, проф. Контроль устройств РЗА В-110Р-Н, В-110 Р-К			с откл		0 дн...	НД	НД

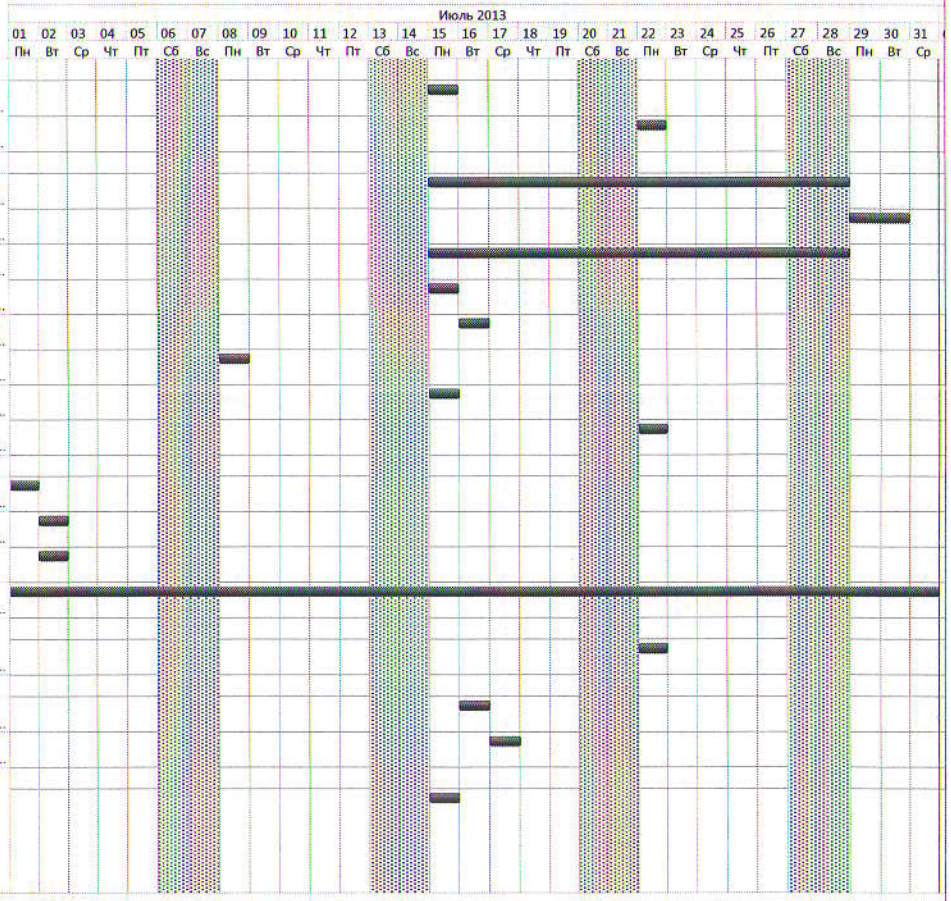

Начальник ОДС _____ **Д.В. Гаврилин**

Начальник СЭР _____ **А.Е. Требухов**

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на июль 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____ В.А. Бусс
"__" _____ 2013г.

Ид.	Название задачи	Месячный Время ремонта. Длит	Месячный Время ремонта. Начало	Месячный Время ремонта. Конец	Месячный Заяв. время. Длит	Месячный Заявлен. время. Начало	Месячный Заявлен. время. Конец	Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Годовой Время ремонта Количество дней	Годовой Время ремонта Начало	Годовой Время ремонта Конец
177	В-110 Р-К 2 (КЖД РЖД)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....	ТР	01:00	ТР ШР, ЛР-110кВ, покраска оборудования, проф. Контроль диф. защиты шин, проф. Контроль делительной защиты, проф. Контроль устройств РЗА В-110Р-Н, В-110 Р-К			с откл		0 дн...	НД	НД
178	В-110 Ж-Р2 (КЖД РЖД)	1 день	Чт 18.07.13	Чт 18.07.13	1 день	Чт 18.07....	Чт 18.07....	ТР	01:00	ТР ШР, ЛР-110кВ, покраска оборудования, проф.,пробование диф. защиты С СШ-110 шин, проф. контроль РЗА В-110 Ж-Р, В-110 С-Р			с откл		0 дн...	НД	НД
179	В-110 СР-1 (КЖД РЖД)	1 день	Чт 18.07.13	Чт 18.07.13	1 день	Чт 18.07....	Чт 18.07....	ТР	01:00	ТР ШР, ЛР-110кВ, покраска оборудования, проф.,пробование диф. защиты С СШ-110 шин, проф. контроль РЗА В-110 Ж-Р, В-110 С-Р			с откл		0 дн...	НД	НД
180	СВ-110 (КЖД РЖД)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....	ТР	01:00	ТР ШР, ЛР-110кВ, покраска оборудования, проф. Контроль дил. защиты шин СВ, проф. Контроль делительной защиты 2СШ, проф. Контроль устройств РЗА В-110Р-Н, В-110 Р-К			с откл		0 дн...	НД	НД
181	2СШ-110 кВ (КЖД РЖД)	1 день	Пн 15.07.13	Пн 15.07.13	1 день	Пн 15.07....	Пн 15.07....	ТР	01:00	ТР ШР, ЛР-110кВ, покраска оборудования, проф. Контроль дил. защиты шин СВ, проф. Контроль делительной защиты 2СШ, проф. Контроль устройств РЗА В-110Р-Н, В-110 Р-К			с откл		1 день	Пн 15.07....	Вт 16.07....
182	1СШ-110 кВ (КЖД РЖД)	1 день	Чт 18.07.13	Чт 18.07.13	1 день	Чт 18.07....	Чт 18.07....	ТР	01:00	ТР ШР, ЛР-110кВ, покраска оборудования, проф.,пробование диф. защиты С СШ-110 шин, проф. контроль РЗА В-110 Ж-Р, В-110 С-Р			с откл		1 день	Чт 18.07....	Пт 19.07....
183	**Ульяновская ТЭЦ-1**																
184	ВЭ ШСВ (Ульяновская ТЭЦ-1)	6 дней	Пн 08.07.13	Сб 13.07.13	6 дн...	Пн 08.07....	Сб 13.07....	ТР	08:00	ТО			с откл		6 дн...	Пн 08.07....	Вс 14.07....
185	**Ульяновская ТЭЦ-2**	138 д...	Пн 01.07.13	Пт 15.11....	0 ...	НД	НД								0 ...	НД	НД
186	ГТ-1 - Т-110 кВ (Ульяновская ТЭЦ-2)	110 дней	Пн 29.07.13	Пт 15.11.13	110 дн...	Пн 29.07....	Пт 15.11....	СР	ВЗ	СР			с откл		3 дн...	Пн 29.07....	Чт 01.08....
187	ОСШ-110-34 (Ульяновская ТЭЦ-2)	4 дней	Пн 22.07.13	Чт 25.07.13	4 дн...	Пн 22.07....	Чт 25.07....	ЗРР	ВЗ	Включить для замены В-110			без откл		0 дн...	НД	НД
188	ОВ-110 - 34 (Ульяновская ТЭЦ-2)	4 дней	Пн 22.07.13	Чт 25.07.13	4 дн...	Пн 22.07....	Чт 25.07....	БВР	ВЗ	Включить для замены В-110			без откл		4 дн...	Пн 22.07....	Пт 26.07....
189	ТН-2-220 (Ульяновская ТЭЦ-2)	4 дней	Пн 01.07.13	Чт 04.07.13	4 дн...	Пн 01.07....	Чт 04.07....	ТР	08:00	ТР			с откл		4 дн...	Пн 01.07....	Пт 05.07....

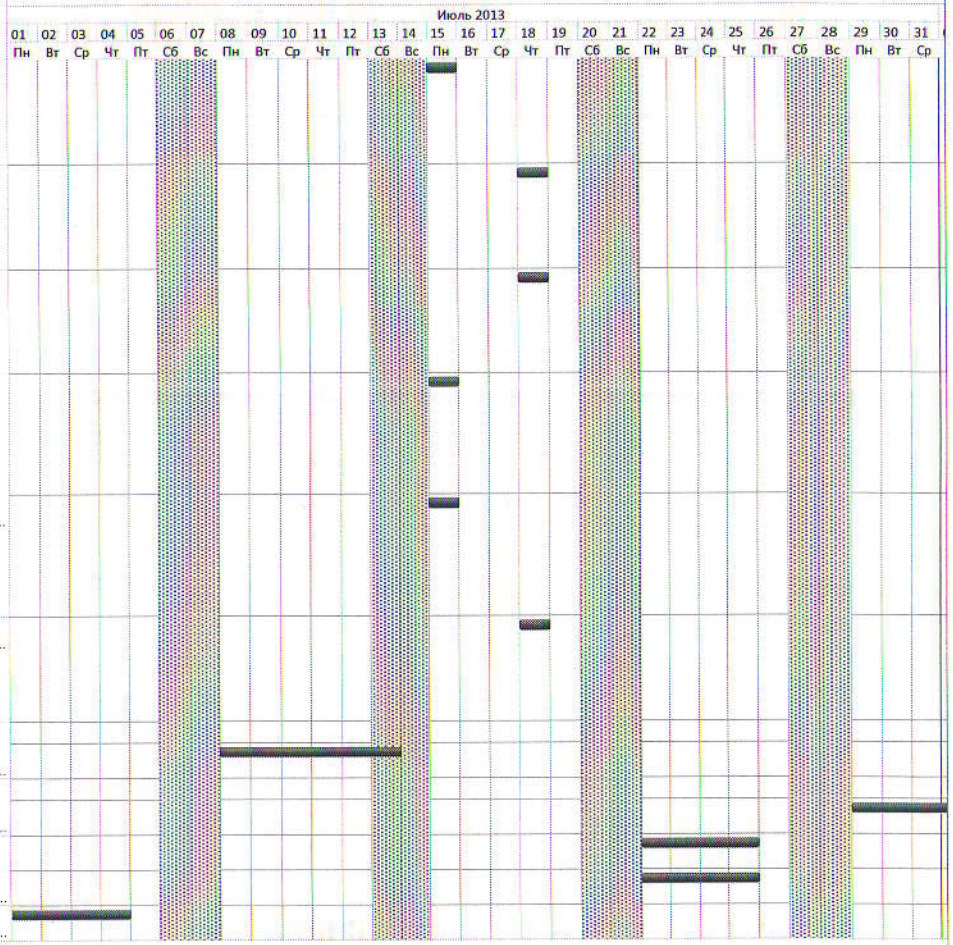

Начальник ОДС_____ Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____ А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на июль 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"29" 06 2013г.

Ид.	Название задачи	Месячный Время ремонта. Длительность	Месячный Время ремонта. Начало	Месячный Время ремонта. Конец	Месячный Заявленное время. Длительность	Месячный Заявленное время. Начало	Месячный Заявленное время. Конец	Вид ремонта	Готовность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Годовой Время ремонта. Длительность	Годовой Время ремонта. Начало	Годовой Время ремонта. Конец
190	В-110 Д-1 (Ульяновская ТЭЦ-2)	8 дней	Пт 05.07.13	Пт 12.07.13	11 дн...	Пн 08.07....	Чт 18.07....	ТР	08:00	ТР. С заменой на ОВ-110-34			с откл	с переводом на ОВ	11 дн...	Пн 08.07....	Пт 19.07....
191	В-110 Д-2 (Ульяновская ТЭЦ-2)	4 дней	Пн 15.07.13	Чт 18.07.13	4 дн...	Пн 15.07....	Чт 18.07....	ТР	08:00	ТР. С заменой на ОВ-110-34			с откл	с переводом на ОВ	4 дн...	Пн 15.07....	Пт 19.07....
192	В-110 ГТ-1 (Ульяновская ТЭЦ-2)	3 дней	Пн 29.07.13	Ср 31.07.13	3 дн...	Пн 29.07....	Ср 31.07....	СР	ВЗ	СР			с откл		3 дн...	Пн 29.07....	Чт 01.08....
193	**Транзит 110 кВ**																
194	Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Барыш – Умыс (Ульяновский ЦУС)	12 дней	Пн 01.07.13	Пт 12.07.13	12 дн...	Пн 01.07....	Пт 12.07....	ЗРР	01:00	КР ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево)			с откл		0 дн...	НД	НД
195	Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Барыш – Умыс (Ульяновский ЦУС)	1 день	Вт 16.07.13	Вт 16.07.13	1 день	Вт 16.07....	Вт 16.07....	ЗРР	01:00	ТР:ШР,ДР -110 кВ,покраска оборудования на ПС 110 кВ Ночка			с откл		0 дн...	НД	НД
196	Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Барыш – Умыс (Ульяновский ЦУС)	1 день	Ср 17.07.13	Ср 17.07.13	1 день	Ср 17.07....	Ср 17.07....	ЗРР	01:00	ТР:ШР,ДР -110 кВ,покраска оборудования на ПС 110 кВ Ночка			с откл		0 дн...	НД	НД

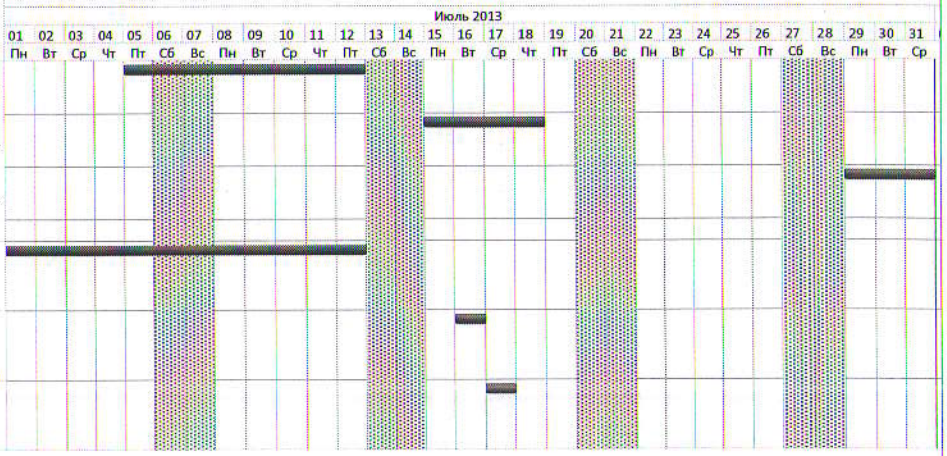

Начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов
