Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на сентябрь 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"29" 08 2013г.

Ид.	Название задачи	Мес	Месячн	Месячн	Месяч	Месячны	Месячны	Вид	Авари	Содержание работ	Прич	Прог	Сос	Условия	Годо	Годовой.	Годовой.
		Вре	Время	Время	Заявл	Заявленн	Заявленн	рем	готов		отка	прил	обо	произво	Врем	Время	Время
		Дли	ремонта	ремонта	время	время.	время.						по	работ	ремо	ремонта.	ремонта.
			Начало	Конец	Длите	Начало	Конец						заяв		Коли	Начало	Конец
1	**ВЛ 500 кВ**																
2	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Вешкайма Южная (МЭС Волги)	5 дне	Пн 30.09.13	Пт 04.10.13	5 дней	Пн 30.09.13	Пт 04.10.13	ТР	06:00	Установка гас. виб. на п.д, расширение просеки. Вырубка деревьев. Рем провода, ремонт троса, расширение просеки, замена изоляции, верховой осмотр ВЛ, регулировка искровых промежутков; ПС Вешкайма: ТО ЛР-1, ЛР-2,ВЧЗ, КС, ТТЛ, ТНЛ-1, ТНЛ-2. профиспытания			с откл		5 дн...	Пн 30.09.13	Пт 04.10.13
3	**ВЛ 200 кВ**																
4	ВЛ 220 кВ Ключики - Барыш (МЭС Волги)	3 дне	Пн 23.09.13	Ср 25.09.13	3 дней	Пн 23.09.13	Ср 25.09.13	ЗРР	01:00	ПС Барыш: ЗРР: в связи с ТО АТ-1, ОД-220 АТ-1.			с откл		0 дн...	НД	НД
5	ВЛ 220 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Черемшанская (МЭС Волги)	2 дне	Сб 07.09.13	Вс 08.09.13	2 дней	Сб 07.09.13	Вс 08.09.13	БВР	02:00	Вырубка деревьев, верховой осмотр ВЛ, верховой осмотр ВОЛС			с откл		2 дн...	Сб 07.09.13	Пн 09.09.13
6	**ВЛ 110 кВ**																
7	ВЛ 110 кВ Вешкайма - Чуфарово (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Чт 26.09.13	Чт 26.09.13	1 день	Пн 23.09.13	Пн 23.09.13	ЗРР	01:00	ТО 2СШ-110 на ПС-110 кВ Чуфарово			с откл		0 дн...	НД	НД
8	ВЛ 110 кВ Майна - Чуфарово (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Чт 26.09.13	Чт 26.09.13	1 день	Пн 23.09.13	Пн 23.09.13	ЗРР	01:00	ТО 2СШ-110 на ПС-110 кВ Чуфарово			с откл		0 дн...	НД	НД
9	ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево) (Ульяновский ЦУС)	5 дне	Чт 26.09.13	Пн 30.09.13	5 дней	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13	КР	01:00	КР			с откл		5 дн...	Пн 09.09.13	Сб 14.09.13
10	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Димитровградская – 1) (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Сб 28.09.13	Вс 29.09.13	2 дней	Ср 04.09.13	Чт 05.09.13	БВР	08:00	Опиновка присоединения на ПС-110 кВ Чердаклы			с откл		0 дн...	НД	НД
11	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Северная II цепь (ВЛ 110 кВ Северная – 5) (Ульяновский ЦУС) ОТКАЗ	1 ден	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	1 день	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	БВР	01:00	ТО ЛР-110 С-5 на ПС-110 кВ Северная			с откл		1 день	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13
12	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-2) (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Пн 09.09.13	Вт 10.09.13	2 дней	Пн 09.09.13	Вт 10.09.13	БВР	01:00	ТО ЛР-110 УК-2 на ПС-110 кВ Б.Ключищи;			с откл		0 дн...	НД	НД
13	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-2) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Вт 10.09.13	Вт 10.09.13	1 день	Вт 10.09.13	Вт 10.09.13	БВР	01:00	ТО ЛР-110 Т-3 на ПС-110 кВ Южная			с откл		1 день	Вт 10.09.13	Вт 10.09.13

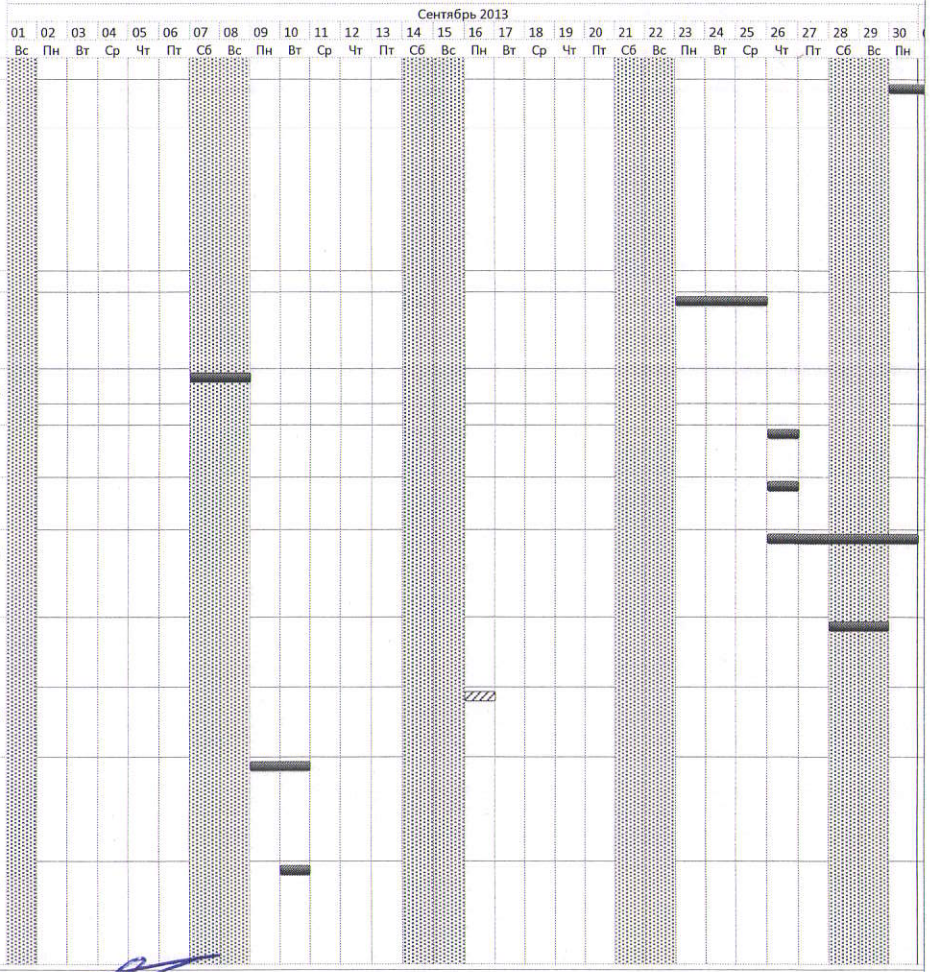

Заместитель главого диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на сентябрь 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"29" 08 2013г.

Ид.	Название задачи	Мес Врем рем Дли	Месячные Время ремонта Начало	Месячные Время ремонта Конец	Месяч Заявл время Длите	Месячные Заявленн время. Начало	Месячные Заявленн время. Конец	Вид рем	Авари готов	Содержание работ	При откл	Про прик	Сос обо по зая	Условия произво работ	Годо Врем рем Коли дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец
14	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-2) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пн 09.09.13	Пн 09.09.13	1 день	Пн 09.09.13	Пн 09.09.13	БВР	01:00	ТО ЛР-110 Т-2 на ПС-110 кВ Южная			с откл		2 дн...	Пн 09.09.13	Вт 10.09.13
15	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-2) (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Пн 09.09.13	Вт 10.09.13	2 дней	Пн 09.09.13	Вт 10.09.13	БВР	01:00	ТО ЛР-110 УК-2 на ПС-110 кВ Свияга			с откл		1 день	Пн 09.09.13	Вт 10.09.13
16	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-1) (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Пн 02.09.13	Вт 03.09.13	2 дней	Пн 02.09.13	Вт 03.09.13	БВР	01:00	ТО ЛР-110 УК-1 на ПС-110 кВ Б.Ключищи			с откл		0 дн...	НД	НД
17	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-1) (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Пн 02.09.13	Вт 03.09.13	2 дней	Пн 02.09.13	Вт 03.09.13	БВР	ВЗ	ТО ЛР-110 УК-1 на ПС-110 кВ Свияга			с откл		0 дн...	НД	НД
18	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-1) (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Пн 02.09.13	Вт 03.09.13	2 дней	Пн 02.09.13	Вт 03.09.13	БВР	01:00	ТО ЛР-110 Т-1 на ПС-110 кВ Южная			с откл		2 дн...	Пн 02.09.13	Вт 03.09.13
19	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Восточная II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная – 4) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пн 23.09.13	Пн 23.09.13	1 день	Пн 23.09.13	Пн 23.09.13	БВР	01:00	ЛР-110 В-4 на ПС-110 кВ Восточная			с откл		1 день	Пн 23.09.13	Пн 23.09.13
20	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Восточная I цепь (ВЛ 110 кВ Восточная – 3) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	1 день	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	БВР	ВЗ	ТО ЛР-110 В-3 на ПС-110 кВ Восточная			с откл		1 день	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13
21	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Центральная с отпайкой на АЗЧ II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-4) (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Вт 10.09.13	Ср 11.09.13	6 дней	Пн 09.09.13	Сб 14.09.13	БВР	ВЗ	Реконструкция: ошиновка ЛР-110 Ц-4			с откл		0 дн...	НД	НД
22	ВЛ 110 кВ Майна – Языково с отпайкой на ПС Чуфарово (ВЛ 110 кВ Майна – Языково) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пт 27.09.13	Пт 27.09.13	1 день	Вт 24.09.13	Вт 24.09.13	БВР	01:00	ТО 1СШ-110 на ПС-110 кВ Чуфарово			с откл		0 дн...	НД	НД
23	ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-1) (Ульяновский ЦУС)	5 дне	Пн 30.09.13	Пт 04.10.13	5 дней	Пн 30.09.13	Пт 04.10.13	ТР	01:00	ТО			с откл		5 дн...	Пн 30.09.13	Пт 04.10.13
24	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Северная II цепь (ВЛ 110 кВ Северная – 5) (Ульяновский ЦУС) ОТКАЗ	5 дне	Пн 16.09.13	Пт 20.09.13	5 дней	Пн 16.09.13	Пт 20.09.13	ТР	01:00	ТО			с откл		5 дн...	Пн 16.09.13	Пт 20.09.13
25	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-2) (Ульяновский ЦУС)	3 дне	Пн 09.09.13	Ср 11.09.13	3 дней	Пн 09.09.13	Ср 11.09.13	ТР	01:00	ТО			с откл		3 дн...	Пн 09.09.13	Ср 11.09.13

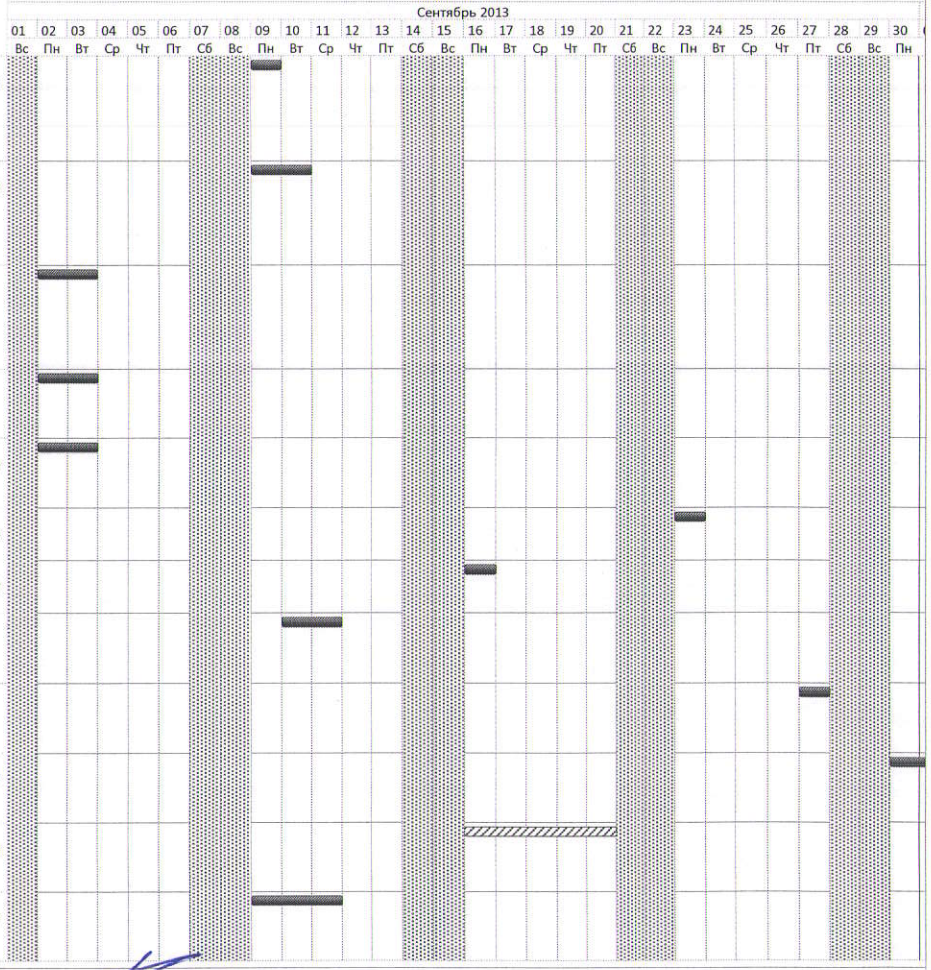

Заместитель главого диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на сентябрь 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"29" 08 2013г.

Ид.	Название задачи	Ме Вре рем Дли	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Месяч Заявл время Длите	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид ремо	Авари готовн	Содержание работ	Прич отка	Проч прим	Сос обо по заяв	Условия произво работ	Годо Врем ремо Коли дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец
26	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-1) (Ульяновский ЦУС)	3 дне	Пн 02.09.13	Ср 04.09.13	3 дней	Пн 02.09.13	Ср 04.09.13	ТР	01:00	ТО			с откл		3 дн...	Пн 02.09.13	Ср 04.09.13
27	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Восточная II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная – 4) (Ульяновский ЦУС)	5 дне	Пн 23.09.13	Пт 27.09.13	5 дней	Пн 23.09.13	Пт 27.09.13	ТР	01:00	ТО			с откл		5 дн...	Пн 23.09.13	Пт 27.09.13
28	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Восточная I цепь (ВЛ 110 кВ Восточная – 3) (Ульяновский ЦУС)	5 дне	Пн 16.09.13	Пт 20.09.13	5 дней	Пн 16.09.13	Пт 20.09.13	ТР	01:00	ТО			с откл		5 дн...	Пн 16.09.13	Пт 20.09.13
29	ВЛ 110 кВ Барыш - Патрикеево (МЭС Волги)	3 дне	Пн 16.09.13	Ср 18.09.13	3 дней	Пн 09.09.13	Ср 11.09.13	БВР	04:00	ТР: ВЧЗ-110 и КС-110. ТО: ЛР-110. Профиспытания. Верховой осмотр портала Вл.Замена поддержиающих ИОС на ПС 220 кВ Барыш			с откл		0 дней	НД	НД
30	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-1) (МЭС Волги)	5 дне	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	5 дней	Пн 23.09.13	Пт 27.09.13	БВР	02:00	ТО УРЗиА			с отк.		0 дн...	НД	НД
31	ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-1) (МЭС	1 ден	Пн 30.09.13	Пн 30.09.13	1 день	Вт 24.09.13	Вт 24.09.13	БВР	01:00	ТО: ЛР-110, ВЧ заградителя, КС на ПС 220 кВ Ульяновская			с отк.		0 дн...	НД	НД
32	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Северная с отпайкой на ПС УАЗ (ВЛ 110 кВ Северная – 1) (МЭС Волги)	1 ден	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	1 день	Сб 21.09.13	Сб 21.09.13	БВР	01:00	ТО: ЛР-110, ВЧ заградителя, КС на ПС 220 кВ Ульяновская			с отк.		0 дн...	НД	НД
33	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Ульяновская с отпайками (ВЛ 110 кВ Северная – 3) (МЭС Волги)	1 ден	Пт 27.09.13	Пт 27.09.13	1 день	Пт 20.09.13	Пт 20.09.13	БВР	01:00	ТО: ЛР-110, ВЧ заградителя, КС на ПС 220 кВ Ульяновская			с отк.		0 дн...	НД	НД
34	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-2) (МЭС Волги)	1 ден	Чт 26.09.13	Чт 26.09.13	1 день	Вт 17.09.13	Вт 17.09.13	БВР	01:00	ТО: ЛР-110 на ПС 220 кВ Ульяновская			с отк.		0 дн...	НД	НД
35	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-1) (МЭС Волги)	1 ден	Ср 25.09.13	Ср 25.09.13	1 день	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	БВР	01:00	ТО: ЛР-110, ВЧ заградителя, КС на ПС 220 кВ Ульяновская			с отк.		0 дн...	НД	НД
36	ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-2) (МЭС Волги)	1 ден	Пн 23.09.13	Пн 23.09.13	1 день	Пн 23.09.13	Пн 23.09.13	БВР	01:00	ТО: ЛР-110, ВЧ заградителя, КС на ПС 220 кВ Ульяновская			с отк.		0 дн...	НД	НД
37	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка с отпайкой на ПС Мелькомбинат (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка) (МЭС Волги)	1 ден	Вт 24.09.13	Вт 24.09.13	1 день	Чт 26.09.13	Чт 26.09.13	БВР	01:00	ТО: ЛР-110, ВЧ заградителя, КС на ПС 220 кВ Ульяновская			с отк.		0 дн...	НД	НД
38	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна) (МЭС Волги)	1 ден	Сб 21.09.13	Сб 21.09.13	1 день	Пт 27.09.13	Пт 27.09.13	БВР	01:00	ТО: ЛР-110, ВЧ заградителя, КС на ПС 220 кВ Ульяновская			с отк.		0 дн...	НД	НД
39	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Языково с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Языково) (МЭС Волги)	1 ден	Пт 20.09.13	Пт 20.09.13	1 день	Ср 25.09.13	Ср 25.09.13	БВР	01:00	ТО: ЛР-110, ВЧ заградителя, КС на ПС 220 кВ Ульяновская			с отк.		0 дн...	НД	НД

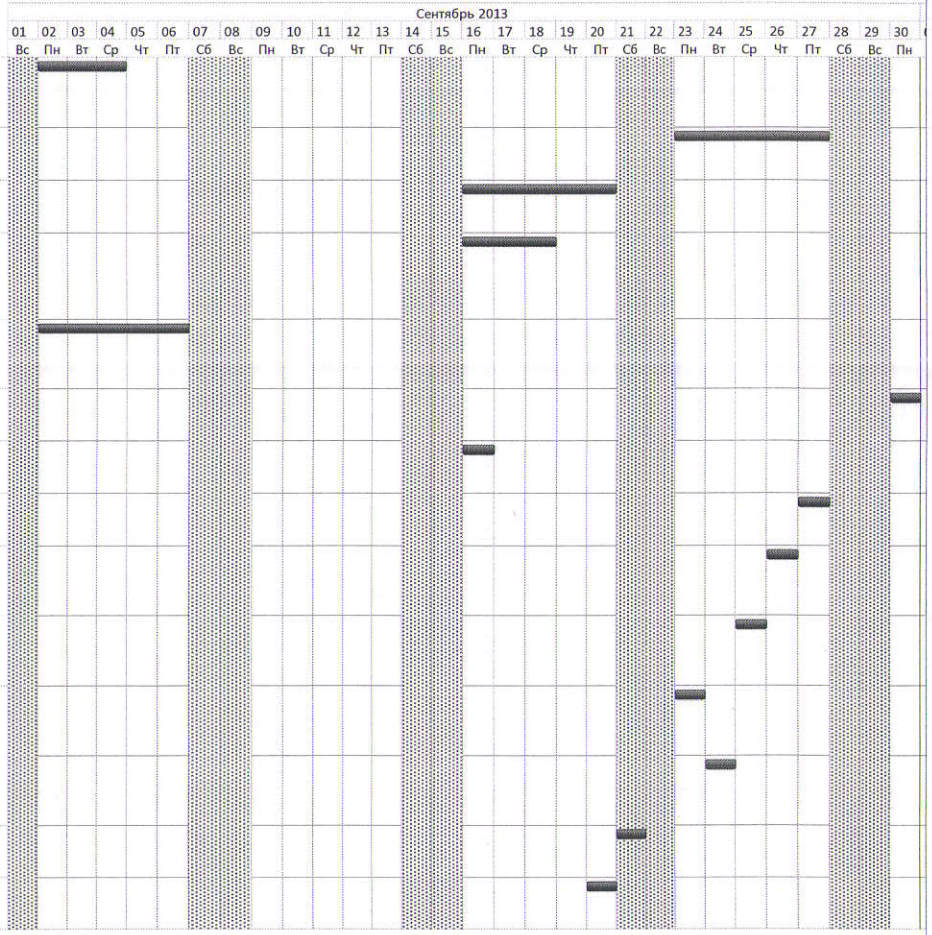

Заместитель главого диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на сентябрь 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"29" 08 2013г.

Ид.	Название задачи	Мес Врем рем Дли	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Месяч Заявл время Длите	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид рем	готов	Содержание работ	Прич отка	Прод прил	Сос обо по заяв	Условия произво работ	Годо Врем рем Коли дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец
40	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-1) (МЭС Волги)	5 дне	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	5 дней	Пн 23.09.13	Пт 27.09.13	ЗРР	02:00	ТО УРЗиА на ПС 220 кВ Ульяновская			с откл		0 дн...	НД	НД
41	ВЛ 110 кВ Черемшанская – Мелекесс–Городская I цепь (ВЛ 110 кВ Черемшанская-1) (МЭС Волги)	1 ден	Сб 14.09.13	Сб 14.09.13	1 день	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	БВР	04:00	ТР: ВЧ заградителя, КС. ТО: ЛР-110, ОР-110. Верховой осмотр портала ВЛ на ПС 220 кВ Черемшанская			с откл		0 дн...	НД	НД
42	ВЛ 110 кВ Черемшанская – Мелекесс-Городская II цепь (ВЛ 110 кВ Черемшанская-2) (МЭС Волги)	1 ден	Сб 21.09.13	Сб 21.09.13	2 дней	Вт 17.09.13	Ср 18.09.13	БВР	04:00	ТР: ВЧ заградителя, КС. ТО: ЛР-110, ОР-110. Верховой осмотр портала ВЛ			с откл		0 дн...	НД	НД
43	**ПС 500 кВ Вешкайма**																
44	АТ-2 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	5 дней	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	ТР	ВЗ	ВПр. в связи с выводом в ремонт 2 СШ северной секции; ТО: ШР-500, ВЭ-500, ТТ-500			с откл		0 дн...	НД	НД
45	В-500 АТ-2 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	5 дней	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	ТР	04:00	ТО: ШР-500, ВЭ-500, ТТ-500			с откл		0 дн...	НД	НД
46	В-2 ВЛ 500 кВ Вешкайма-Осиновка (МЭС Волги)	5 дне	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	5 дней	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	ТР	04:00	ТО: В-2, ТТ-2. ТР: ШР-2			с откл		0 дн...	НД	НД
47	В-2 ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Вешкайма Северная (МЭС Волги)	5 дне	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	5 дней	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	ТР	04:00	ТО: В-2, ТТ-2. ТР: ШР-2			с откл		0 дн...	НД	НД
48	ВЭ Р-2-500 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	5 дней	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	ТР	06:00	ТР Р-2-500: ТО ОПН-500, ВЭ, ТТ			с откл		5 дн...	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13
49	В-1 ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Вешкайма Южная (МЭС Волги)	5 дне	Пн 30.09.13	Пт 04.10.13	5 дней	Пн 30.09.13	Пт 04.10.13	ТР	04:00	ТО: ЛР-1			с откл		5 дн...	Пн 30.09.13	Пт 04.10.13
50	В-2 ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Вешкайма Южная (МЭС Волги)	5 дне	Пн 30.09.13	Пт 04.10.13	5 дней	Пн 30.09.13	Пт 04.10.13	ТР	04:00	ТО ЛР-2			с откл		5 дн...	Пн 30.09.13	Пт 04.10.13
51	2 СШ-500 - СШ 500 кВ (МЭС Волги)	1 ден	Пт 06.09.13	Пт 06.09.13	1 день	Пт 06.09.13	Пт 06.09.13	ЗРР	ВЗ	ЗРР: ввод вработу 2 СШ северной секции			с откл		0 дн...	НД	НД
52	2 СШ-500 - СШ 500 кВ (МЭС Волги)	1 ден	Пн 02.09.13	Пн 02.09.13	1 день	Пн 02.09.13	Пн 02.09.13	ЗРР	ВЗ	Вывод в ремонт 2 СШ северной секции			с откл		0 дн...	НД	НД
53	Северная сек. 2 СШ-500 - СШ 500 кВ (МЭС Волги)	5 дне	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	5 дней	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	БВР	04:00	ТО: ШР-2, ШО-2, В-2, ТТ-2 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма Северная, Вешкайма Осиновка, РТН, ТН 2 СШ Северной Секции, Замена нулевых изоляторов на подвесной изоляции			с откл		0 дней	НД	НД
54	Р-2-500 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	5 дней	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	ТР	06:00	ТР Р-2-500: ТО ОПН-500, ВЭ, ТТ			с откл		0 дней	НД	НД
55	**ПС 500 кВ Ключики**																

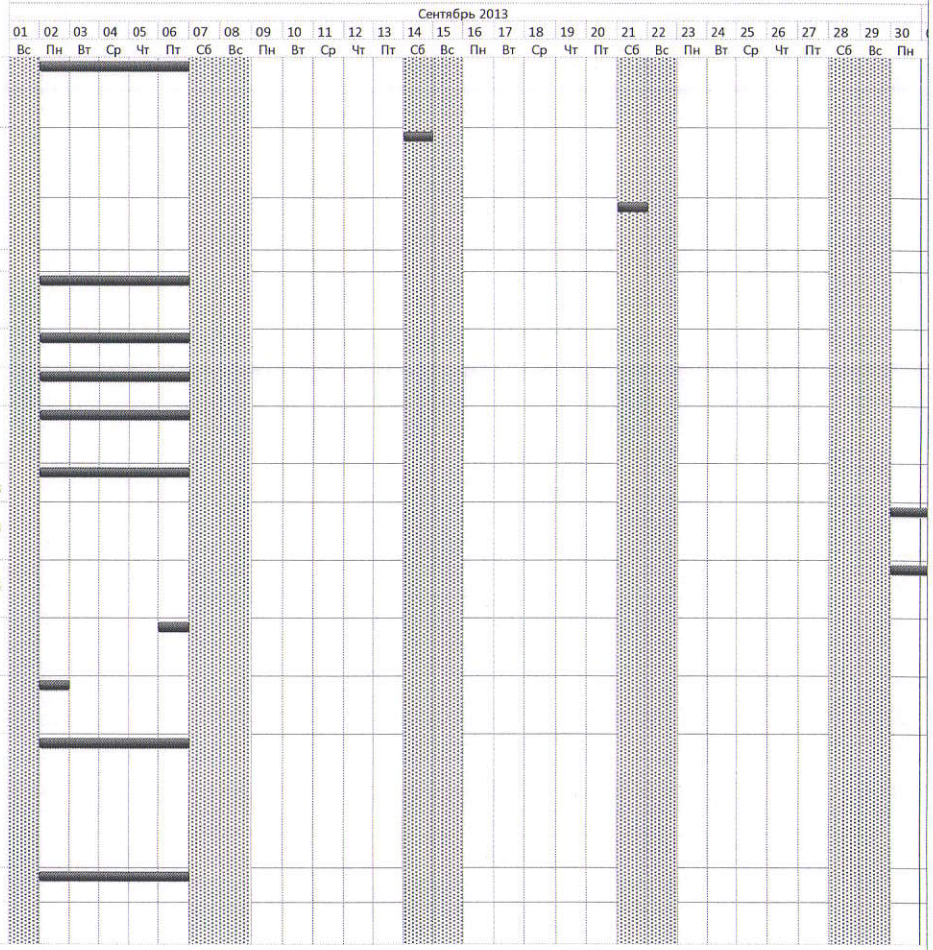

Заместитель главого диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на сентябрь 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"29" 08 2013г.

Ид.	Название задачи	Мес Вре рем Дли	Месячн Время ремонта Начало	Месячн Время ремонта Конец	Месяч Заявл время Длите	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид ремс	Авари готов	Содержание работ	Прич отка	Проч прим	Сос обо по заяв	Условия произво работ	Годо Врем ремс Коли дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец
56	2 СШ 220 (МЭС Волги)	3 дне	Пн 23.09.13	Ср 25.09.13	3 дней	Пн 23.09.13	Ср 25.09.13	ЗРР	05:00	Устройство перехода через кабельные лотки, демонтаж спусков, выведенного из эксплуатации обходного выключателя к 2 СШ – 220кВ, спусков от СШ резервных ячеек			с откл		0 дн...	НД	НД
57	1 СШ 220 (МЭС Волги)	4 дне	Ср 18.09.13	Сб 21.09.13	4 дней	Ср 18.09.13	Сб 21.09.13	ТР	05:00	ТО: ШР-220 1СШ ТН-1-220 №1, ТН-220 №1, ТН-3-220; профиспытания ОПН-220 ТН-1-220, ТН-3-220 демонтаж спусков, выведенного из эксплуатации обходного выключателя к 1 СШ – 220кВ, спусков от СШ резервных ячеек			с откл		4 дн...	Ср 18.09.13	Сб 21.09.13
58	АТ-3 (МЭС Волги)	2 дне	Пн 09.09.13	Вт 10.09.13	2 дней	Пн 09.09.13	Вт 10.09.13	ЗРР	03:00	ТО: 1 секции ЗРУ-10, В-10 АТ-3 . УРЗА			с откл		2 дн...	Чт 05.09.13	Сб 07.09.13
59	АТ-4 (МЭС Волги)	2 дне	Ср 11.09.13	Чт 12.09.13	2 дней	Ср 11.09.13	Чт 12.09.13	ЗРР	03:00	ТО: 2 секции ЗРУ-10, В-10 АТ-4,УРЗА			с откл		2 дн...	Ср 11.09.13	Чт 12.09.13
60	ТН-220 №1 1СШ (МЭС Волги)	4 дне	Ср 18.09.13	Сб 21.09.13	4 дней	Ср 18.09.13	Сб 21.09.13	ТР	02:00	ТО: ШР-220 1СШ ТН-1-220 №1, ТН-1-220 №1; профиспытания ОПН-220 ТН-1-220 №1			с откл		4 дн...	Ср 18.09.13	Сб 21.09.13
61	ТН-220 №3 1 СШ (МЭС Волги)	4 дне	Ср 18.09.13	Сб 21.09.13	4 дней	Ср 18.09.13	Сб 21.09.13	ТР	04:00	ТО: ТН-1-220 №1; профиспытания ОПН-220 ТН-3-220			с откл		4 дн...	Ср 18.09.13	Сб 21.09.13
62	**ПС 220 кВ Барыш**																
63	ОВ-110 (МЭС Волги)	2 дне	Ср 11.09.13	Чт 12.09.13	2 дней	Ср 11.09.13	Чт 12.09.13	ЗРР	01:00	ЗРР: в связи с ТО: ТТ-110, В-110, УРЗА			без откл		0 дней	НД	НД
64	ОВ-110 (МЭС Волги)	1 ден	Чт 19.09.13	Чт 19.09.13	1 день	Чт 19.09.13	Чт 19.09.13	ЗРР	ВЗ	ЗРР: в связи с ТО: ТТ-110, В-110 Борыш-1.			без откл		0 дней	НД	НД
65	АТ-1 (МЭС Волги)	3 дне	Пн 23.09.13	Ср 25.09.13	3 дней	Пн 23.09.13	Ср 25.09.13	ТР	01:00	ТО: АТ-1 (РПН-110), ОД-220, ТТ-220			с откл		0 дней	НД	НД
66	В 110 Б-Н (МЭС Волги)	1 ден	Вт 17.09.13	Вт 17.09.13	1 день	Вт 17.09.13	Вт 17.09.13	ТР	01:00	ТО: ТТ-110, В-110. Проф. Испытания ТТ-110			с откл	с переводом на ОВ	0 дней	НД	НД
67	В 110 Б-Р (МЭС Волги)	1 ден	Чт 19.09.13	Чт 19.09.13	1 день	Ср 18.09.13	Ср 18.09.13	ТР	01:00	ТО: ТТ-110, В-110			с откл	с переводом на ОВ	0 дней	НД	НД
68	В 110 Б-П (МЭС Волги)	3 дне	Пн 16.09.13	Ср 18.09.13	3 дней	Пн 09.09.13	Ср 11.09.13	ТР	04:00	ТО: ЛР-110, В-110, ТТ-110. Профиспытания. Верховой осмотр портала Вл. Замена поддерживающих ИОС			с откл		0 дней	НД	НД
69	В 110 Б-В (МЭС Волги)	1 ден	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	1 день	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	ТР	01:00	ТО: ТТ-110, В-110			с откл	с переводом на ОВ	0 дней	НД	НД

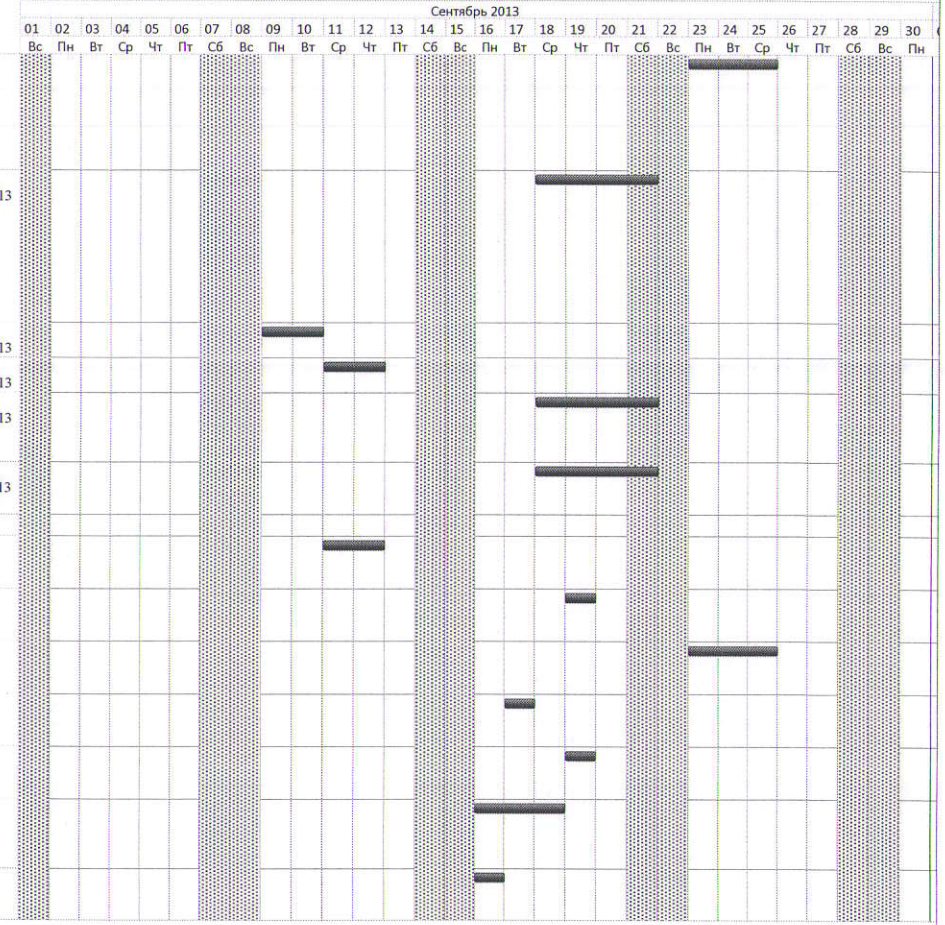

Заместитель главого диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на сентябрь 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"29" 08 2013г.

Ид.	Название задачи	Мес Вре рем Дли	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Месяч Заявл время Длите	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид ремс	Авари готовн	Содержание работ	Прич отка	Проч прим	Сос обо по заяв	Условия произво работ	Годо Врем ремс Коли дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец
70	В 110 Б-Т (МЭС Волги)	1 ден	Пт 13.09.13	Пт 13.09.13	1 день	Пт 13.09.13	Пт 13.09.13	ТР	01:00	ТО: ТТ-110, В-110			с откл	с переводом на ОВ	0 дней	НД	НД
71	**ПС 220 кВ Кременки**																
72	В-110 УК-1 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	5 дней	Пн 23.09.13	Пт 27.09.13	БВР	02:00	ТО УРЗиА			с отк.		0 дн...	НД	НД
73	В-2-220 Ульяновск (МЭС Волги)	1 ден	Ср 18.09.13	Ср 18.09.13	1 день	Ср 18.09.13	Ср 18.09.13	ТР	01:00	Проф. испытания ТТ В-2-220 Ульяновск, ТО ТТ В-2-220 Ульяновск.			с отк.		0 дн...	НД	НД
74	**ПС 220 кВ Ульяновская**																
75	В 110 Ишеевка (МЭС Волги)	1 ден	Вт 24.09.13	Вт 24.09.13	1 день	Чт 26.09.13	Чт 26.09.13	БВР	01:00	ТО: ЛР-110, В-110, ТТ-110, ЛР-110			с отк.		0 дн...	НД	НД
76	1 сек.ш.-220 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13	5 дней	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13	ЗРР	04:00	ТО: ШР-1-220 АТ-1, Ключики, Кременки			с отк.		5 дн...	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13
77	2 сек.ш.-220 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 16.09.13	Пт 20.09.13	5 дней	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	ЗРР	04:00	ТО: ШР-220 АТ-2, Ключики, Кременки			с отк.		5 дн...	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13
78	АТ-1 (МЭС Волги)	1 ден	Сб 21.09.13	Сб 21.09.13	1 день	Ср 18.09.13	Ср 18.09.13	ЗРР	01:00	ЗРР: в режиме 220/6 в связи с выводом 2 СШ 110			без отк.		1 день	Ср 18.09.13	Ср 18.09.13
79	АТ-2 (МЭС Волги)	1 ден	Чт 19.09.13	Чт 19.09.13	1 день	Чт 19.09.13	Чт 19.09.13	ЗРР	01:00	ЗРР: в режиме 220/6 в связи с выводом 2 СШ 110			без отк.		1 день	Чт 19.09.13	Чт 19.09.13
80	В 110 Кременки-1 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	5 дней	Пн 23.09.13	Пт 27.09.13	ЗРР	02:00	ТО УРЗиА на ПС 220 кВ Ульяновская			с отк.		0 дн...	НД	НД
81	2 СШ 110 (МЭС Волги)	15 дне	Пн 16.09.13	Пн 30.09.13	16 дней	Вс 15.09.13	Пн 30.09.13	ЗРР	01:00	ТО: ШР-2-110: БСК, ШСВ, АТ-1, АТ-2, Кременки-1, Кременки-2, Центральная-, Центральная-2, Северная-1, Северная-3, Ишеевка, Цильна, Языково, Майна;			с отк.		16 дн...	Вс 15.09.13	Пн 30.09.13
82	БСК - Батареи конденсаторов - Средства компенсации реактивной мощности (МЭС Волги)	10 дне	Сб 21.09.13	Пн 30.09.13	16 дней	Вс 15.09.13	Пн 30.09.13	ЗРР	01:00	ТО: В-110, КР-110, УРЗиА, ШР-2-110			с отк.		16 дн...	Вс 15.09.13	Пн 30.09.13
83	В 110 АТ-1 (МЭС Волги)	1 ден	Сб 28.09.13	Сб 28.09.13	1 день	Ср 18.09.13	Ср 18.09.13	ЗРР	01:00	ТО: ШР-2-110			с отк.		1 день	Ср 18.09.13	Ср 18.09.13
84	В 110 АТ-2 (МЭС Волги)	1 ден	Чт 19.09.13	Чт 19.09.13	1 день	Чт 19.09.13	Чт 19.09.13	ЗРР	01:00	ТО: ШР-2-110			с отк.		1 день	Чт 19.09.13	Чт 19.09.13
85	АТ-1 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13	5 дней	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13	ТР	12:00	ТР: АТ. ТО: ТР-6, ТР-110, ШР-220 АТ-1, токопровода 6кВ, УРЗиА.Проф.			с отк.		5 дн...	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13
86	АТ-2 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 16.09.13	Пт 20.09.13	5 дней	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	ТР	12:00	ТР: АТ. ТО: ТР-6, ТР-110, ШР-220 АТ-2, токопровода 6кВ, УРЗиА.Проф.			с отк.		5 дн...	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13
87	В 110 Центральная-1 (МЭС Волги)	1 ден	Пн 30.09.13	Пн 30.09.13	1 день	Вт 24.09.13	Вт 24.09.13	ТР	01:00	ТО: ШР-2-110, В-110, ТТ-110, ЛР-110			с отк.		1 день	Вт 24.09.13	Вт 24.09.13
88	В 110 Центральная-2 (МЭС Волги)	1 ден	Пн 23.09.13	Пн 23.09.13	1 день	Пн 23.09.13	Пн 23.09.13	ТР	01:00	ТО: ШР-2-110, В-110, ТТ-110, ЛР-110			с отк.		1 день	Пн 23.09.13	Пн 23.09.13
89	В 110 Кременки-1 (МЭС Волги)	1 ден	Ср 25.09.13	Ср 25.09.13	1 день	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	ТР	01:00	ТО: ЛР-110, В-110, ТТ-110, ШР-2-110			с отк.		1 день	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13
90	В 110 Кременки-2 (МЭС Волги)	1 ден	Чт 26.09.13	Чт 26.09.13	1 день	Вт 17.09.13	Вт 17.09.13	ТР	01:00	ТО: ЛР-110, В-110, ТТ-110, ШР-2-110			с отк.		1 день	Вт 17.09.13	Вт 17.09.13

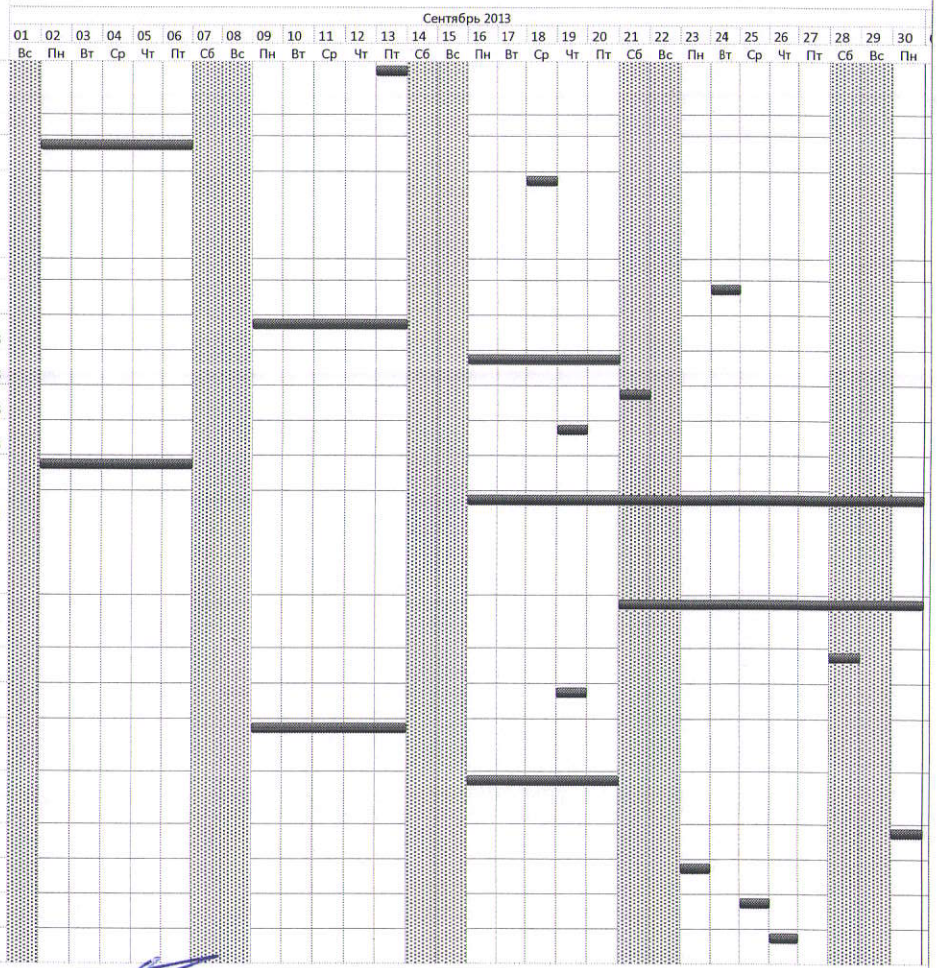

Заместитель главого диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на сентябрь 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"29" 08 2013г.

Ид.	Название задачи	Мес Вре рем Дли	Месячн Время ремонта Начало	Месячн Время ремонта Конец	Месяч Заявл время Длите	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид ремс	Авари готов	Содержание работ	Прич отка	Проч прим	Сос обо по заяв	Условия произво работ	Годо Врем ремс Коли дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец
91	В 110 Северная-1 (МЭС Волги)	1 ден	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	1 день	Сб 21.09.13	Сб 21.09.13	ТР	01:00	ТО: ШР-2-110, В-110, ТТ-110, ЛР-110			с отк.		1 день	Сб 21.09.13	Сб 21.09.13
92	В 110 Северная-3 (МЭС Волги)	1 ден	Пт 27.09.13	Пт 27.09.13	1 день	Пт 20.09.13	Пт 20.09.13	ТР	01:00	ТО: ШР-2-110, В-110, ТТ-110, ЛР-110			с отк.		1 день	Пт 20.09.13	Пт 20.09.13
93	В 110 Майна (МЭС Волги)	1 ден	Ср 18.09.13	Ср 18.09.13	1 день	Пт 27.09.13	Пт 27.09.13	ТР	01:00	ТО: ШР-2-110, В-110, ТТ-110, ЛР-110			с отк.		1 день	Пт 27.09.13	Пт 27.09.13
94	В 110 Языково (МЭС Волги)	1 ден	Пт 20.09.13	Пт 20.09.13	1 день	Ср 25.09.13	Ср 25.09.13	ТР	01:00	ТО: ШР-2-110, В-110, ТТ-110, ЛР-110			с отк.		1 день	Ср 25.09.13	Ср 25.09.13
95	ШСВ 110 (МЭС Волги)	15 дне	Пн 16.09.13	Пн 30.09.13	16 дней	Вс 15.09.13	Пн 30.09.13	ТР	01:00	ТО: ШР-2-110, В-110			с отк.		16 дн...	Вс 15.09.13	Пн 30.09.13
96	В 110 АТ-1 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13	5 дней	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13	ТР	04:00	ТО: В-110, ЛР-110, УРЗиА			с отк.		5 дн...	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13
97	В 110 АТ-2 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 16.09.13	Пт 20.09.13	5 дней	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	ТР	04:00	ТО: В-110, ЛР-110, УРЗиА			с отк.		5 дн...	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13
98	В 110 БСК (МЭС Волги)	10 дне	Сб 21.09.13	Пн 30.09.13	16 дней	Вс 15.09.13	Пн 30.09.13	ТР	01:00	ТО: В-110, КР-110, ШР-2-110.ТО: УРЗиА			с отк.		16 дн...	Вс 15.09.13	Пн 30.09.13
99	В-2-220 Ключики (МЭС Волги)	5 дне	Пн 16.09.13	Пт 20.09.13	5 дней	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	ТР	04:00	ТО: ШР-2-220, В-220, ТТ-220			с отк.		5 дн...	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13
100	В-1-220 Ключики (МЭС Волги)	5 дне	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13	5 дней	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13	ТР	04:00	ТО: ШР-1-220, В-220, ТТ-220			с отк.		5 дн...	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13
101	В-2-220 Кремёнки (МЭС Волги)	5 дне	Пн 16.09.13	Пт 20.09.13	5 дней	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13	ТР	ВЗ	ТО: ШР-2-220, В-220, ТТ-220			с отк.		5 дн...	Пн 02.09.13	Пт 06.09.13
102	В-1-220 Кремёнки (МЭС Волги)	5 дне	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13	5 дней	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13	ТР	04:00	ТО: ШР-1-220, В-220, ТТ-220			с отк.		5 дн...	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13
103	**ПС 220 кВ Черемшанская**																
104	ОСШ-110 кВ (МЭС Волги)	1 ден	Сб 14.09.13	Сб 14.09.13	2 дней	Пн 16.09.13	Вт 17.09.13	ЗРР	04:00	ТО: ОР-110 Ч-1, Ч-2			с отк.		2 дн...	Пн 16.09.13	Вт 17.09.13
105	ОСШ-110 кВ (МЭС Волги)	1 ден	Сб 21.09.13	Сб 21.09.13	2 дней	Пн 16.09.13	Вт 17.09.13	ЗРР	04:00	ТО: ОР-110 Ч-1, Ч-2			с отк.		2 дн...	Пн 16.09.13	Вт 17.09.13
106	ВВ-110 Ч-1 (МЭС Волги)	1 ден	Сб 14.09.13	Сб 14.09.13	1 день	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	ТР	04:00	ТО: ВВ-110, КС, ТТ-110 Профиспытания, ЛР-110			с отк.		1 день	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13
107	ВВ-110 Ч-2 (МЭС Волги)	1 ден	Сб 21.09.13	Сб 21.09.13	1 день	Вт 17.09.13	Вт 17.09.13	ТР	04:00	ТО: ВВ-110, КС, ТТ-110 Профиспытания, ЛР-110,ТО УРЗиА			с отк.		1 день	Вт 17.09.13	Вт 17.09.13
108	ВВ-110 ОШСВ (МЭС Волги)	3 дне	Пн 02.09.13	Ср 04.09.13	3 дней	Пн 02.09.13	Ср 04.09.13	ТР	12:00	ТР: ВВ-110. ТО: ТТ-110, УРЗиА			с отк.		3 дн...	Пн 02.09.13	Ср 04.09.13
109	ТН-1-110кВ (МЭС Волги)	1 ден	Ср 18.09.13	Ср 18.09.13	1 день	Ср 18.09.13	Ср 18.09.13	ТР	02:00	ТР: РВС-1-110. ТО: ТН-1-110. Проф. Испытания			с отк.		1 день	Ср 18.09.13	Ср 18.09.13
110	ОВ 110кВ (МЭС Волги)	3 дне	Ср 04.09.13	Пт 06.09.13	3 дней	Ср 04.09.13	Пт 06.09.13	ТР	12:00	ТР: ВВ-110. ТО УРЗиА ТТ Профиспытания			с отк.		3 дн...	Ср 04.09.13	Пт 06.09.13
111	ВВ-110 Ч-2 (МЭС Волги)	3 дне	Ср 18.09.13	Пт 20.09.13	3 дней	Ср 18.09.13	Пт 20.09.13	ТР	ВЗ	ТО: ВВ-110, КС, ТТ-110 Профиспытания, ЛР-110,ТО УРЗиА (с переводом на ОВ)			с отк.	с перевод на ОВ	0 дн...	НД	НД
112	**ПС 110 кВ Восточная**																
113	В-110 В-3 (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	1 день	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	ТР	01:00	ТО			с отк.		1 день	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13
114	В-110 В-4 (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пн 23.09.13	Пн 23.09.13	1 день	Пн 23.09.13	Пн 23.09.13	ТР	01:00	ТО			с отк.		1 день	Пн 23.09.13	Пн 23.09.13

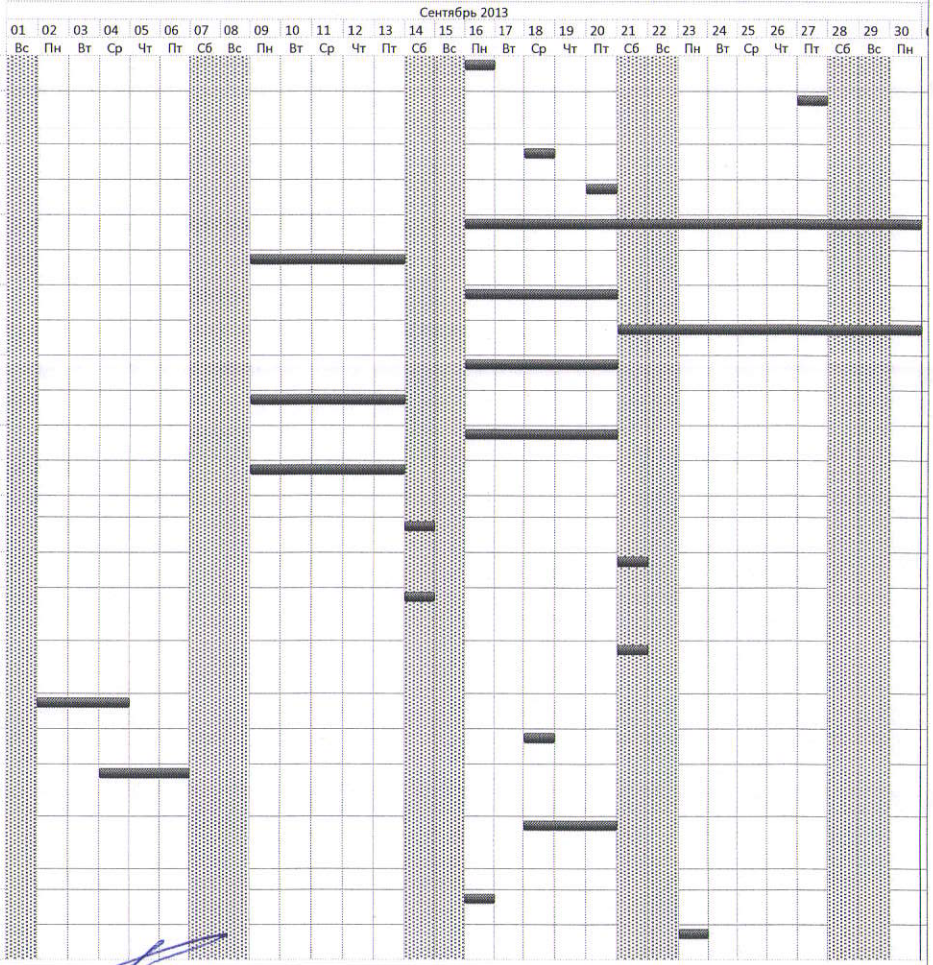

Заместитель главого диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на сентябрь 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"29" 08 2013г.

Ид.	Название задачи	Мес Вре рем Дли	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Месяч Заявл время Длите	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид ремс	Авари готовн	Содержание работ	Прич отка	Проч прим	Сос обо по зая	Условия произво работ	Годо Врем ремс Коли дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец
115	**ПС 110 кВ Северная**																
116	В-110 С-5 (Ульяновский ЦУС) ОТКАЗ	1 ден	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	1 день	Пн 16.09.13	Пн 16.09.13	ТР	01:00	ТО			с отк.		0 дн...	НД	НД
117	**ПС 110 кВ Центральная**																
118	ОСШ-110 (Ульяновский ЦУС)	16 дне	Вс 15.09.13	Пн 30.09.13	16 дней	Вс 15.09.13	Пн 30.09.13	РЕК	03:00	Реконструкция ОР-110 Ц-3, ОР-110 Ц-4			с отк.		0 дн...	НД	НД
119	В-110 Ц-4 (Ульяновский ЦУС)	8 дне	Вс 01.09.13	Вс 08.09.13	8 дней	Вс 01.09.13	Вс 08.09.13	РЕК	ВЗ	Реконструкция			с отк.	с перевод на ОВ	0 дн...	НД	НД
120	**Ульяновская ТЭЦ-2**																
121	В-110 В-4 (Ульяновская ТЭЦ-2)	19 дне	Пн 02.09.13	Пт 20.09.13	19 дней	Пн 02.09.13	Пт 20.09.13	СР	ВЗ	Средний ремонт			с отк.	с перевод на ОВ	19 дн...	Пн 02.09.13	Пт 20.09.13
122	ШСВ-110-12 (Ульяновская ТЭЦ-2)	4 дне	Вт 03.09.13	Пт 06.09.13	4 дней	Вт 03.09.13	Пт 06.09.13	ТР	08:00	ТР			с отк.		4 дн...	Вт 03.09.13	Пт 06.09.13
123	ШСВ-110-34 (Ульяновская ТЭЦ-2)	4 дне	Пн 09.09.13	Чт 12.09.13	4 дней	Пн 09.09.13	Чт 12.09.13	ТР	08:00	ТР			с отк.		4 дн...	Пн 09.09.13	Чт 12.09.13
124	В-110 В-2 (Ульяновская ТЭЦ-2)	4 дне	Пн 23.09.13	Чт 26.09.13	4 дней	Пн 23.09.13	Чт 26.09.13	ТР	08:00	ТР			с отк.	с перевод на ОВ	4 дн...	Пн 23.09.13	Чт 26.09.13
125	**ПС 220 кВ 1М**																
126	ВВ-Т1 (НИИАР)	30 дне	Пн 12.08.13	Вт 10.09.13	30 дней	Пн 12.08.13	Вт 10.09.13	КР	ВЗ	КР :ВВ-Т-1			с отк.		0 дн...	НД	НД
127	**Ульяновское РДУ**																
128	Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Барыш – Умыс (Ульяновский ЦУС)	5 дне	Чт 26.09.13	Пн 30.09.13	5 дней	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13	КР	01:00	КР Разрыв транзита по двум цепям			с отк.		0 дн...	НД	НД
129	Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Барыш – Умыс (Ульяновский ЦУС)	3 дне	Пн 16.09.13	Ср 18.09.13	5 дней	Пн 09.09.13	Пт 13.09.13	КР	01:00	КР Разрыв транзита по двум цепям			с отк.		0 дн...	НД	НД

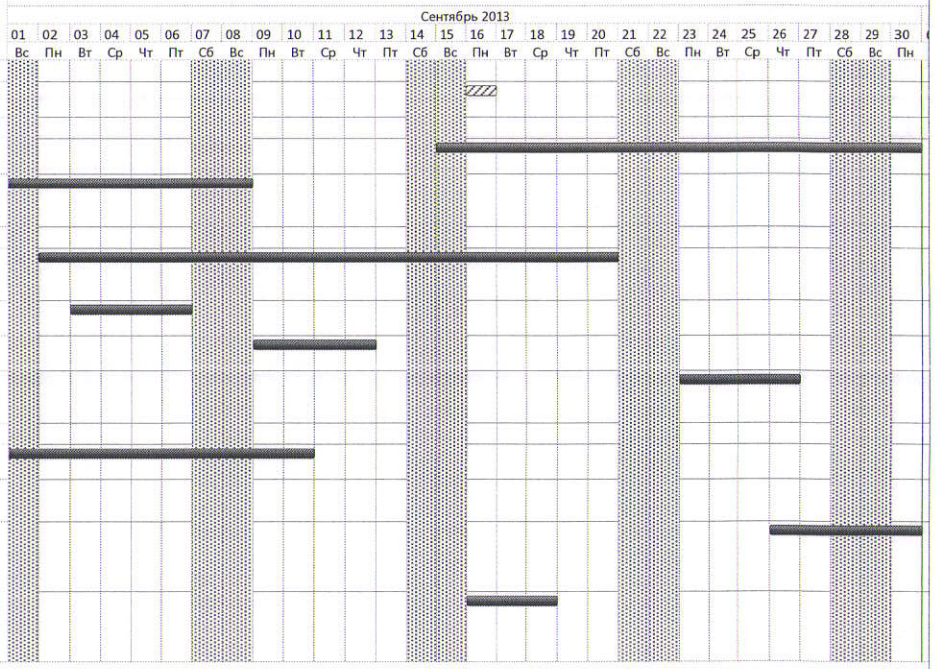

Заместитель главого диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов
