Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на октябрь 2013 года

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"30" 09 2013г.

Ид.	Название задачи	Мес Вре рем Дли	Месячн Время ремонта Начало	Месячн Время ремонта Конец	Мес Заяв. врем Длит	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид рем	Авари готов	Содержание работ	Прич отка	Проч прим	Сос обо по заяв	Услови произв работ	Годо Врем ремо Коли дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой Время ремонта Конец
1	**ВЛ 500 кВ**																
2	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Вешкайма Южная (МЭС Волги)	5 дне	Пн 21.10.13	Пт 25.10.13	5 дн...	Пн 30.09.13	Пт 04.10.13	ТР	04:00	Установка гас. Виб. На п.д. расширение просеки. Вырубка деревьев. Рем провода, ремонт троса, расширение просеки, замена изоляции, верховой осмотр ВЛ, регулировка искровых промежутков; ПС Вешкайма: ТО ЛР-1, ЛР-2,ВЧЗ, КС, ТТЛ, ТНЛ-1, ТНЛ-2, профиспытания			с откл		5 дн...	Пн 30.09.13	Пт 04.10....
3	**ВЛ 200 кВ**																
4	ВЛ 220 кВ Ключики - Барыш (МЭС Волги)	5 дне	Пн 07.10.13	Пт 11.10.13	5 дн...	Пн 07.10.13	Пт 11.10.13	БВР	02:00	Верховой осмотр (АГ 1ч), расширение просеки (АГ 2ч), замена изоляции, вырубка деревьев, ремонт провода, ремонт троса (АГ 2 ч)			с откл		5 дн...	Пн 07.10.13	Пт 11.10....
5	ВЛ 220 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Черемшанская (МЭС Волги)	2 дне	Сб 12.10.13	Вс 13.10.13	2 дн...	Сб 12.10.13	Вс 13.10.13	БВР	03:00	Замена изоляции, замена гасителей вибрации			с откл		0 дн...	НД	НД
6	ВЛ 220 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Черемшанская (МЭС Волги)	2 дне	Сб 19.10.13	Вс 20.10.13	2 дн...	Сб 19.10.13	Вс 20.10.13	БВР	03:00	Замена изоляции, замена гасителей вибрации			с откл		0 дн...	НД	НД
7	**ВЛ 110 кВ**																
8	ВЛ 110 кВ Черемшанская – Мелекесс-Городская II цепь (ВЛ 110 кВ Черемшанская-2) (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Сб 26.10.13	Вс 27.10.13	2 дн...	Чт 17.10.13	Пт 18.10.13	БВР	02:00	ТО,переустройство ВЧЗ на ПС 110 кВ Мелекесс-Городская			с откл		2 дн...	Чт 17.10.13	Пт 18.10....
9	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Димитровградская – 1) (Ульяновский ЦУС)	5 дне	Пн 21.10.13	Пт 25.10.13	5 дн...	Пн 21.10.13	Пт 25.10.13	КР	01:00	КР			с откл		5 дн...	Пн 21.10.13	Пт 25.10....
10	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Димитровградская – 2) (Ульяновский ЦУС)	5 дне	Пн 28.10.13	Пт 01.11.13	5 дн...	Пн 28.10.13	Пт 01.11.13	КР	01:00	КР			с откл		5 дн...	Пн 28.10.13	Пт 01.11....
11	ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-1) (Ульяновский	1 ден	Пт 04.10.13	Пт 04.10.13	1 день	Пт 04.10.13	Пт 04.10.13	БВР	01:00	ТО ЛР-110 Ц-1 на ПС-110 кВ Центральная			с откл		1 день	Пт 04.10.13	Пт 04.10....
12	ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-2) (Ульяновский	1 ден	Пт 11.10.13	Пт 11.10.13	1 день	Пт 11.10.13	Пт 11.10.13	БВР	01:00	ТО ЛР-110 Ц-2 на ПС-110 кВ Центральная			с откл		1 день	Пт 11.10.13	Пт 11.10....
13	ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-2) (Ульяновский	5 дне	Пн 07.10.13	Пт 11.10.13	5 дн...	Пн 07.10.13	Пт 11.10.13	БВР	01:00	ТО			с откл		5 дн...	Пн 07.10.13	Пт 11.10....

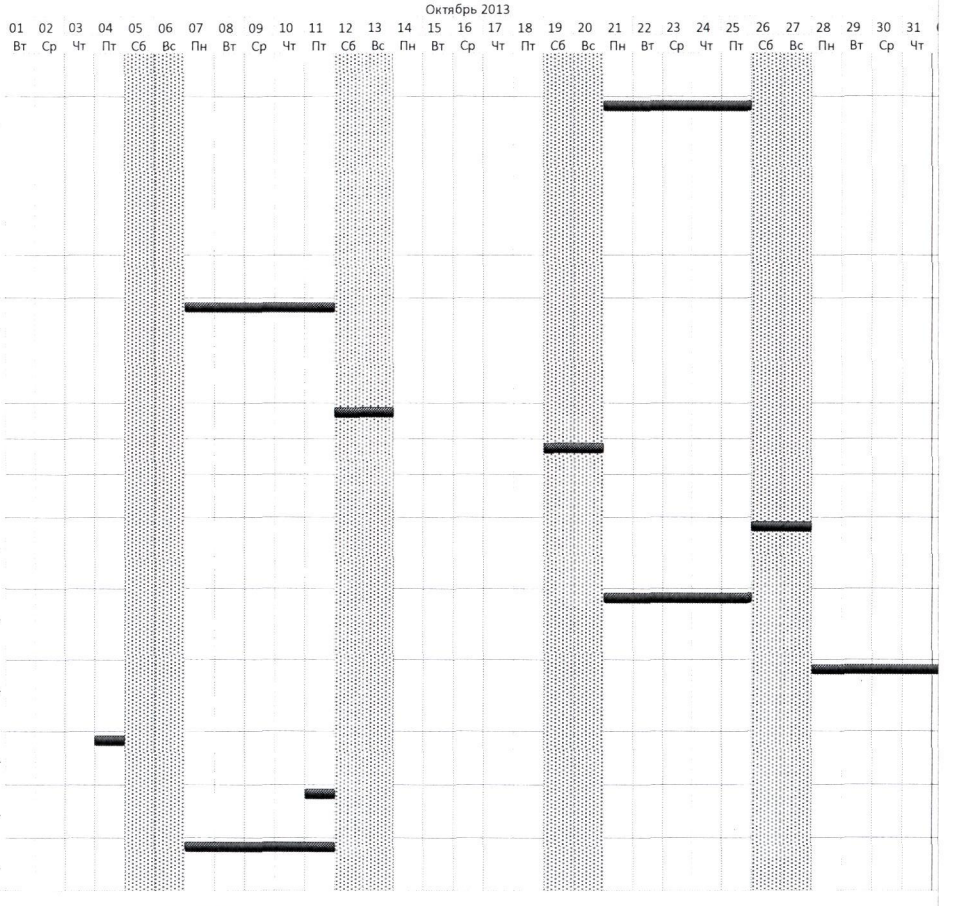

Заместитель главного диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Заместитель начальника СЭР_____Г.М. Юдин

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на октябрь 2013 года

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"30" 09 2013г.

Ид.	Название задачи	Мес Вре рем Дли	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Мес Заяв врем Длит	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид ремс	Авари готов	Содержание работ	Прич отка	Проч прим	Сос обо по заяв	Услови произв работ	Годо Врем ремс Коли дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой Время ремонта Конец
14	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Северная II цепь (ВЛ 110 кВ Северная – 5) (Ульяновский ЦУС)	3 дне	Пн 21.10.13	Ср 23.10.13	3 дн...	Пн 21.10.13	Ср 23.10.13	БВР	01:00	ТО ЛР-110 С-5 на ПС 110 кВ Северная			с откл		0 дн...	НД	НД
15	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Северная II цепь (ВЛ 110 кВ Северная – 5) (Ульяновский ЦУС)	3 дне	Пн 21.10.13	Ср 23.10.13	3 дн...	Пн 21.10.13	Ср 23.10.13	ТР	01:00	ТО			с откл		0 дн...	НД	НД
16	ВЛ 110 кВ Новообразцовая - Клин с отпайками (ВЛ 110 кВ Клин – Новообразцовая) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Ср 02.10.13	Ср 02.10.13	1 день	Ср 02.10.13	Ср 02.10.13	КР	08:00	КР. Замена опоры на ПС 110 кВ Репьевка			с откл		0 дн...	НД	НД
17	ВЛ 110 кВ Ключики - Клин с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ключики - Клин – 1) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пн 14.10.13	Пн 14.10.13	1 день	Чт 10.10.13	Чт 10.10.13	КР	08:00	КР (участок Клин-Канадей м Ключики-Канадей). Замена опоры на ПС 110 кВ Канадей (Замена опоры на ПС 110 кВ Канадей)			с откл		0 дн...	НД	НД
18	ВЛ 110 кВ Сызрань-Коптевка с отпайками (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Чт 03.10.13	Чт 03.10.13	1 день	Чт 03.10.13	Чт 03.10.13	КР	02:00	КР.Сборка шлейфов на отпайке к ПС 110 кВ Репьевка			с откл		0 дн...	НД	НД
19	ВЛ 110 кВ Сызрань-Коптевка с отпайками (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Вт 01.10.13	Вт 01.10.13	1 день	Вт 01.10.13	Вт 01.10.13	КР	02:00	КР.Разборка шлейфов на отпайке к ПС 110 кВ Репьевка			с откл		0 дн...	НД	НД
20	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-2) (МЭС Волги)	5 дне	Пн 14.10.13	Пт 18.10.13	5 дн...	Пн 14.10.13	Пт 18.10.13	БВР	02:00	ТО: УРЗиА на ПС 220 кВ Ульяновская			с откл		0 дн...	НД	НД
21	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-2) (МЭС Волги)	5 дне	Пн 14.10.13	Пт 18.10.13	5 дн...	Пн 14.10.13	Пт 18.10.13	БВР	02:00	ТО: УРЗиА на ПС 220 кВ Кременки			с откл		0 дн...	НД	НД
22	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна) (МЭС Волги)	5 дне	Пн 21.10.13	Пт 25.10.13	5 дн...	Пн 07.10.13	Пт 11.10.13	БВР	02:00	ТО: УРЗиА на ПС 220 кВ Ульяновская			с откл		0 дн...	НД	НД
23	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Языково с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Языково) (МЭС Волги)	4 дне	Вт 15.10.13	Пт 18.10.13	4 дн...	Вт 01.10.13	Пт 04.10.13	БВР	02:00	ТО: УРЗиА на ПС 220 кВ Ульяновская			с откл		0 дн...	НД	НД
24	ВЛ 110 кВ Ключики - Клин с отпайкой на ПС Куроедово II цепь (ВЛ 110 кВ Ключики - Клин – 2)	1 ден	Вт 15.10.13	Вт 15.10.13	1 день	Вт 15.10.13	Вт 15.10.13	БВР	02:00	ПС 500 кВ Ключики :ТР: ВЧ заградителя, КС ВЛ-110 Клин-Ключики-2 ТО: ЛР-110кВ, Профиспытания			с откл		0 дн...	НД	НД
25	**ПС 500 кВ Вешкайма**																
26	В-1 ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Вешкайма Южная (МЭС Волги)	5 дне	Пн 21.10.13	Пт 25.10.13	5 дн...	Пн 30.09.13	Пт 04.10.13	ТР	04:00	ТО: ЛР-1			с откл		5 дн...	Пн 30.09.13	Пт 04.10....
27	В-2 ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Вешкайма Южная (МЭС Волги)	5 дне	Пн 21.10.13	Пт 25.10.13	5 дн...	Пн 30.09.13	Пт 04.10.13	ТР	04:00	ТО ЛР-2			с откл		5 дн...	Пн 30.09.13	Пт 04.10....
28	**ПС 500 кВ Ключики**																
29	1 СШ 110 кВ (МЭС Волги)	5 дне	Пн 07.10.13	Пт 11.10.13	5 дн...	Пн 07.10.13	Пт 11.10.13	БВР	04:00	ТР: ШР-110кВ 1СШ; "Никулино; "Ключики-2"; ТО: ""Ключики-Павловка"			с откл		0 дн...	НД	НД
30	**ПС 220 кВ Барыш**																

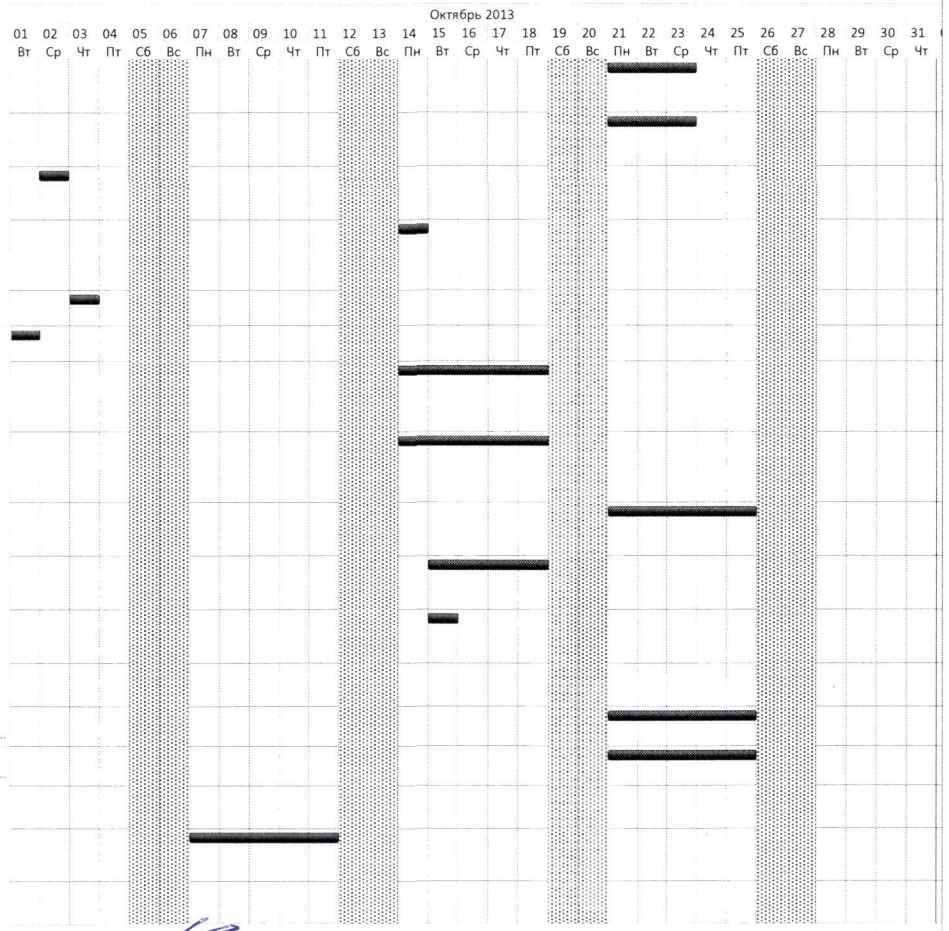

Заместитель главного диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Заместитель начальника СЭР_____Г.М. Юдин

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на октябрь 2013 года

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"30" 09 2013г.

Ид.	Название задачи	Мес Вре рем Дли	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Мес Заяв. врем Длит	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид ремс	Авари готов	Содержание работ	Прич отка	Прос прим	Сос обо по заяв	Услови произв работ	Годо Врем ремс Коли дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой Время ремонта Конец
31	АТ-1 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 07.10.13	Пт 11.10.13	5 дн...	Пн 07.10.13	Пт 11.10.13	ЗРР	02:00	ЗРР: в режиме 110/10 в связи с: Верховой осмотр (АГ 1ч), расширение просеки (АГ 2ч), замена изоляции, вырубка деревьев, ремонт провода, ремонт троса(А/Г=2 ч)			без откл	5 дн...	Пн 07.10.13	Сб 12.10....
32	АТ-1 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 07.10.13	Пт 11.10.13	5 дн...	Пн 07.10.13	Пт 11.10.13	ТР	01:00	ТО: РПН-110 АТ-1, ОД-220 АТ-1			с откл	1 день	Пн 07.10.13	Вт 08.10....
33	**ПС 220 кВ Кременки**																
34	В-110 УК-2 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 14.10.13	Пт 18.10.13	5 дн...	Пн 14.10.13	Пт 18.10.13	БВР	02:00	ТО: УРЗиА			с откл	0 дн...	НД	НД
35	**ПС 220 кВ Ульяновская**																
36	В 110 Кременки-2 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 14.10.13	Пт 18.10.13	5 дн...	Пн 14.10.13	Пт 18.10.13	БВР	02:00	ТО: УРЗиА			с откл	0 дн...	НД	НД
37	В 110 Майна (МЭС Волги)	5 дне	Пн 21.10.13	Пт 25.10.13	5 дн...	Пн 07.10.13	Пт 11.10.13	БВР	02:00	ТО: УРЗиА			с откл	0 дн...	НД	НД
38	В 110 Языково (МЭС Волги)	4 дне	Вт 15.10.13	Пт 18.10.13	4 дн...	Вт 01.10.13	Пт 04.10.13	БВР	02:00	ТО:УРЗиА			с откл	0 дн...	НД	НД
39	**ПС 220 кВ Черемшанская**																
40	ВВ-110 АТ-1 (МЭС Волги)	2 дне	Чт 10.10.13	Пт 11.10.13	2 дн...	Чт 10.10.13	Пт 11.10.13	БВР	02:00	БВР по ТО 2 СШ 110 кВ			с откл	с переводо на ОВ	0 дн...	НД	НД
41	ВВ-220 ОШСВ (МЭС Волги) ОТКАЗ	4 дне	Сб 19.10.13	Вт 22.10.13	4 дн...	Сб 19.10.13	Вт 22.10.13	БВР	01:00	ТО ШСР-220, ШР-1 220 ОШСВ			с откл	0 дн...	НД	НД
42	ОВ 110кВ (МЭС Волги)	2 дне	Чт 10.10.13	Пт 11.10.13	2 дн...	Чт 10.10.13	Пт 11.10.13	ЗРР	02:00	БВР по ТО 2 СШ 110 кВ			без откл	0 дн...	НД	НД
43	АТ-1 (МЭС Волги) ОТКАЗ	4 дне	Сб 19.10.13	Вт 22.10.13	4 дн...	Сб 19.10.13	Вт 22.10.13	ЗРР	01:00	ЗРР: в связи с выводом 1 СШ 220 (АТ-1 в режим 110/10)			без откл	0 дн...	НД	НД
44	1СШ-110 кВ (МЭС Волги)	2 дне	Вт 08.10.13	Ср 09.10.13	2 дн...	Вт 08.10.13	Ср 09.10.13	ТР	02:00	ТО 1 СШ 110 кВ (с переводом присоединений на 2 СШ)			с откл	0 дн...	НД	НД
45	2СШ-110кВ (МЭС Волги)	2 дне	Чт 10.10.13	Пт 11.10.13	2 дн...	Чт 10.10.13	Пт 11.10.13	ТР	02:00	ТО 2 СШ 110 кВ (с переводом присоединений на 1 СШ)			с откл	0 дн...	НД	НД
46	1СШ-220кВ (МЭС Волги) ОТКАЗ	4 дне	Сб 19.10.13	Вт 22.10.13	4 дн...	Сб 19.10.13	Вт 22.10.13	ТР	01:00	ТО: 1 СШ 220, ТО ШСР-220, ШР-1 220 ОШСВ			с откл	0 дн...	НД	НД
47	**ПС 110 кВ Восточная**																
48	1 СШ-110 кВ (Ульяновский ЦУС)	14 дне	Вт 01.10.13	Пн 14.10.13	14 дн...	Вт 01.10.13	Пн 14.10.13	ТР	02:00	ТО:1 СШ-110 кВ			с откл	14 дн...	Вт 01.10.13	Пн 14.10....
49	2 СШ-110 кВ (Ульяновский ЦУС)	4 дне	Вт 15.10.13	Пт 18.10.13	4 дн...	Вт 15.10.13	Пт 18.10.13	ТР	02:00	ТО:2 СШ-110 кВ			с откл	4 дн...	Вт 15.10.13	Пт 18.10....
50	ОСШ-110 кВ (Ульяновский ЦУС)	14 дне	Вт 01.10.13	Пн 14.10.13	14 дн...	Вт 01.10.13	Пн 14.10.13	ТР	02:00	ТО			с откл	14 дн...	Вт 01.10.13	Пн 14.10....
51	ОВ-110 (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Чт 10.10.13	Чт 10.10.13	1 день	Чт 10.10.13	Чт 10.10.13	ТР	01:00	ТО			с откл	1 день	Чт 10.10.13	Чт 10.10....

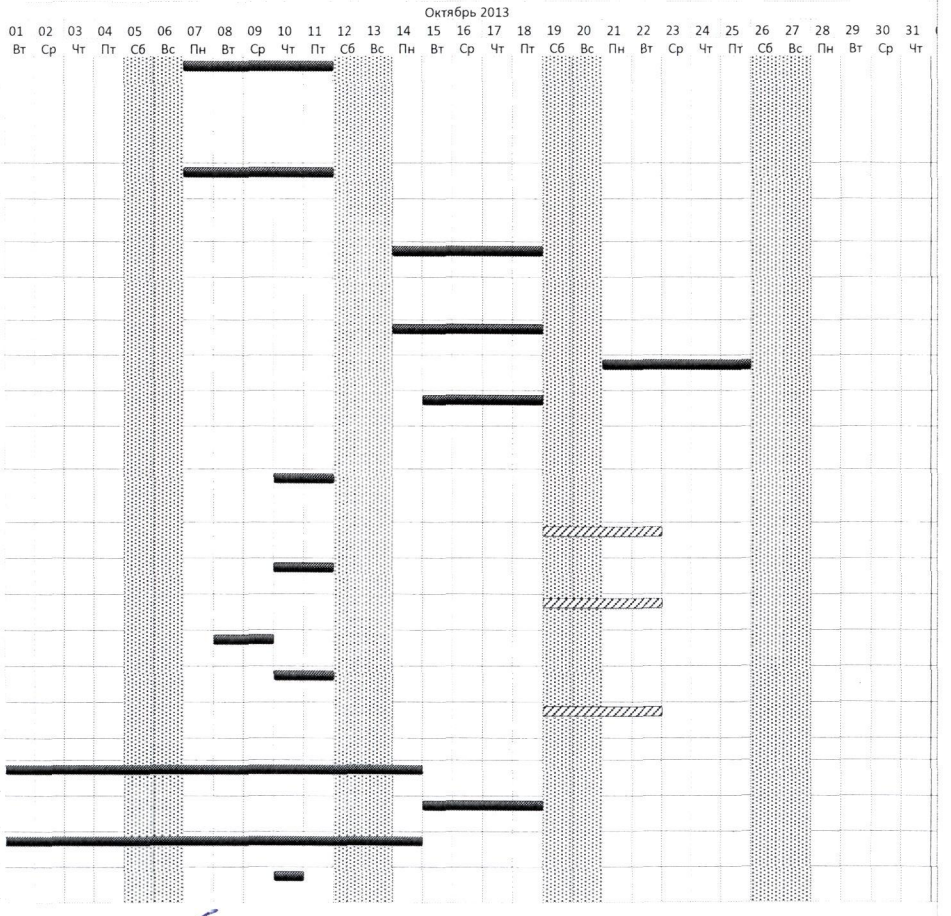

Заместитель главного диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Заместитель начальника СЭР_____Г.М. Юдин

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на октябрь 2013 года

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"30" 09 2013г.

Ид.	Название задачи	Мес Врем Длит	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Мес Заяв. врем Длит	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид рем	Авари готов	Содержание работ	Прич отка	Прос прил	Сос обо	Услови произв работ	Годо Врем рем Коли дней	Годовой Время ремонта Начало	Годовой Время ремонта Конец
52	ШСВ-110 (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пн 14.10.13	Пн 14.10.13	1 день	Пн 14.10.13	Пн 14.10.13	ТР	01:00	ТО			с откл		1 день	Пн 14.10.13	Пн 14.10....
53	**ПС 110 кВ Мелекесс-Городская**																
54	1СШ-110 (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Сб 26.10.13	Вс 27.10.13	2 дн...	Чт 17.10.13	Пт 18.10.13	БВР	01:00	БВР по переустройству ВЧЗ ВЛ -110 Ч-2 на ПС 110 кВ Мелекесс-Городская. (ВЛ-110 кВ МГ-2 в транзите с ВЛ -110 кВ Ч-1 через 2СШ-110 кВ ПС 110 кВ			с откл		0 дн...	НД	НД
55	**ПС 110 кВ Северная**																
56	В-110 С-5 (Ульяновский ЦУС)	3 дне	Пн 21.10.13	Ср 23.10.13	3 дн...	Пн 21.10.13	Ср 23.10.13	ТР	01:00	ТО:В-110 С-5, ЛР-110 С-5			с откл		0 дн...	НД	НД
57	**ПС 110 кВ Центральная**																
58	В-110 Ц-1 (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пт 04.10.13	Пт 04.10.13	1 день	Пт 04.10.13	Пт 04.10.13	ТР	01:00	ТО:В-110 Ц-1			с откл		1 день	Пт 04.10.13	Пт 04.10....
59	В-110 Ц-2 (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пт 11.10.13	Пт 11.10.13	1 день	Пт 11.10.13	Пт 11.10.13	ТР	01:00	ТО:В-110 Ц-2			с откл		1 день	Пт 11.10.13	Пт 11.10....
60	**Ульяновская ТЭЦ-1**																
61	ВЭ Ц-4 (Ульяновская ТЭЦ-1)	11 дне	Сб 05.10.13	Вт 15.10.13	11 дн...	Сб 05.10.13	Вт 15.10.13	ТР	08:00	ТО			с откл	с перевод на ОВ	11 дн...	Сб 05.10.13	Вт 15.10....

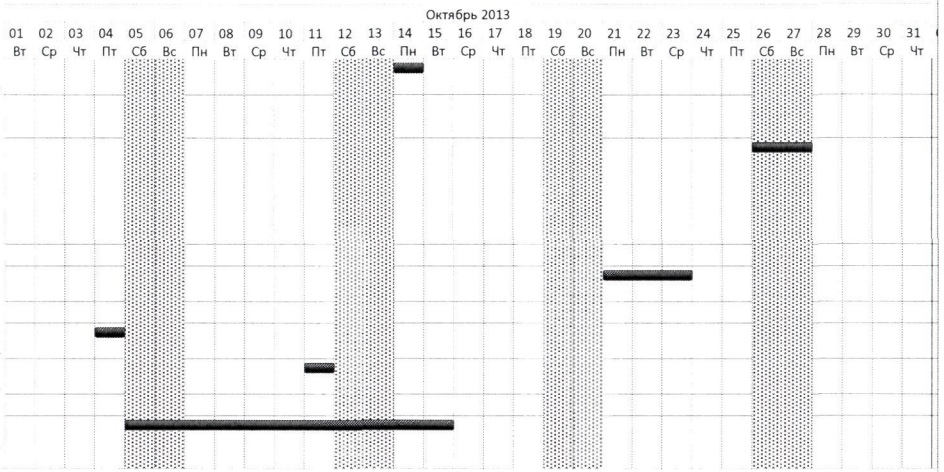

Заместитель главного диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Заместитель начальника СЭР_____Г.М. Юдин
