Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на ноябрь 2013 года

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"__29__" ____10____2013г.

Ид.	Название задачи	Сос заяв	Ме(Вре рем Дли	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Меся Заяв врем Длит	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид рем	Аварий готов	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примеч	Состо: обору по заявк	Услов произ работ	Годо Врем рем Коли дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой Время ремонта Конец
1	**ВЛ 500 кВ**																	
2	ВЛ 500 кВ Вешкайма-Ключики (МЭС Волги) ОТКАЗ	Отк	3 дне	Вт 05.11.13	Чт 07.11.13	3 дн...	Вт 05.11.13	Чт 07.11.13	БВР	02:00	Вырубка угрожающих деревьев, замена изоляции, расширение просеки, ремонт провода, ремонт троса, установка выпавших распорок, замена гасителей вибрации,регулировка искровых промежутков	Отказ. На Балаковско АЭС 4 блока.		с отключ		0 дн...	НД	НД
3	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Вешкайма Северная (МЭС Волги) ОТКАЗ	Отк	4 дне	Вт 05.11.13	Пт 08.11.13	4 дн...	Вт 05.11.13	Пт 08.11.13	БВР	02:00	Вырубка угрожающих деревьев, замена изоляции, расширение просеки, ремонт провода, ремонт троса, установка выпавших распорок, замена гасителей вибрации,регулировка *искровых промежутков*	Отказ. В ремонте 2с 1СШ 500 кВ на Жигулевско ГЭС		с отключ		0 дн...	НД	НД
4	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Вешкайма Южная (МЭС Волги)	Исх	5 дне	Пн 25.11.13	Пт 29.11.13	5 дн...	Пн 25.11.13	Пт 29.11.13	БВР	02:00	Вырубка угрожающих деревьев, замена изоляции, расширение просеки, ремонт провода, ремонт троса, установка выпавших распорок, замена гасителей вибрации,регулировка искровых промежутков			с отключ		0 дн...	НД	НД
5	**ВЛ 200 кВ**																	
6	ВЛ 220 кВ Сызрань - Кремёнки (МЭС Волги) ОТКАЗ	Отк	5 дне	Пн 11.11.13	Пт 15.11.13	5 дн...	Пн 11.11.13	Пт 15.11.13	БВР	02:00	Вырубка угрожающих деревьев, замена изоляции, расширение просеки, ремонт провода, ремонт троса, установка выпавших распорок, замена гасителей вибрации,регулировка искровых промежутков			с отключ		0 дней	НД	НД
7	ВЛ 220 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - *Черемшанская* (МЭС Волги)	Исх	4 дне	Вт 05.11.13	Пт 08.11.13	4 дн...	Вт 05.11.13	Пт 08.11.13	БВР	02:00	Вырубка угрожающих деревьев, замена изоляции, расширение просеки, ремонт провода, ремонт троса, установка выпавших распорок, замена гасителей вибрации,регулировка искровых промежутков			с отключ		0 дней	НД	НД
8	**ВЛ 110 кВ**																	
9	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Центральная с отпайкой на АЗЧ I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-3) (Ульяновский ЦУС)	Изм	5 дне	Пн 18.11.13	Пт 22.11.13	5 дн...	Пн 04.11.13	Пт 08.11.13	БВР	01:00	Вырубка		При условии ввода в работу Т-2 на ПС-110 кВ АЗЧ	с отключ	с вкл. на ночь	0 дн...	НД	НД

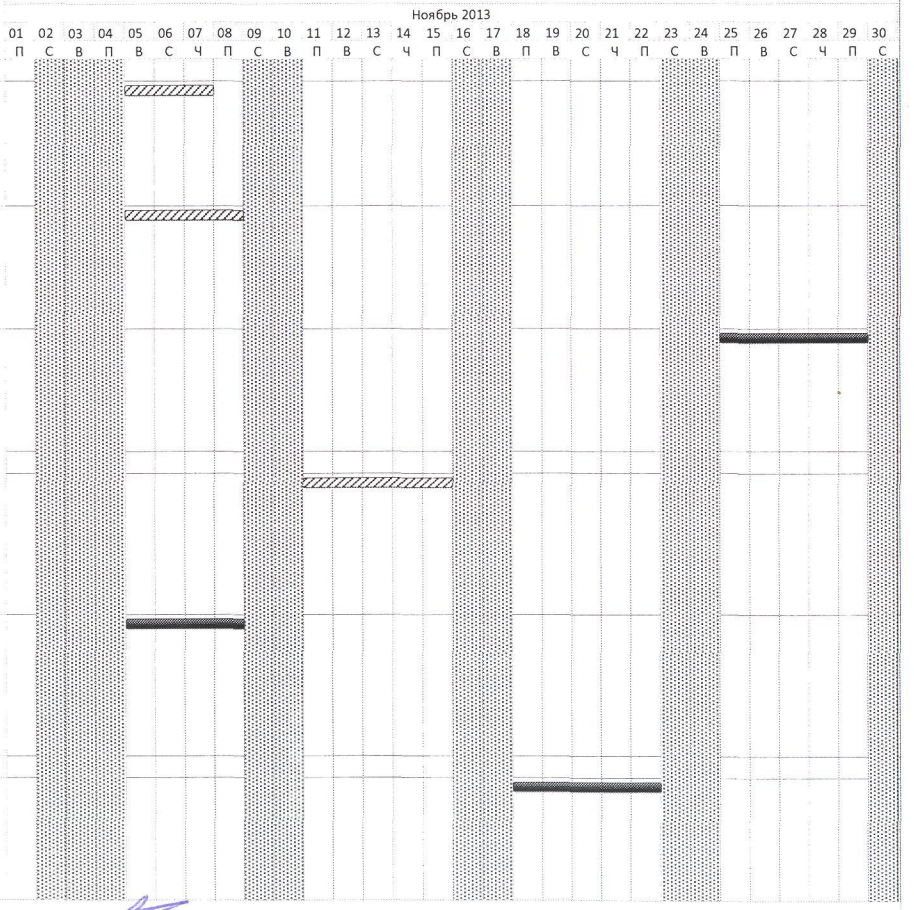

Заместитель главного диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на ноябрь 2013 года

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"__" ____2013г.

Ид.	Название задачи	Сос заяв	Ме рем	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Мест Заяв. врем Длит	Месячны Заявлен время. Начало	Месячны Заявлен время. Конец	Вид рем	Аварі готов	Содержание работ	Причина отказа	Прочие приме	Состо обору по заявк	Услов произ работ	Годо Врем рем Коли дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой Время ремонта Конец
10	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Центральная с отпайкой на АЗЧ II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-4) (Ульяновский ЦУС)	Исх	5 дне	Пн 11.11.13	Пт 15.11.13	5 дн...	Пн 11.11.13	Пт 15.11.13	БВР	01:00	Вырубка			с отключ	с вкл. на ночь	0 дн...	НД	НД
11	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка с отпайкой на ПС Мелькомбинат (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка) (Ульяновский ЦУС)	Исх	1 ден	Ср 06.11.13	Ср 06.11.13	1 день	Ср 06.11.13	Ср 06.11.13	ТР	01:00	ТО: ЛР-110 Ульяновск на ПС-110 кВ Ишеевка			с отключ		1 день	Ср 06.11.13	Ср 06.11....
12	ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная II цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-2) (Ульяновский	Исх	1 ден	Пн 04.11.13	Пн 04.11.13	1 день	Пн 04.11.13	Пн 04.11.13	ТР	01:00	ТО: ЛР-110 Л-2 на ПС-110 кВ Ишеевка			с отключ		1 день	Пн 04.11.13	Пн 04.11....
13	ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная I цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-1) (Ульяновский	Исх	1 ден	Чт 07.11.13	Чт 07.11.13	1 день	Чт 07.11.13	Чт 07.11.13	ТР	01:00	ТО ЛР-110 Л-1 на ПС-110 кВ Ишеевка			с отключ		1 день	Чт 07.11.13	Чт 07.11....
14	ВЛ 110 кВ Тимошкино - Игнатовка (Ульяновский ЦУС)	Исх	1 ден	Ср 06.11.13	Ср 06.11.13	1 день	Ср 06.11.13	Ср 06.11.13	БВР	01:00	ТО ЛР-110 Тимошкино на ПС-110 кВ Игнатовка			с отключ		1 день	Ср 06.11.13	Чт 07.11....
15	**ПС 500 кВ Вешкайма**																	
16	В-1 ВЛ-500 Вешкайма-Ключики (МЭС Волги) ОТКАЗ	Отк	3 дне	Вт 05.11.13	Чт 07.11.13	3 дн...	Вт 05.11.13	Чт 07.11.13	ТР	04:00	ТР: Перемонтаж вторичных цепей шкафа управления В (устранении недостатков проектных решений по РЗ согласно письма М6/2/2511 от 26.08.13)	Отказ ВЛ 500 кВ Вешкайма - Ключики		с отключ		0 дн...	НД	НД
17	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Ключики (МЭС Волги) ОТКАЗ	Отк	3 дне	Вт 05.11.13	Чт 07.11.13	3 дн...	Вт 05.11.13	Чт 07.11.13	ТР	04:00	ТР: Перемонтаж вторичных цепей шкафа управления В (устранении недостатков проектных решений по РЗ согласно письма М6/2/2511 от 26.08.13)	Отказ ВЛ 500 кВ Вешкайма - Ключики		с отключ		0 дн...	НД	НД
18	**ПС 110 кВ Ишеевка**																	
19	В-110 Ульяновск (Ульяновский ЦУС)	Исх	1 ден	Ср 06.11.13	Ср 06.11.13	1 день	Ср 06.11.13	Ср 06.11.13	ТР	01:00	ТО:В-110 Ульяновск, ЛР-110 Ульяновск			с отключ		1 день	Ср 06.11.13	Ср 06.11....
20	В-110 Лесная-1 (Ульяновский ЦУС)	Исх	1 ден	Чт 07.11.13	Чт 07.11.13	1 день	Чт 07.11.13	Чт 07.11.13	ТР	01:00	ТО:В-110 Лесная-1, ЛР-110 Л-1			с отключ		1 день	Чт 07.11.13	Чт 07.11....
21	В-110 Лесная-2 (Ульяновский ЦУС)	Исх	1 ден	Пн 04.11.13	Пн 04.11.13	1 день	Пн 04.11.13	Пн 04.11.13	ТР	01:00	ТО:В-110 Лесная-2, ЛР-110 Л-2			с отключ		1 день	Пн 04.11.13	Пн 04.11....
22	ОВ-110 кВ (Ульяновский ЦУС)	Исх	1 ден	Вт 05.11.13	Вт 05.11.13	1 день	Вт 05.11.13	Вт 05.11.13	ТР	01:00	ТО: ОВ-110 кВ			с отключ		1 день	Вт 05.11.13	Вт 05.11....
23	**ПС 110 кВ Карсун**																	
24	1 СШ-110 кВ (Ульяновский ЦУС)	Исх	1 ден	Пт 15.11.13	Пт 15.11.13	1 день	Пт 15.11.13	Пт 15.11.13	ТР	02:00	ТО:I СШ-110 кВ, ШР-110, СР-I-110			с отключ		1 день	Пт 15.11.13	Пт 15.11....
25	2 СШ-110 кВ (Ульяновский ЦУС)	Исх	1 ден	Пн 18.11.13	Пн 18.11.13	1 день	Пн 18.11.13	Пн 18.11.13	ТР	02:00	ТО:II СШ-110 кВ, ШР-110, СР-II-110			с отключ		1 день	Пн 18.11.13	Пн 18.11....
26	СВ-110 (Ульяновский ЦУС)	Исх	1 ден	Пн 18.11.13	Пн 18.11.13	1 день	Пн 18.11.13	Пн 18.11.13	ТР	01:00	ТО:СВ-110			с отключ		1 день	Пн 18.11.13	Пн 18.11....
27	**ПС 110 кВ Клин**																	
28	ОСШ-110 кВ (Ульяновский ЦУС)	Исх	2 дне	Вт 12.11.13	Ср 13.11.13	2 дн...	Вт 12.11.13	Ср 13.11.13	ТР	01:00	ТР: ОСШ-110 кВ			с отключ		0 дн...	НД	НД

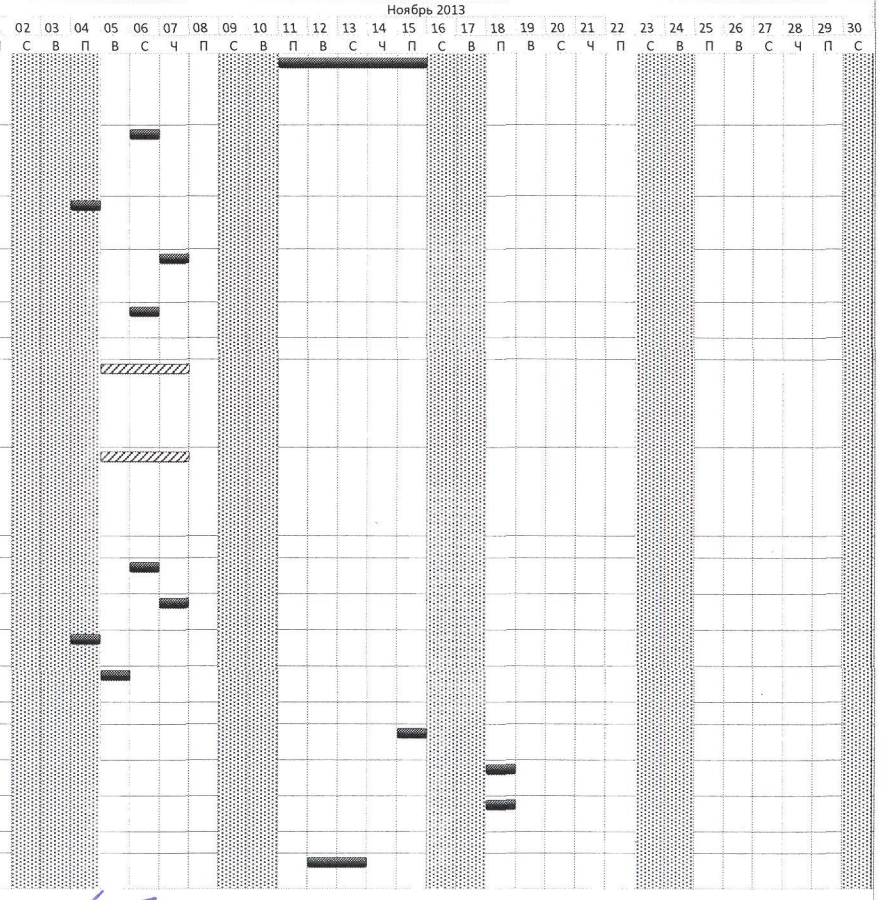

Заместитель главного диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на ноябрь 2013 года

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"__" _____ 2013г.

Ид.	Название задачи	Сос заяв	Мес рем	Месячный Время ремонта Начало	Месячный Время ремонта Конец	Мес Заяв	Месячный Заявленн время. Начало	Месячный Заявленн время. Конец	Вид рем	Авари	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примеч	Состо обору по заявк	Услов произ работ	Годо врем рем Коли дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой Время ремонта Конец
29	ОШСВ-110 (Ульяновский ЦУС)	Исх	2 дне	Вт 12.11.13	Ср 13.11.13	2 дн...	Вт 12.11.13	Ср 13.11.13	ТР	01:00	ТР: ОШСВ-110			с отключ		0 дн...	НД	НД
30	ВМ-110 СК 1 (Ульяновский ЦУС)	Исх	1 ден	Чт 07.11.13	Чт 07.11.13	1 день	Чт 07.11.13	Чт 07.11.13	ТР	01:00	ТР ВМ-110 СК 1			с отключ		0 дн...	НД	НД
31	ВМ-110 СК 2 (Ульяновский ЦУС)	Исх	1 ден	Ср 06.11.13	Ср 06.11.13	1 день	Ср 06.11.13	Ср 06.11.13	ТР	01:00	ТР ВМ-110 СК 2			с отключ		0 дн...	НД	НД
32	ВМ-110 КлК 1 (Ульяновский ЦУС)	Исх	1 ден	Пн 11.11.13	Пн 11.11.13	1 день	Пн 11.11.13	Пн 11.11.13	ТР	01:00	ТР: ВМ-110 КлК 1			с отключ		0 дн...	НД	НД
33	ВМ-110 КлК 2 (Ульяновский ЦУС)	Исх	1 ден	Пт 08.11.13	Пт 08.11.13	1 день	Пт 08.11.13	Пт 08.11.13	ТР	01:00	ТР ВМ-110 КлК 2			с отключ		0 дн...	НД	НД
34	**ПС 110 кВ Умыс**																НД	НД
35	В-110 Умыс-Сура (В-4-110) (КЖД РЖД)	Исх	2 дне	Вт 12.11.13	Ср 13.11.13	2 дн...	Вт 12.11.13	Ср 13.11.13	ТР	04:00	Проверка панелей защит (панель направленной земляной защиты, междуфазной отсечки,АПВ),блок автоматики			с отключ	с перево на ОВ	0 дн...	НД	НД
36	ВС-110 (КЖД РЖД)	Исх	1 ден	Пн 18.11.13	Пн 18.11.13	1 день	Пн 18.11.13	Пн 18.11.13	ТР	04:00	Проверка защит			с отключ		0 дн...	НД	НД

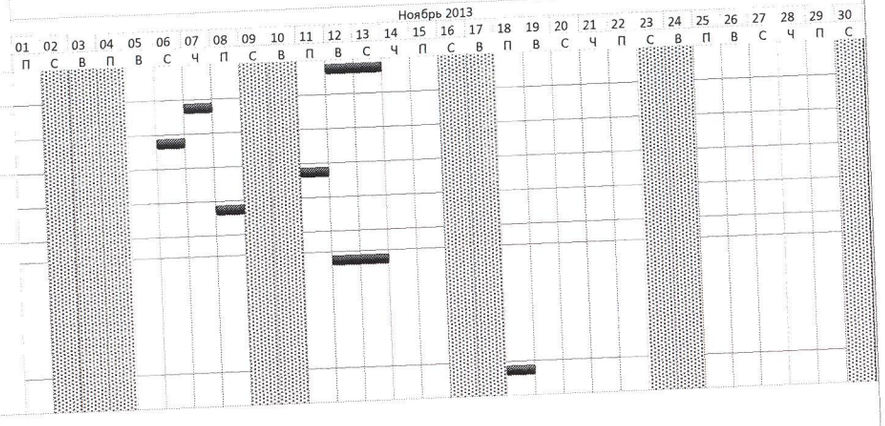

Заместитель главного диспетчера-начальник ОДС _____Д.В. Гаврилин

Начальник СЭР_____А.Е. Требухов
