Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на май 2014 года

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А.Бусс
"30" 04 2014г.

Ид.	Название задачи	Мес. Врем. рем. Дли	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Месяч Заявл время Длите	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид рем	Аварий готовн	Содержание работ	Причи отказ	Прс при	Сос обо по зая	Услов произ работ	Годов Врем ремон Колич дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец
1	**ВЛ 500 кВ**																
2	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики (МЭС Волги)	5 дне	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14	5 дней	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14	БВР	02:00	ПС Ключики: ТР: ЛР-500 II СШ ВЛ-500 БАЭС – Ключики, ЛР-500 I СШ ВЛ-500 БАЭС – Ключики			с отк		3 дней	Ср 21.05.14	Пт 23.05.14
3	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики (МЭС Волги)	5 дне	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14	5 дней	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14	БВР	02:00	Вырубка деревьев, замена изоляции, ремонт провода, ремонт троса, расширение просеки, установка выпавших распорок			с отк		5 дней	Ср 21.05.14	Пт 23.05.14
4	**ВЛ 220 кВ**																
5	ВЛ 220 кВ Ключики - Барыш (МЭС Волги)	14 дне	Пн 28.04.14	Вс 11.05.14	14 дней	Пн 28.04.14	Вс 11.05.14	ЗРР	12:00	ПС Барыш: ТР: КС, ВЧЗ. ЗРР: в связи с ТР: АТ-1. Профиспытания ЛТН-220			с отк		14 дней	Пн 28.04.14	Вс 11.05.14
6	ВЛ 220 кВ Кремёнки - Ульяновская (МЭС Волги)	5 дне	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	БВР	08:00	ПС Кременки: КР и ЦО: ЛР-1-220 Ульяновск, ЛР-2-220 Ульяновск. ТО: ЛТН-220 Профиспытания., ВЧЗ и КС 220. Верховой осмотр линейного портала			с отк		5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14
7	ВЛ 220 кВ Кремёнки - Ульяновская (МЭС Волги)	5 дне	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	БВР	02:00	ПС 220 Ульяновская: ТР: ЛТН-220 Кременки Профиспытания, ЛТТ-220 Кременки. ТО: ЛО-220, ЛР-220 Кременки, ЛР-1 220 Кременки, ЛР-2 220 Кременки			с отк		5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14
8	ВЛ 220 кВ Кремёнки - Ульяновская (МЭС Волги)	5 дне	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	ТР	02:00	Верховой осмотр ВЛ,установка гасителей вибрации, замена изоляции, ремонт провода, ремонт троса., вырубка деревьев.			с отк		0 дней	НД	НД
9	**ВЛ 110 кВ**																
10	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Центральная II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная - 2) (МЭС Волги)	4 дне	Вт 06.05.14	Пт 09.05.14	4 дней	Вт 06.05.14	Пт 09.05.14	ТР	02:00	Вырубка деревьев, замена изоляции, ремонт провода, ремонт троса, расширение просеки,замена гасителей вибрации			с отк		0 дней	НД	НД
11	ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-1) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Чт 15.05.14	Чт 15.05.14	1 день	Чт 15.05.14	Чт 15.05.14	БВР	01:00	ТО ЛР-110 Ц-1 на ПС 110 Центральная			с отк		1 день	Чт 15.05.14	Чт 15.05.14
12	ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-1) (Ульяновский ЦУС)	5 дне	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	КР	01:00	КР			с отк		5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14
13	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-1) (Ульяновский ЦУС)	3 дне	Вт 20.05.14	Чт 22.05.14	3 дней	Вт 13.05.14	Чт 15.05.14	БВР	02:00	Монтаж ВОЛС (отпайка на ПС Южная) Без включения на ночь, но с обеспечением готовности к вводу на ночь			с отк		0 дней	НД	НД

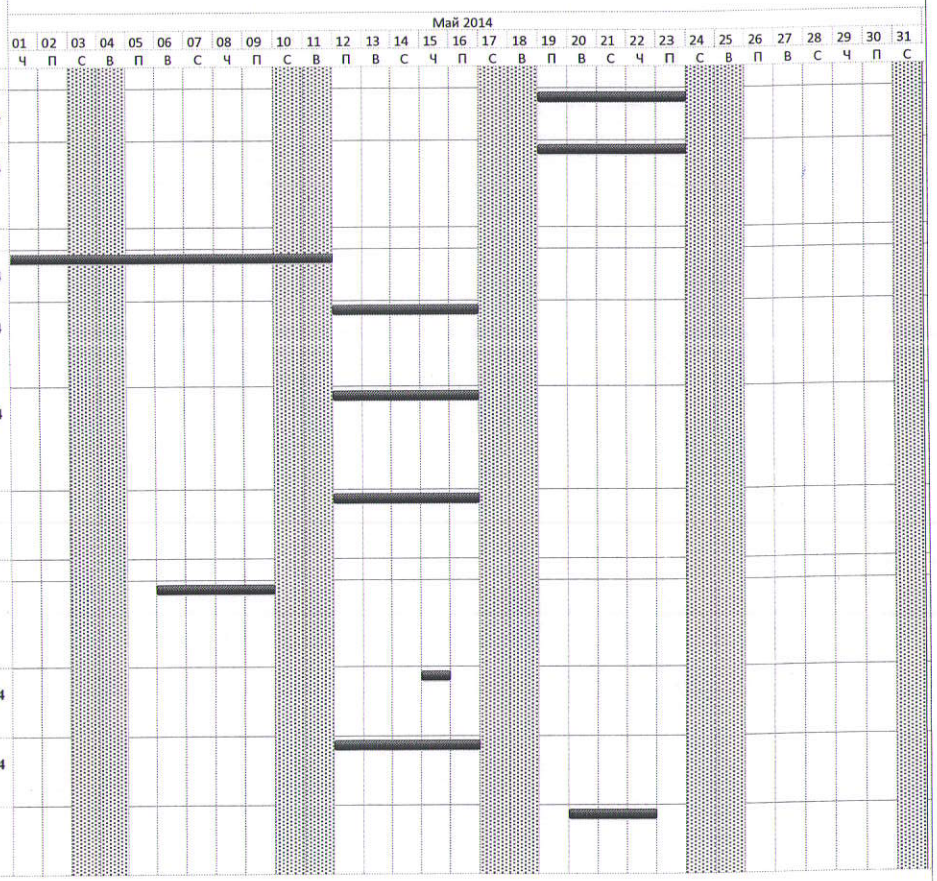

Заместитель главного диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальника СЭР_____Г.М. Юдин

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на май 2014 года

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____ В.А. Бусс
"30" 04 2014г.

Ид.	Название задачи	Мес Вре рем Дли	Месячн Время ремонта Начало	Месячн Время ремонта Конец	Месяч Заявл время Длите	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид ремо	Аварий готовн	Содержание работ	Причи отказ	Прс при	Сос обо по зая	Услов произ работ	Годов Время ремон Колич дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец
14	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Центральная I цепь (ВЛ 110 кВ Восточная - 1) (Ульяновский	1 ден	Пн 05.05.14	Пн 05.05.14	1 день	Пн 05.05.14	Пн 05.05.14	БВР	01:00	ТО ЛР-110 В-1 на ПС 110 Центральная			с отк		1 день	Пн 05.05.14	Пн 05.05.14
15	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Центральная II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная - 2) (Ульяновский	1 ден	Вт 06.05.14	Вт 06.05.14	1 день	Вт 06.05.14	Вт 06.05.14	БВР	01:00	ТО ЛР-110 В-2 на ПС 110 Центральная			с отк		1 день	Вт 06.05.14	Вт 06.05.14
16	ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-2) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пт 16.05.14	Пт 16.05.14	1 день	Пт 16.05.14	Пт 16.05.14	БВР	01:00	ТО ЛР-110 Ц-2 на ПС 110 Центральная			с отк		1 день	Пн 26.05.14	Пн 26.05.14
17	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка с отпайкой на ПС Мелькомбинат (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка)	1 ден	Вт 06.05.14	Вт 06.05.14	1 день	Вт 06.05.14	Вт 06.05.14	БВР	01:00	ТО ЛР-110 Ульяновск на ПС 110 Ишеевка			с отк		1 день	Ср 28.05.14	Ср 28.05.14
18	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна)	2 дне	Пн 12.05.14	Вт 13.05.14	2 дней	Пн 12.05.14	Вт 13.05.14	БВР	01:00	ТО ЛР-110 Ульяновск на ПС 110 Россия			с отк		2 дней	Пн 12.05.14	Вт 13.05.14
19	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна)	2 дне	Ср 14.05.14	Чт 15.05.14	2 дней	Ср 14.05.14	Чт 15.05.14	БВР	01:00	ТО ЛР-110 Майна на ПС 110 Россия			с отк		2 дней	Ср 14.05.14	Чт 15.05.14
20	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна)	2 дне	Чт 29.05.14	Пт 30.05.14	2 дней	Чт 29.05.14	Пт 30.05.14	БВР	01:00	КР ЛР-110 Ульяновск на ПС 110 Майна			с отк		2 дней	Чт 29.05.14	Пт 30.05.14
21	ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная II цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-2)	1 ден	Пн 05.05.14	Пн 05.05.14	1 день	Пн 05.05.14	Пн 05.05.14	БВР	01:00	ТО ЛР-110 Лесная-2 на ПС 110 Ишеевка			с отк		1 день	Пн 26.05.14	Пн 26.05.14
22	ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная I цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-1)	1 ден	Ср 07.05.14	Ср 07.05.14	1 день	Ср 07.05.14	Ср 07.05.14	БВР	01:00	ТО ЛР-110 Лесная-1 на ПС 110 Ишеевка			с отк		1 день	Чт 29.05.14	Чт 29.05.14
23	ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-1) (Ульяновский ЦУС)	4 дне	Пн 05.05.14	Чт 08.05.14	4 дней	Пн 05.05.14	Чт 08.05.14	КР	01:00	КР			с отк		0 дней	НД	НД
24	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Центральная I цепь (ВЛ 110 кВ Восточная - 1) (Ульяновский	5 дне	Пн 26.05.14	Пт 30.05.14	5 дней	Пн 26.05.14	Пт 30.05.14	КР	01:00	Замена грозотроса			с отк		0 дней	НД	НД
25	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Центральная II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная - 2) (Ульяновский	4 дне	Вт 06.05.14	Пт 09.05.14	4 дней	Вт 06.05.14	Пт 09.05.14	КР	01:00	КР			с отк		4 дней	Вт 06.05.14	Пт 09.05.14
26	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Центральная II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная - 2) (Ульяновский	5 дне	Пн 26.05.14	Пт 30.05.14	5 дней	Пн 26.05.14	Пт 30.05.14	КР	01:00	Замена грозотроса			с отк		0 дней	НД	НД
27	ВЛ 110 кВ Ключики - Клин с отпайкой на ПС Куроедово II цепь (ВЛ 110 кВ Ключики - Клин – 2) (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Чт 15.05.14	Пт 16.05.14	2 дней	Чт 15.05.14	Пт 16.05.14	БВР	01:00	КР разъединителей 110 кВ на ПС-110 кВ Куроедово			с отк		2 дней	Чт 15.05.14	Пт 16.05.14

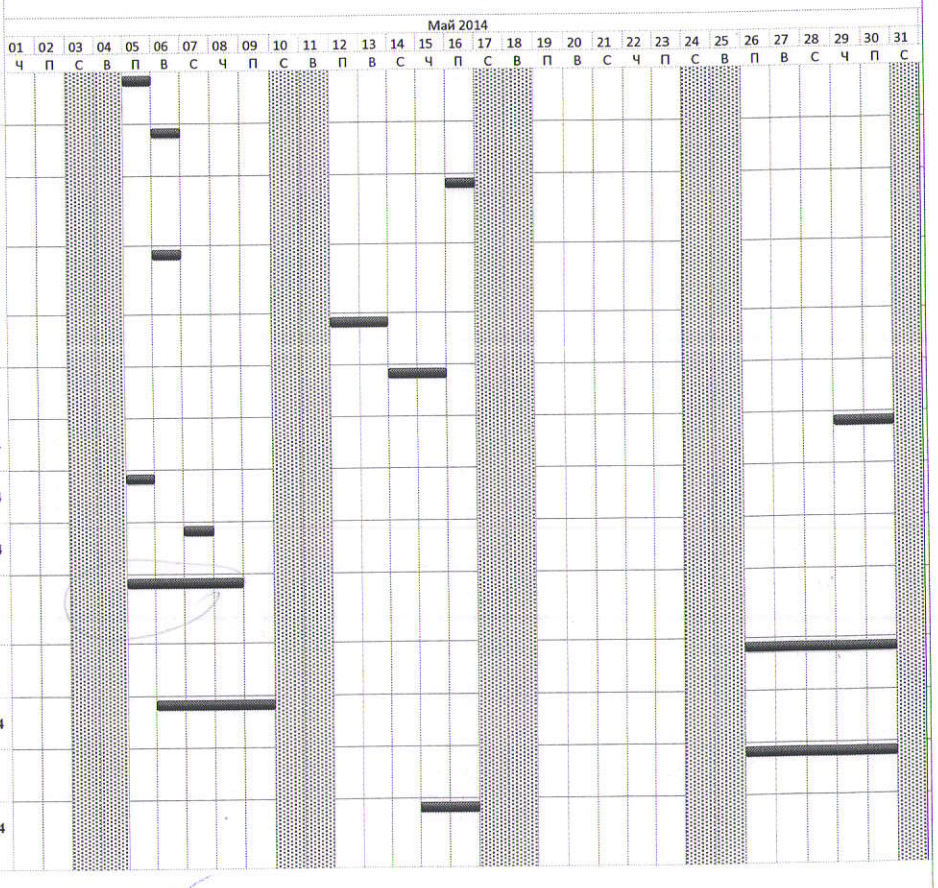

Заместитель главного диспетчера-начальник ОДС _____ Д.В. Гаврилин

Начальника СЭР _____ Г.М. Юдин

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на май 2014 года

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"30" 04 2014г.

Ид.	Название задачи	Мес Врем рем Длит	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Месяч Заявл время Длите	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид рем	Аварий готовн	Содержание работ	Причи отказ	Прс при	Сос обо по зая	Услов произ работ	Годов Врем рем Колич дней	Годовой. Время ремонта Начало	Годовой. Время ремонта. Конец
28	ВЛ 110 кВ Ключики - Клин с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ключики - Клин – 1) (Ульяновский ЦУС)	3 дне	Пн 12.05.14	Ср 14.05.14	3 дней	Пн 12.05.14	Ср 14.05.14	БВР	01:00	КР разъединителей 110 кВ на ПС-110 кВ Куроедово (уч.Ключики-Канадей)			с отк		3 дней	Пн 12.05.14	Ср 14.05.14
29	ВЛ 110 кВ Сызрань-Новообразцовая (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Чт 29.05.14	Пт 30.05.14	2 дней	Чт 29.05.14	Пт 30.05.14	ТР	01:00	ТО(С включением на ночь)			с отк	с включ на ночь	2 дней	Чт 29.05.14	Пт 30.05.14
30	ВЛ 110 кВ Новообразцовая - Клин с отпайками (ВЛ 110 кВ Клин – Новообразцовая) (Ульяновский ЦУС)	5 дне	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	5 дней	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14	ТР	01:00	ТО			с отк	с включ на ночь	5 дней	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14
31	ВЛ 110 кВ Коптевка – Клин с отпайкой на ПС Нагорная (ВЛ 110 кВ Коптевка- Клин)	2 дне	Вт 27.05.14	Ср 28.05.14	2 дней	Вт 27.05.14	Ср 28.05.14	ТР	01:00	ТО			с отк	с включ на ночь	2 дней	Вт 27.05.14	Ср 28.05.14
32	ВЛ 110 кВ Ключики - Клин с отпайкой на ПС Куроедово II цепь (ВЛ 110 кВ Ключики - Клин – 2) (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Чт 15.05.14	Пт 16.05.14	2 дней	Чт 15.05.14	Пт 16.05.14	ТР	01:00	ТО			с отк	с включ на ночь	2 дней	Чт 15.05.14	Пт 16.05.14
33	ВЛ 110 кВ Ключики - Клин с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ключики - Клин – 1) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пн 26.05.14	Пн 26.05.14	1 день	Пн 26.05.14	Пн 26.05.14	ТР	01:00	ТО.(уч.Канадей-Клин)			с отк		1 день	Пн 26.05.14	Пн 26.05.14
34	ВЛ 110 кВ Ключики - Клин с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ключики - Клин – 1) (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Вт 13.05.14	Ср 14.05.14	2 дней	Вт 13.05.14	Ср 14.05.14	ТР	01:00	ТО. (уч.Ключики-Канадей)(с вкл. на ночь)			с отк	с включ на ночь	2 дней	Вт 13.05.14	Ср 14.05.14
35	ВЛ 110 кВ Сызрань-Коптевка с отпайками (Ульяновский ЦУС)	3 дне	Вт 06.05.14	Чт 08.05.14	3 дней	Вт 06.05.14	Чт 08.05.14	ТР	01:00	ТО(С включением на ночь)			с отк		3 дней	Вт 06.05.14	Чт 08.05.14
36	ВЛ 110 кВ Барыш - Редуктор (Ульяновский ЦУС)	4 дне	Пт 30.05.14	Пн 02.06.14	4 дней	Пт 30.05.14	Пн 02.06.14	БВР	01:00	ТО разъединителей 110 кВ на ПС-110 кВ Редуктор (с включением на ночь)			с отк	с включ на ночь	4 дней	Пт 30.05.14	Пн 02.06.14
37	ВЛ 110 кВ Рачейка – Коромысловка с отпайкой на ПС Безводовка (ВЛ 110 кВ Рачейка – Коромысловка) (Ульяновский	1 ден	Чт 22.05.14	Чт 22.05.14	1 день	Чт 22.05.14	Чт 22.05.14	БВР	ВЗ	ТР ЛР-110 кВ на ПС Безводовка (АГ 0,5 ч.)			с отк		0 дней	НД	НД
38	ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково)	1 ден	Вт 27.05.14	Вт 27.05.14	1 день	Вт 27.05.14	Вт 27.05.14	БВР	01:00	ТО ЛР-110 кВ на ПС-110 кВ Б.Сызган			с отк		1 день	Вт 27.05.14	Вт 27.05.14
39	ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково)	2 дне	Ср 28.05.14	Чт 29.05.14	2 дней	Ср 28.05.14	Чт 29.05.14	БВР	01:00	ТО разъединителей 110 кВ на ПС-110 кВ Редуктор (С включением на ночь)			с отк	с включ на ночь	2 дней	Ср 28.05.14	Чт 29.05.14
40	ВЛ 110 кВ Барыш - Патрикеево (Ульяновский ЦУС) ОТКАЗ	1 ден	Вт 20.05.14	Вт 20.05.14	1 день	Вт 20.05.14	Вт 20.05.14	БВР	01:00	ТР ЛР-110 кВ на ПС Патрикеево			с отк		0 дней	НД	НД

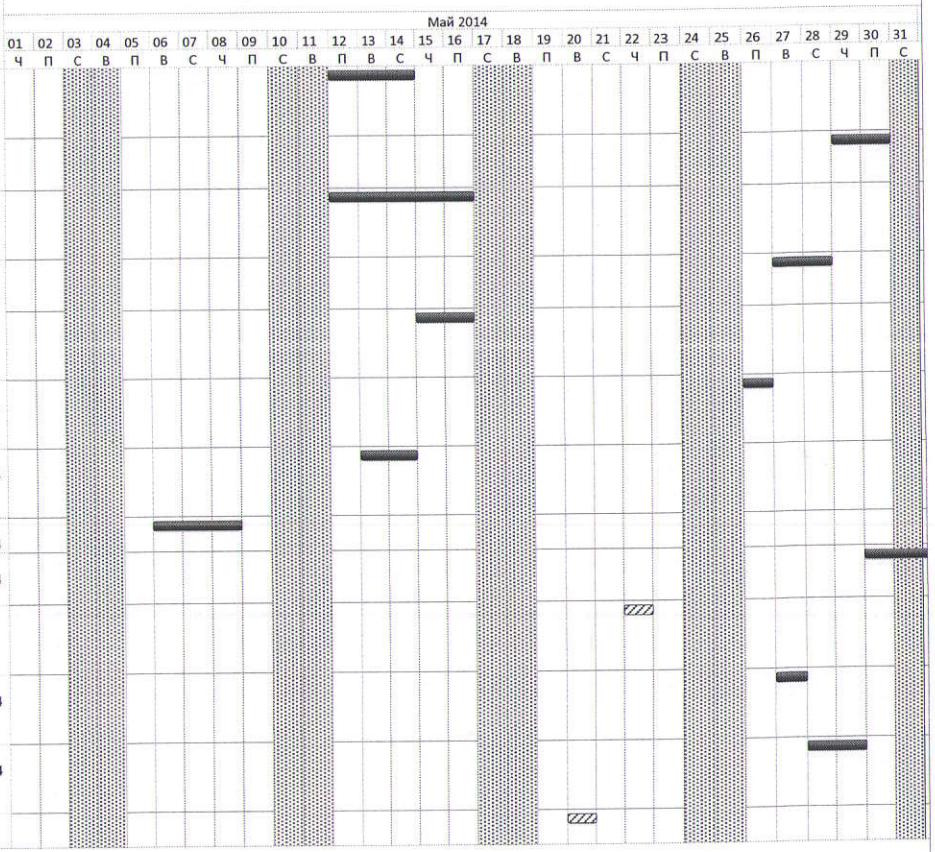

Заместитель главного диспетчера-начальник ОДС Д.В. Гаврилин

Начальника СЭР Г.М. Юдин

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на май 2014 года

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"30" 04 2014г.

Ид.	Название задачи	Мес Врем рем Длит	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Месяч Заявл время Длите	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид ремс	Аварий готовн	Содержание работ	Причи отказа	Прс при	Сос обо по зая	Услов произ работ	Годов Врем ремон Колич дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец
41	ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пн 26.05.14	Пн 26.05.14	1 день	Пн 26.05.14	Пн 26.05.14	БВР	01:00	ТР ЛР-110 кВ на ПС Патрикеево			с отк		0 дней	НД	НД
42	ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Чт 15.05.14	Чт 15.05.14	1 день	Чт 15.05.14	Чт 15.05.14	БВР	01:00	ТР ЛР-110 кВ (АГ 1 ч) и проф.восстановление дистанцион., МТО, ЗЗ на ПС Инза (АГ 0,5 ч.)			с отк		0 дней	НД	НД
43	ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Вт 27.05.14	Вт 27.05.14	1 день	Вт 27.05.14	Вт 27.05.14	БВР	01:00	ТО ЛР-110 кВ на ПС-110 кВ Б.Сызган			с отк		1 день	Вт 27.05.14	Вт 27.05.14
44	ВЛ 110 кВ Инза - Должниково (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Чт 15.05.14	Чт 15.05.14	1 день	Чт 15.05.14	Чт 15.05.14	БВР	01:00	ТР ЛР-110 кВ (АГ 1 ч) и проф.восстановление дистанцион., МТО, ЗЗ на ПС Инза (АГ 0,5 ч.)			с отк		0 дней	НД	НД
45	ВЛ 110 кВ Инза - Ночка с отпайкой на ПС ПОШ (ВЛ 110 кВ Инза - Ночка) (Ульяновский	1 ден	Ср 14.05.14	Ср 14.05.14	1 день	Ср 14.05.14	Ср 14.05.14	БВР	01:00	ТР ЛР-110 кВ (АГ 1 ч) и проф.восстановление дистанцион., МТО, ЗЗ на ПС Инза (АГ 0,5 ч.)			с отк		0 дней	НД	НД
46	ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково)	2 дне	Ср 28.05.14	Чт 29.05.14	2 дней	Ср 28.05.14	Чт 29.05.14	КР	03:00	КР			с отк		2 дней	Ср 28.05.14	Чт 29.05.14
47	ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево) (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Пн 26.05.14	Вт 27.05.14	2 дней	Пн 26.05.14	Вт 27.05.14	КР	03:00	КР			с отк		2 дней	Пн 26.05.14	Вт 27.05.14
48	ВЛ 110 кВ Инза - Сура с отпайкой на ПС ПОШ (ВЛ 110 кВ Инза – Сура) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Ср 14.05.14	Ср 14.05.14	1 день	Ср 14.05.14	Ср 14.05.14	ТР	01:00	ТР ЛР-110 кВ (АГ 1 ч) и проф.восстановление дистанцион., МТО, ЗЗ на ПС Инза (АГ 0,5 ч.)			с отк		0 дней	НД	НД
49	ВЛ 110 кВ Мелекесс – Городская - 1М с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Мелекесс – Городская – 1) (НИИАР) ОТКАЗ	5 дне	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14	5 дней	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14	БВР	02:00	ТР ЛР-МГ-1 на ПС 220 кВ 1М			с отк		0 дней	НД	НД
50	ВЛ 110 кВ Мелекесс – Городская - 1М с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Мелекесс – Городская - 2) (НИИАР) ОТКАЗ	5 дне	Пн 26.05.14	Пт 30.05.14	5 дней	Пн 26.05.14	Пт 30.05.14	БВР	02:00	ТР ЛР-МГ-2 на ПС 220 кВ 1М			с отк		0 дней	НД	НД
51	**ПС 500 кВ Вешкайма**																
52	АТ-2 (МЭС Волги)	1 ден	Пн 12.05.14	Пн 12.05.14	1 день	Пн 12.05.14	Пн 12.05.14	ЗРР	04:00	ЗРР: в связи с выводом 2 СШ-500 для ТО: ШСР-2. Замена нулевых изоляторов на подвесной изоляции			с отк		1 день	Пн 12.05.14	Пн 12.05.14
53	АТ-2 (МЭС Волги)	1 ден	Пт 16.05.14	Пт 16.05.14	1 день	Пт 16.05.14	Пт 16.05.14	ЗРР	ВЗ	В связи с выводом 2 СШ-500 для ввода в работу Южной сек. 2 СШ-500			с отк		1 день	Пт 16.05.14	Пт 16.05.14
54	АТ-2 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14	5 дней	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14	ЗРР	ВЗ	В связи с выводом Северной сек. 2 СШ-500			с отк		5 дней	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14

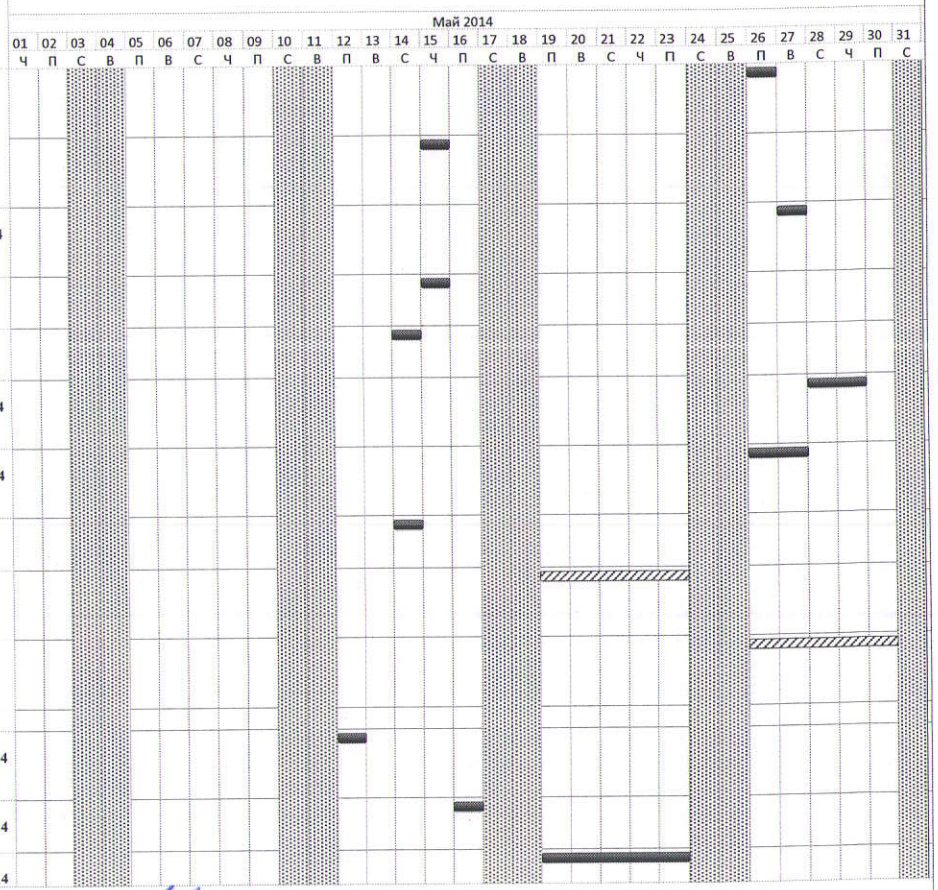

Заместитель главного диспетчера-начальник ОДС _____ **Д.В. Гаврилин**

Начальника СЭР _____ **Г.М. Юдин**

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на май 2014 года

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"30" 04 2014г.

Ид.	Название задачи	Мес Врем рем Дли	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Месяч Заявл время Длите	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид ремс	Аварий готовно	Содержание работ	Причи отказ	Прс при обо по заяв	Сос обо	Услов произ работ	Годов Врем ремо Колич дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец
55	АТ-2 (МЭС Волги)	12 дне	Пн 26.05.14	Пт 06.06.14	12 дней	Пн 26.05.14	Пт 06.06.14	ТР	04:00	ТР: АТ-2. ТО: ОПН-110, 500, Р-10, ВДТ-2, ВЭ-110, ТТ-110, ОР-110, ТР-110		с откл			12 дней	Пн 26.05.14	Пт 06.06.14
56	В-500 АТ-2 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14	5 дней	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14	ТР	04:00	ТО ШР-500, ВЭ-500, ТТ-500		с откл			5 дней	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14
57	ВЭ-110 АТ-2 (МЭС Волги)	12 дне	Пн 26.05.14	Пт 06.06.14	12 дней	Пн 26.05.14	Пт 06.06.14	ТР	04:00	ТО: ВЭ, ТТ, ТР		с откл			12 дней	Пн 26.05.14	Пт 06.06.14
58	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Ключики (МЭС Волги)	5 дне	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	ТР	04:00	ТО: В-2, ТТ-2, ШР-2		с откл			5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14
59	**ПС 500 кВ Ключики**																
60	АТ-2 (МЭС Волги)	17 дне	Пн 26.05.14	Ср 11.06.14	17 дней	Пн 26.05.14	Ср 11.06.14	ТР	12:00	ТР: АТ-2, АТР-500. ТО: ОПН-500, ОПН-220, ОПН-35, ШР-35 ТН-35, ШР-35 ТСН-3, ТН-35, ТТ-500, Профиспытания. В: ТО основные, резервные, технологические защиты		с откл			17 дней	Пн 26.05.14	Ср 11.06.14
61	В 220 АТ-2 (МЭС Волги)	17 дне	Пн 26.05.14	Ср 11.06.14	17 дней	Пн 26.05.14	Ср 11.06.14	ТР	01:00	ТР: Профиспытания ТТ-220. В: ТО УРЗА		с откл			17 дней	Пн 26.05.14	Ср 11.06.14
62	В 220 Барыш (МЭС Волги)	3 дне	Вт 06.05.14	Чт 08.05.14	3 дней	Вт 06.05.14	Чт 08.05.14	ТР	02:00	ТР: Профиспытания ТТ-220		с откл			0 дней	НД	НД
63	АТ-3 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14	5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	ТР	08:00	ТР: АТ-3. ТО: РБ-10, ОПН-220, ОПН-110, ОПН-10 , АТР-110. Проф.испытания АТ-3. РБ-10, ОПН-220, ОПН-110, ОПН-10 В: ТО встроенных ТТ, технологические защиты		с откл			5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14
64	ВЭ-110 АТ-3 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14	5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	ТР	02:00	ТО: АТР-110. В: ТО УРЗА		с откл			5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14
65	В 220 АТ-3 (МЭС Волги)	5 дне	Пн 19.05.14	Пт 23.05.14	5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	ТР	02:00	ТР: Профиспытания ВЭ-220, ТТ-220. В: ТО вторичных цепей ТТ-220, В-220, АТР-220		с откл			5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14
66	**ПС 220 кВ Барыш**																
67	В 110 АТ-1 (МЭС Волги)	14 дне	Пн 28.04.14	Вс 11.05.14	14 дней	Пн 28.04.14	Вс 11.05.14	КР	2	КР: В-110		с откл			0 дней	НД	НД
68	АТ-1 (МЭС Волги)	14 дне	Пн 28.04.14	Вс 11.05.14	14 дней	Пн 28.04.14	Вс 11.05.14	ТР	12:00	ТР: АТ, ВДТ, ОД-220, КЗ-220, В-110, РВС-110, РВП-10. В: ТО УРЗА. Профиспытания		с откл			0 дней	НД	НД
69	ШСВ-110 (МЭС Волги)	12 дне	Пн 26.05.14	Пт 06.06.14	12 дней	Пн 26.05.14	Пт 06.06.14	ТР	12:00	ТР: В-110		с откл			12 дней	Пн 26.05.14	Пт 06.06.14
70	В 110 АТ-1 (МЭС Волги)	12 дне	Пн 12.05.14	Пт 23.05.14	12 дней	Пн 12.05.14	Пт 23.05.14	ТР	2	ТР: В-110		с откл	с перево на ОВ		11 дней	Чт 01.05.14	Вс 11.05.14
71	**ПС 220 кВ Кременки**																
72	В-110 АТ-1 (МЭС Волги)	13 дне	Пн 19.05.14	Сб 31.05.14	13 дней	Пн 19.05.14	Сб 31.05.14	КР	2	КР: В-110, ЛР-110. ТО: УРЗиА		с откл			13 дней	Пн 19.05.14	Сб 31.05.14

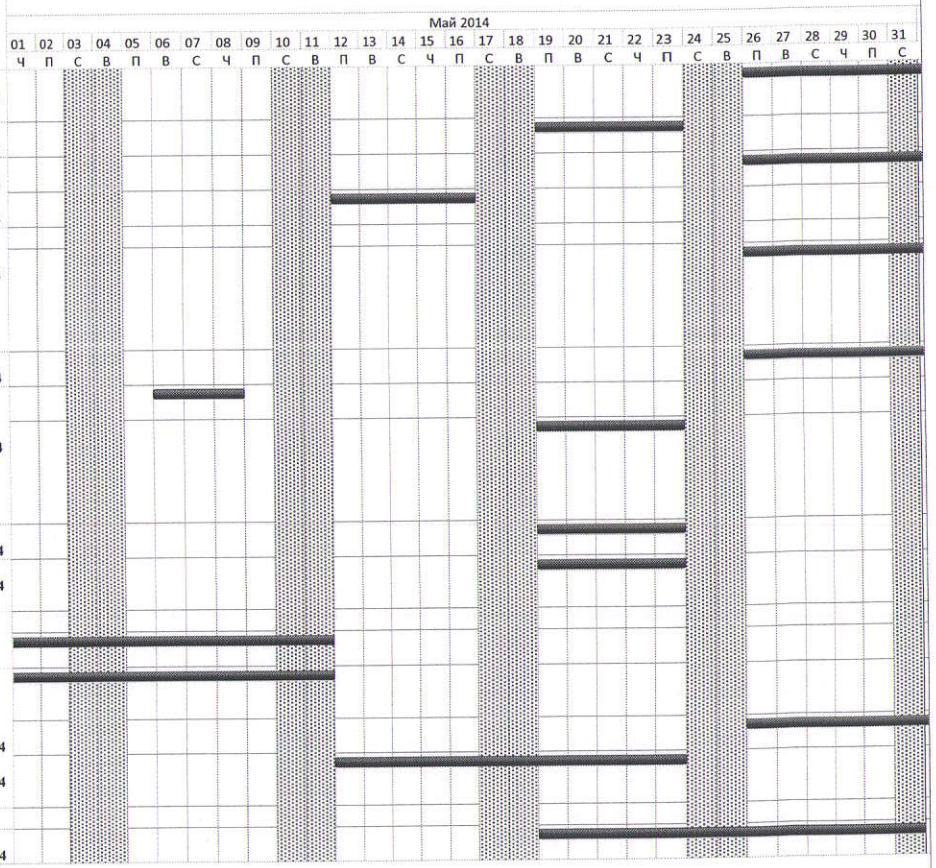

Заместитель главного диспетчера-начальник ОДС _____ **Д.В. Гаврилин**

Начальника СЭР _____ **Г.М. Юдин**

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на май 2014 года

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____В.А. Бусс
"30" 04 2014г.

Ид.	Название задачи	Мес Вре рем Дли	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Месяч Заявл время Длите	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид ремо	Аварий готовно	Содержание работ	Причи отказ	Прс при	Сос обо по зая	Услов произ работ	Годов Время ремон Колич дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец
73	В-1-220 Ульяновск (МЭС Волги)	5 дне	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	ТР	08:00	КР и ЦО: ЛР-1-220 Ульяновск. ТО: В-220, ТТ-220. ТО: УРЗиА. (АГ 8ч). Профиспытания ТТ В-1-220 Ульяновск			с отк		5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14
74	В-2-220 Ульяновск (МЭС Волги)	5 дне	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	ТР	08:00	КР и ЦО: ЛР-2-220 Ульяновск. ТО: В-220, ТТ-220. ТО: УРЗиА			с отк		5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14
75	АТ-1 (МЭС Волги)	13 дне	Пн 19.05.14	Сб 31.05.14	13 дней	Пн 19.05.14	Сб 31.05.14	ТР	12:00	ТР: АТ, ВДТ, РТН-6, ЛР-110, РВС-110, РВП-6, Р-1. ТО: УРЗиА, Профиспытания			с отк		13 дней	Пн 19.05.14	Сб 31.05.14
76	**ПС 220 кВ Ульяновская**																
77	В-2-220 Кремёнки (МЭС Волги)	5 дне	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	ТР	02:00	ТР: ТТ В-2-220 Кременки. Профиспытания ТО: В-2 220 Кременки, ЛР-2 220 Кременки. ТО: УРЗА			с отк		5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14
78	В-1-220 Кремёнки (МЭС Волги)	5 дне	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	ТР	02:00	ТР: ТТ В-1-220 Кременки. Профиспытания ТО: В-1 220 Кременки, ЛР-1 220 Кременки. ТО: УРЗА			с отк		5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14
79	**ПС 220 кВ 1М**																
80	II СШ -110 (НИИАР)	4 дне	Пн 05.05.14	Чт 08.05.14	4 дней	Пн 05.05.14	Чт 08.05.14	ТР	02:00	ТР			с отк		4 дней	Пн 05.05.14	Чт 08.05.14
81	ОСШ-110 (НИИАР)	5 дне	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	ТР	02:00	ТР			с отк		5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14
82	ОВ (НИИАР)	5 дне	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14	ТР	02:00	ТР			с отк		5 дней	Пн 12.05.14	Пт 16.05.14
83	ТН-2 (НИИАР)	4 дне	Пн 05.05.14	Чт 08.05.14	4 дней	Пн 05.05.14	Чт 08.05.14	ТР	02:00	ТР			с отк		4 дней	Пн 05.05.14	Чт 08.05.14
84	**ПС 110 кВ Ишеевка**																
85	I СШ-110 кВ (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Ср 21.05.14	Ср 21.05.14	1 день	Ср 21.05.14	Ср 21.05.14	ТР	01:00	ТО			без отк		1 день	Ср 21.05.14	Ср 21.05.14
86	II СШ-110 кВ (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Чт 22.05.14	Чт 22.05.14	1 день	Чт 22.05.14	Чт 22.05.14	ТР	01:00	ТО			с отк		1 день	Чт 22.05.14	Чт 22.05.14
87	ОСШ-110 кВ (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пт 23.05.14	Пт 23.05.14	1 день	Пт 23.05.14	Пт 23.05.14	ТР	01:00	ТО			с отк		1 день	Пт 23.05.14	Пт 23.05.14
88	В-110 Ульяновск (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Вт 06.05.14	Вт 06.05.14	1 день	Вт 06.05.14	Вт 06.05.14	ТР	01:00	ТО			с отк		1 день	Ср 28.05.14	Ср 28.05.14
89	В-110 Лесная-1 (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Ср 07.05.14	Ср 07.05.14	1 день	Ср 07.05.14	Ср 07.05.14	ТР	01:00	В-110 Л-1, ЛР-110 Л-1			с отк		1 день	Чт 29.05.14	Чт 29.05.14
90	В-110 Лесная-2 (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пн 05.05.14	Пн 05.05.14	1 день	Пн 05.05.14	Пн 05.05.14	ТР	ВЗ	В-110 Л-2, ЛР-110 Л-2			с отк		1 день	Пн 26.05.14	Пн 26.05.14
91	**ПС 110 кВ Инза**																
92	1 СШ-110 (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Ср 14.05.14	Ср 14.05.14	1 день	Ср 14.05.14	Ср 14.05.14	ТР	01:00	ТР. Проф.восстановление дифф.защиты, УРОВ-110			с отк		0 дней	НД	НД
93	2 СШ-110 (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Чт 15.05.14	Чт 15.05.14	1 день	Чт 15.05.14	Чт 15.05.14	ТР	01:00	Текущий ремонт ШР, ЛР 110кВ покраска оборудования Проф.восстановление дифф.защиты, УРОВ-110			с отк		0 дней	НД	НД

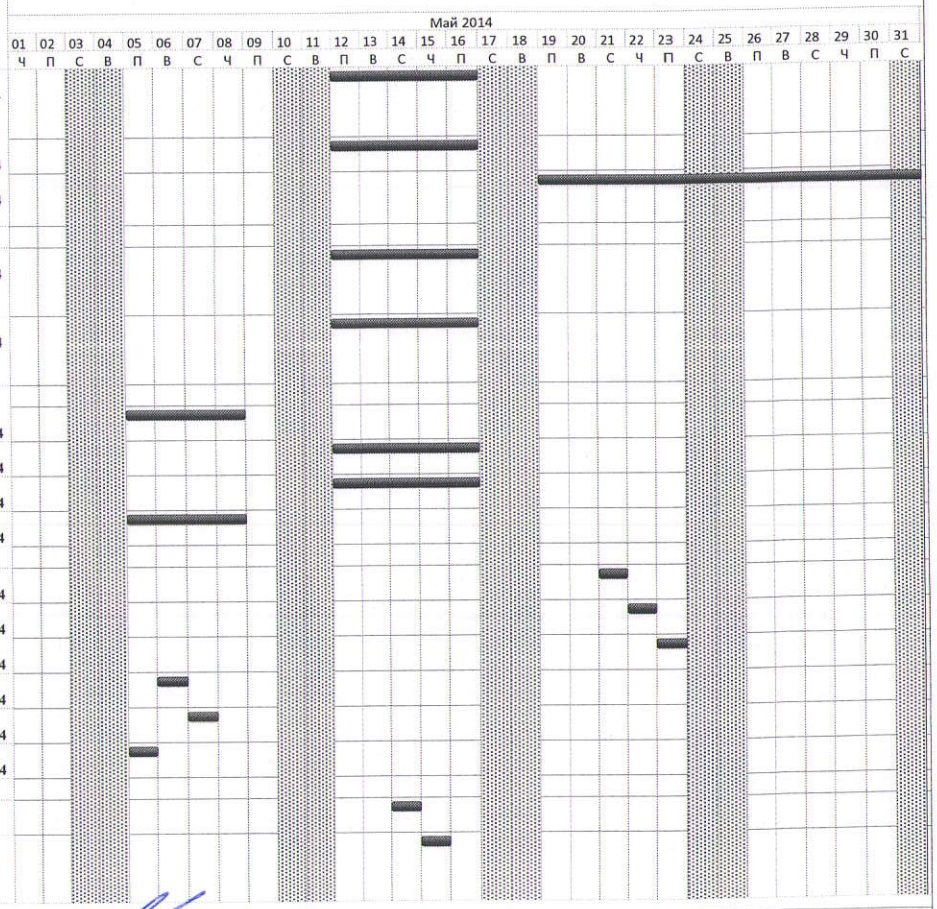

Заместитель главного диспетчера-начальник ОДС_____Д.В. Гаврилин

Начальника СЭР_____Г.М. Юдин

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на май 2014 года

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
_____ В.А. Бусс
"30" 04 2014г.

Ид.	Название задачи	Мес Вре рем Дли	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Месяч Заявл время Длите	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид ремс	Аварий готовно	Содержание работ	Причи отказа	Прс при	Сос обо по заяв	Услов произ работ	Годов Время ремон Колич дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец
94	**ПС 110 кВ Майна**																
95	В-110 Ульяновск (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Чт 29.05.14	Пт 30.05.14	2 дней	Чт 29.05.14	Пт 30.05.14	КР	01:00	КР			с отк		2 дней	Чт 29.05.14	Пт 30.05.14
96	**ПС 110 кВ Патрикеево**																
97	ВС-110 (Ульяновский ЦУС) ОТКАЗ	1 ден	Вт 20.05.14	Вт 20.05.14	1 день	Вт 20.05.14	Вт 20.05.14	ТР	01:00	ТР, проф.контроль делительной защиты			с отк		0 дней	НД	НД
98	ВС-110 (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пн 26.05.14	Пн 26.05.14	1 день	Пн 26.05.14	Пн 26.05.14	ТР	01:00	ТР разъединителей			с отк		0 дней	НД	НД
99	**ПС 110 кВ Редуктор**																
100	СВМ-110 (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Ср 28.05.14	Чт 29.05.14	2 дней	Ср 28.05.14	Чт 29.05.14	БВР	02:00	ТО разъединителей			с отк		0 дней	НД	НД
101	СВМ-110 (Ульяновский ЦУС)	4 дне	Пт 30.05.14	Пн 02.06.14	4 дней	Пт 30.05.14	Пн 02.06.14	ТР	01:00	ТО(С включением на ночь)			с отк	с включ на ночь	4 дней	Пт 30.05.14	Пн 02.06.14
102	**ПС 110 кВ Россия**																
103	СВ-110 (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Чт 15.05.14	Пт 16.05.14	2 дней	Чт 15.05.14	Пт 16.05.14	КР	01:00	КР			с отк		2 дней	Чт 15.05.14	Пт 16.05.14
104	**ПС 110 кВ Центральная**																
105	ОВ-110 (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Ср 28.05.14	Ср 28.05.14	1 день	Ср 28.05.14	Ср 28.05.14	ТР	01:00	ТО			с отк		1 день	Вт 27.05.14	Вт 27.05.14
106	В-110 Ц-2 (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пт 16.05.14	Пт 16.05.14	1 день	Пт 16.05.14	Пт 16.05.14	ТР	01:00	ТО			с отк		1 день	Пн 26.05.14	Пн 26.05.14
107	В-110 В-1 (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Пт 30.05.14	Пт 30.05.14	1 день	Пт 30.05.14	Пт 30.05.14	ТР	01:00	ТО			с отк		1 день	Пн 05.05.14	Пн 05.05.14
108	**Ульяновская ТЭЦ-1**																
109	ВВ С-3 (Ульяновская ТЭЦ-1)	6 дне	Сб 24.05.14	Чт 29.05.14	6 дней	Сб 24.05.14	Чт 29.05.14	КР	08:00	ТО			с отк	с перево на ОВ	6 дней	Сб 24.05.14	Чт 29.05.14
110	ВВ ОВ (Ульяновская ТЭЦ-1)	6 дне	Чт 15.05.14	Вт 20.05.14	6 дней	Чт 15.05.14	Вт 20.05.14	ТР	08:00	ТР			с отк		6 дней	Чт 15.05.14	Вт 20.05.14
111	**Ульяновская ТЭЦ-2**																
112	ГТ-2 - Т-110 кВ (Ульяновская ТЭЦ-2)	67 дне	Чт 22.05.14	Вс 27.07.14	67 дней	Чт 22.05.14	Вс 27.07.14	КР	ВЗ	КР			с отк		67 дней	Чт 22.05.14	Вс 27.07.14
113	В-110 ГТ-2 (Ульяновская ТЭЦ-2)	67 дне	Чт 22.05.14	Вс 27.07.14	67 дней	Чт 22.05.14	Вс 27.07.14	КР	ВЗ	КР			с отк		67 дней	Чт 22.05.14	Вс 27.07.14
114	ТН-2-110 (Ульяновская ТЭЦ-2)	4 дне	Пн 05.05.14	Чт 08.05.14	4 дней	Пн 05.05.14	Чт 08.05.14	ТР	ВЗ	ТР			с отк		4 дней	Пн 05.05.14	Чт 08.05.14
115	**Ульяновское РДУ**																
116	Транзит 110 кВ Барыш – Умыс (разрыв транзита по любой из ВЛ, входящей в транзит) (Ульяновский ЦУС)	4 дне	Пт 30.05.14	Пн 02.06.14	4 дней	Пт 30.05.14	Пн 02.06.14	БВР	01:00	Разрыв транзита 110 кВ по обеим цепям на участке Барыш-Умыс в связи с ТО разъединителей 110 кВ на ПС-110 кВ Редуктор			с отк	с включ на ночь	4 дней	Пт 30.05.14	Пн 02.06.14
117	Транзит 110 кВ Барыш – Умыс (разрыв транзита по любой из ВЛ, входящей в транзит) (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Пн 26.05.14	Вт 27.05.14	2 дней	Пн 26.05.14	Вт 27.05.14	БВР	03:00	Разрыв транзита 110 кВ по обеим цепям на участке Барыш-Умыс в связи с КР ВЛ 110 кВ Инза-Патрикеево			с отк	с включ на ночь	2 дней	Пн 26.05.14	Вт 27.05.14

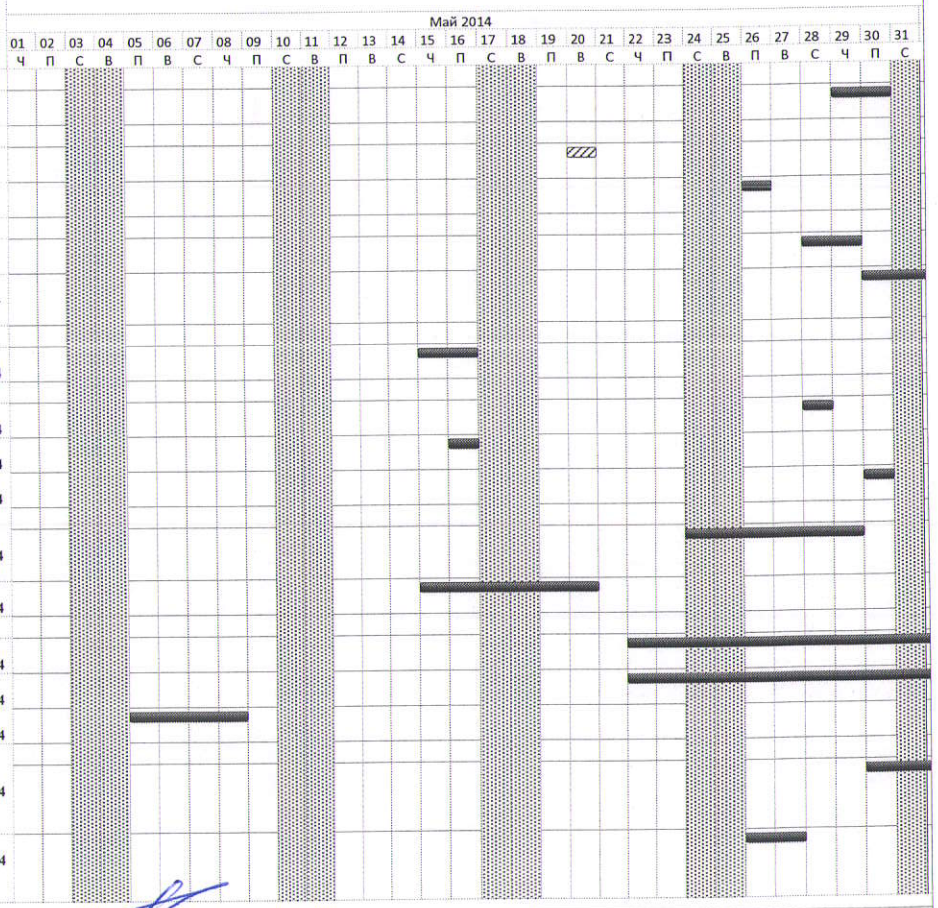

Заместитель главного диспетчера-начальник ОДС _____ Д.В. Гаврилин

Начальника СЭР _____ Г.М. Юдин

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на май 2014 года

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"30" 04 2014г.

Ид.	Название задачи	Мес Врем рем Длит	Месячны Время ремонта Начало	Месячны Время ремонта Конец	Месяч Заявл время Длите	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Вид ремс	Аварий готовн	Содержание работ	Причи отказ	Прс при	Сос обо по зая	Услов произв работ	Годов Врем ремон Колич дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец
118	Транзит 110 кВ Барыш – Умыс (разрыв транзита по любой из ВЛ, входящей в транзит) (Ульяновский ЦУС)	2 дне	Ср 28.05.14	Чт 29.05.14	2 дней	Ср 28.05.14	Чт 29.05.14	КР	03:00	Разрыв транзита 110 кВ по обеим цепям на участке Барыш-Умыс в связи с с КР ВЛ 110 кВ Редуктор-Должниково.			с отк	с включ на ночь	2 дней	Ср 28.05.14	Чт 29.05.14
119	Транзит 110 кВ Барыш – Умыс (разрыв транзита по любой из ВЛ, входящей в транзит) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Ср 14.05.14	Ср 14.05.14	1 день	Ср 14.05.14	Ср 14.05.14	ТР	01:00	Разрыв транзита 110 кВ по обеим цепям на участке Барыш-Умыс в связи с ТР 1 СШ 110 кВ на ПС 110кВ Инза			с отк		0 дней	НД	НД
120	Транзит 110 кВ Барыш – Умыс (разрыв транзита по любой из ВЛ, входящей в транзит) (Ульяновский ЦУС)	1 ден	Чт 15.05.14	Чт 15.05.14	1 день	Чт 15.05.14	Чт 15.05.14	ТР	ВЗ	Разрыв транзита 110 кВ по обеим цепям на участке Барыш-Умыс в связи с ТР 2 СШ 110 кВ на ПС 110кВ Инза			с отк		0 дней	НД	НД
121	Транзит 110 кВ Барыш – Умыс (разрыв транзита по любой из ВЛ, входящей в транзит) (Ульяновский ЦУС) ОТКАЗ	1 ден	Вт 20.05.14	Вт 20.05.14	1 день	Вт 20.05.14	Вт 20.05.14	ТР	01:00	Разрыв транзита 110 кВ по одной цепи на участке Барыш-Умыс в связи с ТР СВ 110 кВ на ПС 110кВ Патрикеево			с отк		0 дней	НД	НД

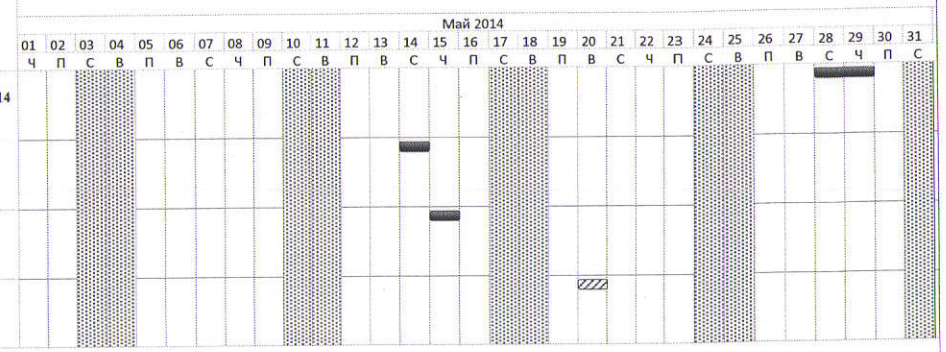

Заместитель главного диспетчера-начальник ОДС **Д.В. Гаврилин**

Начальника СЭР **Г.М. Юдин**
